Ofício nº 2934/2026 – SEINFRA/GAB

Juazeiro do Norte – CE, 06 de julho de 2026.

Ao Senhor,
Lucena Assessoria em Contabilidade
Setor de Contabilidade
Centro Administrativo Municipal
Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz, s/n, Centro.

Assunto: Encaminhamento de Nota Fiscal para processamento.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste, encaminhar para processamento a Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e **N° 7491**, no valor de **R$ 1.180.643,83** (um milhão, cento e oitenta mil e seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos) da **9ª medição** integrante ao **Contrato n° 2025.09.02-0002**, referente à **contração de serviços a serem prestados na pavimentação e recuperação de pavimento em diversas localidades do Município Juazeiro do Norte/CE, por intermédio de sua Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA,** em favor da empresa **Coral – Construtora Rodovalho Alencar LTDA**, sob **CNPJ: 07.195.191/0001-33**.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

André da Silva Ferreira
Secretário Adjunto de Infraestrutura
Port. nº 0730/2025

Ana Carolina Evangelista Biró
Secretária Municipal de Infraestrutura
Port. nº 0490/2025

09/07/26

CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

VIA SEINFRA

CONTRATO Nº 2025.09.02-0002

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA:

- NOTA FISCAL E RECIBO
- CERTIDÃO DE MEDIÇÃO
- QUADRO RESUMO FINANCEIRO
- BOLETIM DE MEDIÇÃO
- CRONOGRAMA EXECUTADO
- MEMÓRIA DE CÁLCULO
- ORDEM DE SERVIÇO
- CROQUIS DE SERVIÇO
- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
- DIÁRIO DE OBRA
- CEI DA OBRA
- ART DE EXECUÇÃO
- CONTRATO E ADITIVOS
- DOCUMENTAÇÃO SOCIAL
- CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL

9º MEDIÇÃO

R$ 1.180.643,83

AV. SEN. VIRGÍLIO TÁVORA, 1701 – SALA 408
FONE/FAZ (85) 3261 – 0915
CNPJ 07.195.191/0001-33 – CGF 06.002744-4
CEP 60170-251 – Aldeota – Fortaleza - CE

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

Av. Senador Virgílio Távora, 1701 – Sala 408 – Bairro Aldeota
Fone/Fax: (85) 3261 0915 / 3244 2416
CNPJ 07.195.191/0001-33 – Insc. Est. 06.002.744-4
Inscrição Municipal 71.514 – CEP 60.170-251
Fortaleza -CE

RECIBO

R$ *1.180.643,83-x-x-x-x-x-*

Recebi (emos) da ***Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte***

A quantia de R$ ***1.180.643,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Seiscentos e Oitenta e Reais e Quarenta e Três Centavos)***

Referente a *Nota Fiscal de Nº 7491, emitida em 24/06/2026, Ref. a 9ª medição do Contrato Nº 2025.09.02-0002, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE*

Pelo que firmamos o presente recibo, para todos os fins e efeitos legais.

Fortaleza-CE, _____ de _____ de _____

Dados bancário: Banco Bradesco – Agência 2367 – C/C 14.927-6

CORAL-Construtora Rodovalho Alencar Ltda.

Ivo Alencar de Freitas
Diretor Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Fortaleza PREFEITURA Finanças

Número da NFS-e 7491

Data e Hora da Emissão	24/06/2026 10:41:55	Competência	06/2026	Código de Verificação	347276818
Número do RPS	394	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JUAZEIRO DO NORTE
Chave de Acesso	23044001207195191000133000000000749126060347276811				

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CORAL

Razão Social/Nome	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	07.195.191/0001-33	Insc Municipal	0071514-0	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV SEN VIRGILIO TAVORA,1701 - ALDEOTA CEP:60.170-079				
Complemento	408	Telefone	(85)3261-0915	E-mail	ccoralconstrutora@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE				
CPF/CNPJ	07.974.082/0001-14	Inscrição Municipal		Município	JUAZEIRO DO NORTE - CE
Endereço e CEP	PRACA CARLOS GOMES, SN - CENTRO CEP: 63.010-380				
Complemento		Telefone	(88)3566-1027	E-mail	juazeiro@ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 9 MEDICAO DO CONTRATO N 2025.09.02-0002 - CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. INSS SERV. DIVERSOS R$ 466.008,80 x 35% x R$ 163.103,08 x 11% = R$ 17.941,34
TERRAPLANAGEM R$ 31.688,95 x 15% x R$ 4.753,34 x 11% = R$ 522,87
PAVIMENTACAO ASFALTICA R$ 110.090,26 x 10% x R$ 11.009,03 x 11% = R$ 1.210,99 AQUISICAO R$ 572.855,82
TOTAL INSS ..... 178.865,45x11%=19.675,20 IRRF .....1.180.643,83x1,58%=17.709,66 Valor aproximado dos tributos..... = 72.609,60 CNO 90.025.6732375 SERVICO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.02 / 421110101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra	900256732375	Código ART	20251727123

TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS				TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS					
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	17.709,65	INSS(R$)	19.675,20	CSRF(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN	
Valor dos Serviços R$	1.180.643,83	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	1.180.643,83
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	472.257,53
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	37.384,85	0-Nenhum		Base de Cálculo	708.386,30
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	35.419,32	2 - Não		ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	1.107.839,66	Incentivador Cultural	2 - Não	(=) Valor do ISS R$	35.419,32
Valor IBS Municipal R$	0,00	Valor IBS Estadual R$	458,09	Valor CBS R$	4.122,81

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).

CORAL

CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Ofício nº 260622.1403

Juazeiro do Norte, 22 de junho de 2026

À
Secretaria de infraestrutura

Ref.:	Contrato nº 2025.09.02-0002
Assunto:	Envio da 9º medição do Contrato nº 2025.09.02-0002, relativa ao período de 01/03/2026 A 31/03/2026

Prezado Senhor,

A **CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.195.191/0001-33, com sede à Av. Senador Virgílio Távora, nº 1701, sala 408, Aldeota, CEP: 60.170-251, Fortaleza/CE, vem, respeitosamente, apresentar a 9ª medição relativa ao Contrato nº 2025.09.02-0002 (Contratação De Serviços A Serem Prestados Na Pavimentação E Recuperação De Pavimento Em Diversas Localidades, Por Intermédio Da Secretaria Municipal De Infraestrutura De Juazeiro Do Norte/CE), no valor de **R$ 1.180.643,83 (Um Milhão e Cento e Oitenta Mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Ressalta-se que o recibo encaminhado em anexo à documentação **possuirá validade e eficácia apenas após a realização do pagamento dos valores devidos em virtude desta medição**, de modo que seu envio antecipado consiste em mera formalidade para fins de instrumentalização do processo de pagamento. **A efetiva quitação do montante devido se dá apenas mediante transferência bancária com registro encaminhado ao Contratado.**

Certos da vossa compreensão, aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

CORAL – CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33

CORAL AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, 1701 – FONE: (85) 3261-0915
CNPJ 07.195.191/0001-33 – CGF 06.002.744-4
CEP 60.170-251 – Aldeota – Fortaleza – CE

Juazeiro do Norte/CE, 22 de junho de 2026.

A Secretaria de infraestrutura.

Assunto: Encaminhamento de medição parcial do contrato nº 2025.09.02-0002– SEINFRA.

Prezado Sr. Secretário,

A CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA., Inscrita no CNPJ nº 07.195.191/0001-33, detentora do Contrato Administrativo nº 2025.09.02-0002, **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE**, vem por meio desta encaminhar 9ª medição do referido contrato no valor de R$ 1.180.643,83 (Um Milhão e Cento e Oitenta Mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos).

Abaixo lista de documentos em anexo em 3 vias:

- ✓ NOTA FISCAL;
- ✓ RECIBO;
- ✓ BOLETIM DA MEDIÇÃO;
- ✓ MEMÓRIA DE CÁLCULO;
- ✓ CROQUIS DE SERVIÇOS;
- ✓ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;
- ✓ DIÁRIO DE OBRAS;
- ✓ CONTRATO;
- ✓ ORDEM DE SERVIÇOS;
- ✓ MATRICULA CEI;
- ✓ ART – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DR. IGO;
- ✓ ART – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DR. PAULO;
- ✓ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AO TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO;
- ✓ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS;
- ✓ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS;
- ✓ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF;
- ✓ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;
- ✓ PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE SOCIAL;
- ✓ RELAÇÃO DE TOMADOR OBRA – RET;
- ✓ RELATÓRIO ALALÍTICO DA GFR;
- ✓ RELATÓRIO RE;
- ✓ PGR;
- ✓ PCMSO.

Atenciosamente,

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CERTIDÃO DE MEDIÇÃO

Certifico e atesto para os devidos fins que os serviços que compõem a 9ª medição referente à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, de acordo com o Contrato Nº 2025.09.02-0002 na modalidade de Concorrência Pública nº 2025.05.05.1, foram executados regularmente e concluídos, comprovado através de visita técnica "in loco".

Juazeiro do Norte, 31 de março de 2026

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44978

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO JUAZEIRO DO NORTE

CONTRATADA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONTRATO Nº: 2025.09.02-0002

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 2025.05.05.1

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/03/2026 A 31/03/2026

QUADRO RESUMO FINANCEIRO DE VALORES DA OBRA
9º MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SUB-TOTAIS			SERVIÇOS EXECUTADOS 9º MEDIÇÃO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	3.770.638,40	13,69%	R$	99.403,68	2,64%
2	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM	R$	20.240.783,91	73,49%	R$	1.072.860,92	5,30%
3	PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO RECICLADO	R$	1.853.833,69	6,73%	R$	-	0,00%
4	CALÇADAS E PASSEIOS	R$	587.632,56	2,13%	R$	820,96	0,14%
5	PASSAGEM DE PEDESTRE ELEVADA	R$	162.490,48	0,59%	R$	-	0,00%
6	CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	R$	353.186,76	1,28%	R$	-	0,00%
7	SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL	R$	574.531,25	2,09%	R$	7.558,27	1,32%
TOTAL GERAL C/ BDI		**R$**	**27.543.097,05**	**100,00%**	**R$**	**1.180.643,83**	**4,29%**
TOTAL GERAL ACUMULADO		**R$**	**27.543.097,05**	**100,00%**	**R$**	**4.262.200,98**	**15,47%**

Juazeiro do Norte, 31 de março de 2026

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

Debgenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO JUAZEIRO DO NORTE

CONTRATADA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 2025.05.05.1

Data: 22 de junho de 2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (EXECUTADO)

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS		1º MEDIÇÃO		2º MEDIÇÃO		3º MEDIÇÃO		4º MEDIÇÃO		5º MEDIÇÃO		6º MEDIÇÃO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.770.638,40	13,69%	50.957,76	1,35%	21.758,01	0,58%	54.843,48	1,45%	78.895,46	2,09%	40.927,24	1,09%	19.654,63	0,52%
2	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM	20.240.783,91	73,49%	266.949,24	1,32%	516.892,94	2,55%	569.137,55	2,81%	709.168,74	3,50%	345.572,04	1,71%	217.393,40	1,07%
3	PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO RECICLADO	1.853.833,69	6,73%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	CALÇADAS E PASSEIOS	587.632,56	2,13%	25.279,34	4,30%	2.127,72	0,36%	-	0,00%	6.231,18	1,06%	-	0,00%	-	0,00%
5	PASSAGEM DE PEDESTRE ELEVADA	162.490,48	0,59%	23.394,35	14,40%	21.164,26	13,02%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6	CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	353.186,76	1,28%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
7	SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL	574.531,25	2,09%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
VALOR TOTAL		**27.543.097,05**	**100,00%**	**366.580,69**	**1,33%**	**561.942,93**	**2,04%**	**623.981,03**	**2,27%**	**794.295,38**	**2,88%**	**386.499,28**	**1,40%**	**237.048,03**	**0,86%**
VALOR TOTAL ACUMULADO				**366.580,69**	**1,33%**	**928.523,62**	**3,37%**	**1.552.504,65**	**5,64%**	**2.346.800,03**	**8,52%**	**2.733.299,31**	**9,92%**	**2.970.347,34**	**10,78%**

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS		7º MEDIÇÃO		8º MEDIÇÃO		9º MEDIÇÃO		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.770.638,40	13,69%	4.498,75	0,12%	4.559,17	0,12%	99.403,68	2,64%	1.131.713,41	30,01%	1.131.713,41	30,01%	1.131.713,41	30,01%
2	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM	20.240.783,91	73,49%	51.022,63	0,25%	51.129,26	0,25%	1.072.860,92	5,30%	5.480.219,06	27,08%	5.480.219,06	27,08%	5.480.219,06	27,08%
3	PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO RECICLADO	1.853.833,69	6,73%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	617.944,56	33,33%	617.944,56	33,33%	617.944,56	33,33%
4	CALÇADAS E PASSEIOS	587.632,56	2,13%	-	0,00%	-	0,00%	820,96	0,14%	184.391,12	31,38%	184.391,12	31,38%	184.391,12	31,38%
5	PASSAGEM DE PEDESTRE ELEVADA	162.490,48	0,59%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	39.310,62	24,19%	39.310,62	24,19%	39.310,62	24,19%
6	CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	353.186,76	1,28%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	117.728,92	33,33%	117.728,92	33,33%	117.728,92	33,33%
7	SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL	574.531,25	2,09%	-	0,00%	-	0,00%	7.558,27	1,32%	188.990,99	32,89%	188.990,99	32,89%	188.990,99	32,89%
VALOR TOTAL		**27.543.097,05**	**100,00%**	**55.521,38**	**0,20%**	**55.688,43**	**0,20%**	**1.180.643,83**	**4,29%**	**7.760.298,69**	**28,18%**	**7.760.298,69**	**28,18%**	**7.760.298,68**	**28,18%**
VALOR TOTAL ACUMULADO				**3.025.868,72**	**10,99%**	**3.081.557,15**	**11,19%**	**4.262.200,98**	**15,47%**	**12.022.499,67**	**43,65%**	**19.782.798,35**	**71,82%**	**27.543.097,05**	**100,00%**

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44879

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

B.D.I.: 20.73%
B.D.I. MAT. BETUMINOSO: 15.00%
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

VALOR CONTRATADO:	R$ 27.542097,05
VALOR ACUMULADO:	R$ 4.262200,98
SALDO ATUAL:	R$ 23.280896,07
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO (05/09/2025 A 31/10/2025)	R$ 366580,69
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO (01/11/2025 A 30/11/2025)	R$ 569942,93
VALOR DA 3ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/12/2025)	R$ 629981,03
VALOR DA 4ª MEDIÇÃO (01/01/2026 A 31/01/2026)	R$ 794295,38
VALOR DA 5ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 386499,28
VALOR DA 6ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/01/2026)	R$ 237048,03
VALOR DA 7ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 15/02/2026)	R$ 55521,38
VALOR DA 8ª MEDIÇÃO (16/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 55888,43
VALOR DA 9ª MEDIÇÃO	**R$ 1.180643,83**

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO								MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. S/ B.D.I	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R$) – C/ B.D.I	%
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 3.770.638,40**		**R$ 99.403,68**	**2,64%**		**R$ 375928,18**	**9,96%**
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	30,00	R$ 165,04	R$ 199,25	R$ 5.977,50	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0.00%
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	200.000,00	R$ 1,52	R$ 1,84	R$ 368.000,00	11.083,82	R$ 20.394,23	5,54%	41849,17	R$ 7702,48	20,92%
1.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	3.000,00	R$ 31,47	R$ 37,99	R$ 113.970,00	0,00	R$ -	0,00%	166,46	R$ 623,82	5,55%
1.4	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	17.000,00	R$ 12,16	R$ 14,68	R$ 249.560,00	1.348,50	R$ 19.795,98	7,93%	5433,07	R$ 7957,47	31,96%
1.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.200,00	R$ 11,47	R$ 13,85	R$ 16.620,00	0,00	R$ -	0,00%	124,00	R$ 1177,40	10,33%
1.6	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	300,00	R$ 298,30	R$ 360,14	R$ 108.042,00	0,00	R$ -	0,00%	4,80	R$ 128,67	1.60%
1.7	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	300,00	R$ 53,69	R$ 64,82	R$ 19.446,00	7,92	R$ 513,18	2,64%	290,01	R$ 1883,42	96,67%
1.8	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	6.600,00	R$ 5,79	R$ 6,99	R$ 46.134,00	0,00	R$ -	0,00%	158,81	R$ 1103,08	2.41%
1.9	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	96.000,00	R$ 2,62	R$ 3,16	R$ 303.360,00	2.885,10	R$ 9.116,92	3,01%	8442,10	R$ 2667,04	8.79%
1.10	C3134	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	6.000,00	R$ 58,96	R$ 71,18	R$ 427.080,00	259,60	R$ 18.478,65	4,33%	338,35	R$ 2404,08	5.64%

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 41979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

B.D.I.: 20,73%
B.D.I. MAT. BETUMINOSO: 15,00%
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

VALOR CONTRATADO:	R$ 27.54[illegible]097,05
VALOR ACUMULADO:	R$ 4.26[illegible]200,98
SALDO ATUAL:	R$ 23.28[illegible]896,07
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO (05/09/2025 A 31/10/2025)	R$ 36[illegible]580,69
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO (01/11/2025 A 30/11/2025)	R$ 56[illegible]942,93
VALOR DA 3ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/12/2025)	R$ 62[illegible]981,03
VALOR DA 4ª MEDIÇÃO (01/01/2026 A 31/01/2026)	R$ 79[illegible]295,38
VALOR DA 5ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 38[illegible]499,28
VALOR DA 6ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/01/2026)	R$ 23[illegible]048,03
VALOR DA 7ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 15/02/2026)	R$ 5[illegible]521,38
VALOR DA 8ª MEDIÇÃO (16/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 5[illegible]688,43
VALOR DA 9ª MEDIÇÃO	**R$ 1.18[illegible]643,83**

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO								MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. S/ B.D.I	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R$) – C/ B.D.I	%
1.11	4011297	BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	6.000,00	R$ 96,39	R$ 116,37	R$ 698.220,00	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
1.12	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	6.000,00	R$ 82,37	R$ 99,45	R$ 596.700,00	36,00	R$ 3.580,20	0,60%	448,21	R$ 44[illegible]74,74	7,47%
1.13	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	17.000,00	R$ 1,12	R$ 1,35	R$ 22.950,00	1.348,50	R$ 1.820,48	7,93%	3653,55	R$ [illegible]32,30	21,49%
1.14	C3259	CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5KM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DEMOLIDO	M3	585,00	R$ 34,18	R$ 41,27	R$ 24.142,95	0,00	R$ -	0,00%	11,99	R$ [illegible]95,02	2,05%
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9.015,20	R$ 4,13	R$ 4,99	R$ 44.985,85	443,55	R$ 2.213,33	4,92%	1706,46	R$ [illegible]15,25	18,93%
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	17.595,20	R$ 34,15	R$ 41,23	R$ 725.450,10	569,75	R$ 23.490,71	3,24%	1935,03	R$ 79[illegible]1,41	11,00%
2.0		**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM**					**R$ 20.240.783,91**		**R$ 1.072.860,92**	**5,30%**		**R$ 3.80[illegible]65,72**	**18,77%**
2.1	COMP CPA - 21.02.25-01	CAMADA POROSA DE ATRITO (CPA) COM ASFALTO POLÍMERO - BDI = 15,00	M3	750,00	R$ 1.324,39	R$ 1.523,05	R$ 1.142.287,50	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	7.500,00	R$ 1.474,91	R$ 1.696,15	R$ 12.721.125,00	365,34	R$ 619.672,46	4,87%	1277,26	R$ 2.16[illegible]3,64	17,03%
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	168.750,00	R$ 0,27	R$ 0,33	R$ 55.687,50	5.796,26	R$ 1.912,77	3,43%	24109,16	R$ [illegible]5,04	14,29%

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 19979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA-CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

B.D.I.: 20,73%
B.D.I. MAT. BETUMINOSO: 15,00%
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

VALOR CONTRATADO:	R$ 27.54[illegible]097,05
VALOR ACUMULADO:	R$ 4.26[illegible]200,98
SALDO ATUAL:	R$ 23.28[illegible]896,07
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO (05/09/2025 A 31/10/2025)	R$ 36[illegible]580,69
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO (01/11/2025 A 30/11/2025)	R$ 56[illegible]942,93
VALOR DA 3ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/12/2025)	R$ 62[illegible]981,03
VALOR DA 4ª MEDIÇÃO (01/01/2026 A 31/01/2026)	R$ 79[illegible]295,38
VALOR DA 5ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 38[illegible]499,28
VALOR DA 6ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/01/2026)	R$ 23[illegible]048,03
VALOR DA 7ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 15/02/2026)	R$ 5[illegible]521,38
VALOR DA 8ª MEDIÇÃO (16/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 5[illegible]688,43
VALOR DA 9ª MEDIÇÃO	**R$ 1.18[illegible]643,83**

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO								MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. S/ B.D.I	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R$) – C/ B.D.I	%
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	67,50	R$ 2.663,42	R$ 3.062,93	R$ 206.747,78	2,32	R$ 7.101,42	3,43%	9,64	R$ 29[illegible]37,87	14,29%
2.5	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	33.600,00	R$ 0,46	R$ 0,56	R$ 18.816,00	0,00	R$ -	0,00%	480,00	R$ [illegible]68,80	1,43%
2.6	INS 0809/03/2025	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	40,32	R$ 5.111,36	R$ 6.170,94	R$ 248.812,30	0,00	R$ -	0,00%	0,58	R$ [illegible]54,46	1,43%
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	1.192,33	R$ 391,66	R$ 472,85	R$ 563.793,24	55,15	R$ 26.076,43	4,63%	194,91	R$ 92[illegible]65,10	16,35%
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	21.184,92	R$ 24,95	R$ 30,12	R$ 638.089,79	935,69	R$ 28.183,00	4,42%	3273,37	R$ 98[illegible]93,94	15,45%
2.9	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	28.000,00	R$ 64,72	R$ 78,14	R$ 2.187.920,00	3.939,06	R$ 307.798,15	14,07%	12572,56	R$ 982[illegible]9,84	44,90%
2.10	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.200,00	R$ 57,03	R$ 68,85	R$ 82.620,00	0,00	R$ -	0,00%	523,40	R$ 3[illegible]65,09	43,62%
2.11	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	15.000,00	R$ 31,46	R$ 37,98	R$ 569.700,00	1.348,50	R$ 51.216,03	8,99%	4736,90	R$ 179[illegible]7,45	31,58%
2.12	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	M2	2.000,00	R$ 53,81	R$ 64,96	R$ 129.920,00	0,00	R$ -	0,00%	252,60	R$ 1[illegible]85,90	12,63%
2.13	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	18.000,00	R$ 26,49	R$ 31,98	R$ 575.640,00	377,00	R$ 12.056,46	2,09%	2350,50	R$ 75[illegible]2,99	13,06%

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - E 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

B.D.I.: 20.73%
B.D.I. MAT. BETUMINOSO: 15.00%
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

VALOR CONTRATADO:	R$ 27.541097,05
VALOR ACUMULADO:	R$ 4.262200,98
SALDO ATUAL:	R$ 23.278896,07
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO (05/09/2025 A 31/10/2025)	R$ 366580,69
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO (01/11/2025 A 30/11/2025)	R$ 569942,93
VALOR DA 3ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/12/2025)	R$ 629981,03
VALOR DA 4ª MEDIÇÃO (01/01/2026 A 31/01/2026)	R$ 792295,38
VALOR DA 5ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 384499,28
VALOR DA 6ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/01/2026)	R$ 237048,03
VALOR DA 7ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 15/02/2026)	R$ 55521,38
VALOR DA 8ª MEDIÇÃO (16/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 55588,43
VALOR DA 9ª MEDIÇÃO	**R$ 1.186643,83**

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO								MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. S/ B.D.I	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R$) – C/ B.D.I	%
2.14	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	15.000,00	R$ 29,90	R$ 36,10	R$ 541.500,00	522,00	R$ 18.844,20	3,48%	2524,00	R$ 91116,40	16,83%
2.15	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	3.000,00	R$ 52,30	R$ 63,14	R$ 189.420,00	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
2.16	COMP. CANALETA - 28/01/2025	CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA EM DIMENSÕES 45X35X100CM (M)	M	600,00	R$ 473,12	R$ 571,20	R$ 342.720,00	0,00	R$ -	0,00%	36,00	R$ 20633,20	6,00%
2.17	COMP-DESCIDA 01	DESCIDA DE ÁGUA - TIPO 1	M	120,00	R$ 104,52	R$ 126,19	R$ 15.142,80	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
2.18	COMP-DESCIDA TIPO 2	DESCIDA DE ÁGUA - 1,00m X 0,30m X 0,40m (CxHxL)	M	120,00	R$ 74,84	R$ 90,35	R$ 10.842,00	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
3.0		**PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO RECICLADO**					**R$ 1.853.833,69**		**R$ -**	**0,00%**		**R$ -**	**0,00%**
3.1	C5036	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	4.000,00	R$ 46,98	R$ 56,72	R$ 226.880,00	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
3.2	C4238	RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 215 Kg/m³ (S/ TRANSP.)	M3	3.000,00	R$ 112,06	R$ 135,29	R$ 405.870,00	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	6.300,00	R$ 19,32	R$ 23,33	R$ 146.979,00	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

B.D.I.: 20,73%
B.D.I. MAT. BETUMINOSO: 15,00%
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

VALOR CONTRATADO:	R$ 27.543097,05
VALOR ACUMULADO:	R$ 4.262200,98
SALDO ATUAL:	R$ 23.280896,07
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO (05/09/2025 A 31/10/2025)	R$ 366580,69
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO (01/11/2025 A 30/11/2025)	R$ 561942,93
VALOR DA 3ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/12/2025)	R$ 623981,03
VALOR DA 4ª MEDIÇÃO (01/01/2026 A 31/01/2026)	R$ 794295,38
VALOR DA 5ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 386499,28
VALOR DA 6ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/01/2026)	R$ 237148,03
VALOR DA 7ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 15/02/2026)	R$ 55121,38
VALOR DA 8ª MEDIÇÃO (16/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 55888,43
VALOR DA 9ª MEDIÇÃO	**R$ 1.180443,83**

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO								MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. S/ B.D.I	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R$) - C/ B.D.I	%
3.4	COMP.07/03/2025	CONCRETO ASFÁLTICO EM USINA COM ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO (ATÉ 10%) - BDI = 15,00	M3	750,00	R$ 1.140,24	R$ 1.311,28	R$ 983.460,00	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
3.5	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	18.750,00	R$ 0,27	R$ 0,33	R$ 6.187,50	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
3.6	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	7,50	R$ 2.663,42	R$ 3.062,93	R$ 22.971,98	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
3.7	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	7,50	R$ 391,66	R$ 472,85	R$ 3.546,38	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
3.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	1.923,60	R$ 24,95	R$ 30,12	R$ 57.938,83	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
4.0		**CALÇADAS E PASSEIOS**					**R$ 587.632,56**		**R$ 820,96**	**0,14%**		**R$ 34[illegible],20**	**5,86%**
4.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4.200,00	R$ 83,92	R$ 101,32	R$ 425.544,00	0,00	R$ -	0,00%	332,00	R$ 33[illegible],24	7,90%
4.2	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	264,00	R$ 196,34	R$ 237,04	R$ 62.578,56	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

B.D.I.: 20,73%
B.D.I. MAT. BETUMINOSO: 15,00%
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

VALOR CONTRATADO:	R$ 27.54[illegible]97,05
VALOR ACUMULADO:	R$ 4.26[illegible]00,98
SALDO ATUAL:	R$ 23.28[illegible]96,07
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO (05/09/2025 A 31/10/2025)	R$ 36[illegible]80,69
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO (01/11/2025 A 30/11/2025)	R$ 56[illegible]42,93
VALOR DA 3ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/12/2025)	R$ 62[illegible]81,03
VALOR DA 4ª MEDIÇÃO (01/01/2026 A 31/01/2026)	R$ 79[illegible]95,38
VALOR DA 5ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 38[illegible]99,28
VALOR DA 6ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/01/2026)	R$ 23[illegible]48,03
VALOR DA 7ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 15/02/2026)	R$ 55[illegible]21,38
VALOR DA 8ª MEDIÇÃO (16/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 55[illegible]88,43
VALOR DA 9ª MEDIÇÃO	**R$ 1.18[illegible]43,83**

			ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO						MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. S/ B.D.I	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R$) – C/ B.D.I	%
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	600,00	R$ 137,37	R$ 165,85	R$ 99.510,00	4,95	R$ 820,96	0,83%	4,95	R$ [illegible]20,96	0,83%
5.0		**PASSAGEM DE PEDESTRE ELEVADA**					**R$ 162.490,48**		**R$ -**	**0,00%**		**R$ [illegible]28,61**	**27,42%**
5.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	104,00	R$ 494,00	R$ 596,41	R$ 62.026,64	0,00	R$ -	0,00%	27,01	R$ [illegible]10,52	25,97%
5.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	104,00	R$ 175,28	R$ 211,62	R$ 22.008,48	0,00	R$ -	0,00%	26,99	R$ [illegible]12,57	25,96%
5.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	32,00	R$ 120,13	R$ 145,03	R$ 4.640,96	0,00	R$ -	0,00%	30,14	R$ [illegible]70,48	94,17%
5.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	3.520,00	R$ 11,56	R$ 13,96	R$ 49.139,20	0,00	R$ -	0,00%	1166,41	R$ [illegible]83,07	33,14%
5.5	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	320,00	R$ 63,87	R$ 77,11	R$ 24.675,20	0,00	R$ -	0,00%	27,00	R$ [illegible]2,97	8,44%
6.0		**CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS**					**R$ 353.186,76**		**R$ -**	**0,00%**		**R$ -**	**0,00%**
6.1	02.006.021 (I)	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA	ENS.	48,00	R$ 2.702,20	R$ 3.262,37	R$ 156.593,76	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

B.D.I.: 20.73%
B.D.I. MAT. BETUMINOSO: 15.00%
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

VALOR CONTRATADO:	R$ 27.542097,05
VALOR ACUMULADO:	R$ 4.262200,98
SALDO ATUAL:	R$ 23.280896,07
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO (05/09/2025 A 31/10/2025)	R$ 366580,69
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO (01/11/2025 A 30/11/2025)	R$ 561942,93
VALOR DA 3ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/12/2025)	R$ 623981,03
VALOR DA 4ª MEDIÇÃO (01/01/2026 A 31/01/2026)	R$ 794295,38
VALOR DA 5ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 386499,28
VALOR DA 6ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/01/2026)	R$ 237048,03
VALOR DA 7ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 15/02/2026)	R$ 55521,38
VALOR DA 8ª MEDIÇÃO (16/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 55888,43
VALOR DA 9ª MEDIÇÃO	**R$ 1.180643,83**

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO								MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. S/ B.D.I	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R$) – C/ B.D.I	%
6.2	COMP.24.02.25-01	ENSAIO DE ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE, MOLDAGEM. ROMPIMENTO E LAUDO TÉCNICO.	UN	1.200,00	R$ 40,15	R$ 48.47	R$ 58.164,00	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0.00%
6.3	01.001.0060-0	AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE CARACTERIZACAO	UN	100,00	R$ 554,71	R$ 669.70	R$ 66.970,00	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0.00%
6.4	01.001.0071-0	ENSAIO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICA DE SOLOS,COM UTILIZACAODE DILATOMETRO,EXCLUSIVE PERFURACAO	UN	100,00	R$ 591,89	R$ 714,59	R$ 71.459,00	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0.00%

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 34979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

B.D.I.: 20,73%
B.D.I. MAT. BETUMINOSO: 15,00%
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

VALOR CONTRATADO:	R$ 27.540.097,05
VALOR ACUMULADO:	R$ 4.262.200,98
SALDO ATUAL:	R$ 23.278.896,07
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO (05/09/2025 A 31/10/2025)	R$ 36.580,69
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO (01/11/2025 A 30/11/2025)	R$ 56.942,93
VALOR DA 3ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/12/2025)	R$ 62.981,03
VALOR DA 4ª MEDIÇÃO (01/01/2026 A 31/01/2026)	R$ 79.295,38
VALOR DA 5ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 38.499,28
VALOR DA 6ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/01/2026)	R$ 23.048,03
VALOR DA 7ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 15/02/2026)	R$ 5.521,38
VALOR DA 8ª MEDIÇÃO (16/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 5.688,43
VALOR DA 9ª MEDIÇÃO	**R$ 1.186,43**

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO								MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. S/ B.D.I	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R$) – C/ B.D.I	%
7.0		**SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL**					**R$ 574.531,25**		**R$ 7.558,27**	**1,32%**		**R$ 7.558,27**	**1,32%**
7.1	5213445	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	80,00	R$ 408,30	R$ 492,94	R$ 39.435,20	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
7.2	5213856	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	80,00	R$ 367,90	R$ 444,17	R$ 35.533,60	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
7.3	5213449	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	20,00	R$ 260,77	R$ 314,83	R$ 6.296,60	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
7.4	5213864	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	20,00	R$ 420,27	R$ 507,39	R$ 10.147,80	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
7.5	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	70,00	R$ 240,09	R$ 289,86	R$ 20.290,20	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
7.6	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	20,00	R$ 240,13	R$ 289,91	R$ 5.798,20	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
7.7	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	90,00	R$ 394,73	R$ 476,56	R$ 42.890,40	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

B.D.I.: 20.73%
B.D.I. MAT. BETUMINOSO: 15.00%
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

VALOR CONTRATADO:	R$ 27.543.097,05
VALOR ACUMULADO:	R$ 4.262.200,98
SALDO ATUAL:	R$ 23.280.896,07
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO (05/09/2025 A 31/10/2025)	R$ 366.580,69
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO (01/11/2025 A 30/11/2025)	R$ 569.942,93
VALOR DA 3ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/12/2025)	R$ 622.981,03
VALOR DA 4ª MEDIÇÃO (01/01/2026 A 31/01/2026)	R$ 794.295,38
VALOR DA 5ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 384.499,28
VALOR DA 6ª MEDIÇÃO (01/12/2025 A 31/01/2026)	R$ 237.148,03
VALOR DA 7ª MEDIÇÃO (01/02/2026 A 15/02/2026)	R$ 55.521,38
VALOR DA 8ª MEDIÇÃO (16/02/2026 A 28/02/2026)	R$ 55.888,43
VALOR DA 9ª MEDIÇÃO	**R$ 1.180.643,83**

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO								MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. S/ B.D.I	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R$) - C/ B.D.I	%
7.8	COMP. 01 - PLACA DE SINALIZAÇÃO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	45,00	R$ 774,35	R$ 934,87	R$ 42.069,15	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
7.9	C3629	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA. IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	M2	30,00	R$ 754,51	R$ 910,92	R$ 27.327,60	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
7.10	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	3.000,00	R$ 22,59	R$ 27,27	R$ 81.810,00	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
7.11	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	8.000,00	R$ 11,45	R$ 13,82	R$ 110.560,00	546,91	R$ 7.558,27	6,84%	546,91	R$ 7.558,27	6,84%
7.12	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	90,00	R$ 16,44	R$ 19,85	R$ 1.786,50	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
7.13	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	2.400,00	R$ 44,27	R$ 53,45	R$ 128.280,00	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
7.14	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	100,00	R$ 184,76	R$ 223,06	R$ 22.306,00	0,00	R$ -	0,00%	0,00	R$ -	0,00%
VALOR TOTAL - (C/ B.D.I. 20,71%)							**R$ 27.543.097,05**		**R$ 1.180.643,83**	**4,29%**		**R$ 4.262.200,98**	**15,47%**

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
		1.2	1.4	1.7	1.9	1.10	1.12	1.13	1.15	1.16	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	2.11	2.13	2.14	4.3	7.11
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	11083,82	1348,50	7,92	2885,10	259,60	36,00	1348,50	443,55	569,75	365,34	5796,26	2,32	55,15	935,69	3939,06	1348,50	377,00	5220	4,95	546,91
01.0	RUA JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA - TRECHO 4																				
01.1	=78*8,1+103*8,1	1466,10																			
01.2	=(53+78+6+93+103)*0,3*0,07			6,99																	
01.3	=78*8,1+103*8,1				1466,10																
01.4	=1334,1*0,1					133,41															
01.5	=1466,1*0,05*1,3+6,993*1,3								104,39												
01.6	=104,3874									104,39											
01.7	-78*8,1+103*8,1															1466,10					
01.8	=53+78-6+93+103																	333,00			
01.9	=78*2+103*2																		3620		
02.0	RUA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO																				
02.1	=145*7,6	1102,00																			
02.2	-145*7,6				1102,00																
02.3	-1102*0,05*1,3								71,63												
02.4	=71,63									71,63											
02.5	=145*7,6															1102,00					
02.6	=160																		1601		
02.0-A	RUA JOSE ANASTACIO TAVARES																				
02.1	-7*5+30*7+8*9+2*2+6*3-7*2	353,00																			
02.2	-(2*2+6*3-7*2)*0,6		21,60																		
02.3	=(22+10)*0,3*0,07			0,67																	
02.4	=7*5+30*7+8*9				317,00																

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44970-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																		
		1.2	1.4	1.7	1.9	1.10	1.12	1.13	1.15	1.16	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	2.11	2.13	2.14	4.3	7.11
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	11083,82	1348,50	7,92	2885,10	259,60	36,00	1348,50	443,55	569,75	365,34	5796,26	2,32	55,15	935,69	3939,06	1348,50	377,00	52,00	4,95	546,91
02.5	=(2*2+6*3-7*2)*0,6							21,60													
02.6	=353*0,05*1,3+0,672*1,3								23,82												
02.7	=23,8186									23,82											
02.8	-7*5+30*7+8*9+(2*2-6*3+7*2)*0,4															331,40					
02.8	=(2*2+6*3-7*2)*0,6																21,60				
02.9	=22+10																	32,00			
03.0	AVENIDA AILTON GOMES																				
03.1	=122,68	122,68																			
03.2	-6,8165										6,82										
03.3	-122,68											122,68									
03.4	=122,68*0,0004												0,05								
03.5	=6,8165*2,5548*0,0566+0,049072													1,03							
03.6	=6,8165*2,5548+0,049072														17,46						
04.0	RUA ANTÔNIO VIEIRA																				
04.1	-56,16	56,16																			
04.2	-4,4928										4,49										
04.3	=56,16											56,16									
04.4	=56,16*0,0004												0,02								
04.5	=4,4928*2,5548*0,0566+0,022464													0,67							
04.6	=4,4928*2,5548+0,022464														11,50						
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO																				

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 14979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																		
		1.2	1.4	1.7	1.9	1.10	1.12	1.13	1.15	1.16	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	2.11	2.13	2.14	4.3	7.11
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	11083,82	1348,50	7,92	2885,10	259,60	36,00	1348,50	443,55	569,75	365,34	5796,26	2,32	55,15	935,69	3939,06	1348,50	377,00	52,00	4,95	546,91
05.1	=638,99	638,99																			
05.2	=29,8927										29,89										
05.3	=638,99											638,99									
05.4	=638,99*0,0004												0,26								
05.5	=29,8927*2,5548*0,0566+0,255596													4,58							
05.6	=29,8927*2,5548+0,255596														76,63						
06.0	RUA FREI DAMIÃO																				
06.1	=29,8*5,2	154,96																			
06.2	=12*0,07*0,3			0,25																	
06.3	=28,8*5*0,25						36,00														
06.4	=154,96*0,05*1,3+0,252*1,3								10,40												
06.5	=10,4									10,40											
06.6	=29,8*5,2															154,96					
06.7	=12																	12,00			
07.0	RUA JOÃO DIAS DE OLIVEIRA																				
07.1	=2,5*2+10*6+4*40	225,00																			
07.2	=(2,5*2+10*6+4*40)*0,6		135,00																		
07.3	=(2,5*2+10*6+4*40)*0,6							135,00													
07.4	=225*0,05*1,3								14,63												
07.5	=14,625									14,63											
07.6	=(2,5*2+10*6+4*40)*0,4															90,00					
07.7	=(2,5*2+10*6+4*40)*0,6																135,00				

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 14979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																		
		1.2	1.4	1.7	1.9	1.10	1.12	1.13	1.15	1.16	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	2.11	2.13	2.14	4.3	7.11
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	11083,82	1348,50	7,92	2885,10	259,60	36,00	1348,50	443,55	569,75	365,34	5796,26	2,32	55,15	935,69	3939,06	1348,50	377,00	52,00	4,95	546,91
08.0	RUA PIO X																				
08.1	=150,29	150,29																			
08.2	=7,7782										7,78										
08.3	=150,29											150,29									
08.4	=150,29*0,0004												0,06								
08.5	=7,7782*2,5548*0,0566+0,060116													1,18							
08.6	=7,7782*2,5548+0,060116														19,93						
09.0	RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ																				
09.1	=24.72	24.72																			
09.2	=1.7328										1,73										
09.3	=24,72											24,72									
09.4	=24,72*0,0004												0,01								
09.5	=1,7328*2,5548*0,0566+0,009888													0,26							
09.6	=1,7328*2,5548+0,009888														4,44						
10.0	RUA SÃO PEDRO																				
10.1	=20,88	20,88																			
10.2	=1,6704										1,67										
10.3	=20,88											20,88									
10.4	=20,88*0,0004												0,01								
10.5	=1,6704*2,5548*0,0566+0,008352													0,25							
10.6	=1,6704*2,5548+0,008352														4,28						

Deógenes C Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - E - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																		
		1.2	1.4	1.7	1.9	1.10	1.12	1.13	1.15	1.16	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	2.11	2.13	2.14	4.3	7.11
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	11083,82	1348,50	7,92	2885,10	259,60	36,00	1348,50	443,55	569,75	365,34	5796,26	2,32	55,15	935,69	3939,06	1348,50	377,00	52,00	4,95	546,91
11.0	RUA DUCA BRINGEL																				
11.1	=58,2	58.20																			
11.2	=4,656										4,66										
11.3	=58,2											58,20									
11.4	=58,2*0,0004												0,02								
11.5	=4,656*2,5548*0,0566+0,02328													0,70							
11.6	=4,656*2,5548+0,02328														11,92						
12.0	RUA SÃO PAULO																				
12.1	=9.6	9,60																			
12.2	=0,768										0,77										
12.3	=9,6											9,60									
12.4	=9,6*0,0004												0,00								
12.5	=0,768*2,5548*0,0566+0,00384													0,11							
12.6	=0,768*2,5548+0,00384														1,97						
13.0	AV. LEANDRO BEZERRA (PRAÇA DO MEMORIAL PADRE CICERO																				
13.1	=0,3*0,3*55																			4,95	
13.2	=143*0.1-3*1-2*1,5+819*0,3+24*1.39+64,06*2,54+40*0,4*2,54+29*0,6*2,54																				546,91
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO																				
14.1	=200,58	200,58																			
14.2	=10,029										10,03										
14.3	=200,58											200,58									
14.4	=200,58*0,0004												0,08								

Dédgenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA-CE - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																		
		1.2	1.4	1.7	1.9	1.10	1.12	1.13	1.15	1.16	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	2.11	2.13	2.14	4.3	7.11
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	11083,82	1348,50	7,92	2885,10	259,60	36,00	1348,50	443,55	569,75	365,34	5796,26	2,32	55,15	935,69	3939,06	1348,50	377,00	5220,0	4,95	546,91
14.5	=10,029*2,5548*0,0566+0,080232													1,53							
14.6	=10,029*2,5548+0,080232														25,70						
15.0	RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO																				
15.1	=39,59	39,59																			
15.2	=3,1126										3,11										
15.3	=39,59											39,59									
15.4	=39,59*0,0004												0,02								
15.5	=3,1126*2,5548*0,0566+0,015836													0,47							
15.6	=3,1126*2,5548+0,015836														7,97						
16.0	AVENIDA ANA SARAIVA DE MENEZES																				
16.1	=37,76	37,76																			
16.2	=3,0208										3,02										
16.3	=37,76											37,76									
16.4	=37,76*0,0004												0,02								
16.5	=3,0208*2,5548*0,0566+0,015104													0,45							
16.6	=3,0208*2,5548+0,015104														7,73						
17.0	RUA ANITA NEVES																				
17.1	=(20*2,5+2*3+4*4+25*2,5+2*2+10*6+2*2+15*2+4*3+10*2+15*6+5*4+8*2+12*6+3*3−2*2−10*5+3*2+2*2+2*2,5+3,5*3)	551,00																			
17.2	=(20*2,5+2*3+4*4+25*2,5+2*2+10*6+2*2+15*2+4*3+10*2+15*6+5*4+8*2+12*6 3*3+2*2+10*5+3*2+2*2+2*2,5+3,5*3)*0,6		330,60																		
17.3	=(20*2,5+2*3+4*4+25*2,5+2*2+10*6+2*2+15*2+4*3+10*2+15*6+5*4+8*2+12*6−3*3+2*2+10*5+3*2+2*2+2*2,5+3,5*3)*0,6							330,60													

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - E 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - 9º MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
		1.2	1.4	1.7	1.9	1.10	1.12	1.13	1.15	1.16	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	2.11	2.13	2.14	4.3	7.11
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	11083,82	1348,50	7,92	2885,10	259,60	36,00	1348,50	443,55	569,75	365,34	5796,26	2,32	55,15	935,69	3939,06	1348,50	377,00	52,00	4,95	546,91
17.4	=551*0,1*1,3								71,63												
17.5	=71,63									71,63											
17.6	=(20*2,5+2*3+4*4+25*2,5+2*2+10*6+2*2+15*2+4*3+10*2+15*6+5*4+8*2+12*6-3*3+2*2+10*5+3*2+2*2+2*2,5+3,5*3)*0,4															220,40					
17.7	=(20*2,5+2*3+4*4+25*2,5+2*2+10*6+2*2+15*2+4*3+10*2+15*6+5*4+8*2+12*6-3*3+2*2+10*5+3*2+2*2+2*2,5+3,5*3)*0,6																330,60				
18.0	RUA PADRE JOÃO MORETTI																				
18.1	=(12*2,5+10*2+6*6+4*5+3*3+2*2+3*2+8*4+2*2+5*3+4*3+4*4+2*2+3*2+4*4+8*6)	278,00																			
18.2	=(12*2,5+10*2+6*6+4*5+3*3+2*2+3*2+8*4+2*2+5*3+4*3+4*4+2*2+3*2+4*4+8*6)*0,6		166,80																		
18.3	=(12*2,5+10*2+6*6+4*5+3*3+2*2+3*2+8*4+2*2+5*3+4*3+4*4+2*2+3*2+4*4+8*6)*0,6							166,80													
18.4	=278*0,1*1,3								36,14												
18.5	=36,14									36,14											
18.6	=(12*2,5+10*2+6*6+4*5+3*3+2*2+3*2+8*4+2*2+5*3+4*3+4*4+2*2+3*2+4*4+8*6)*0,4															111,20					
18.7	=(12*2,5+10*2+6*6+4*5+3*3+2*2+3*2+8*4+2*2+5*3+4*3+4*4+2*2+3*2+4*4+8*6)*0,6																166,80				
19.0	RUA VITAL LISBOA																				
19.1	=(2*1,5+2*2+7*2)	21,00																			
19.2	=(2*1,5-2*2+7*2)*0,6		12,60																		
19.3	=(2*1,5-2*2+7*2)*0,6							12,60													
19.4	=21*0,1*1,3								2,73												
19.5	=2,73									2,73											
19.6	=(2*1,5-2*2+7*2)*0,4															8,40					
19.7	=(2*1,5 2*2 7*2)*0,6																12,60				
20.0	RUA DR. BELEM DE FIGUEIREDO																				

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
		1.2	1.4	1.7	1.9	1.10	1.12	1.13	1.15	1.16	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	2.11	2.13	2.14	4.3	7.11
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	11083,82	1348,50	7,92	2885,10	259,60	36,00	1348,50	443,55	569,75	365,34	5796,26	2,32	55,15	935,69	3939,06	1348,50	377,00	52,00	4,95	546,91
20.1	=(7*5+3,5*2+5*5+12*8+15*3+20*9+10*6+7*5+15*3)	528,00																			
20.2	=(7*5+3,5*2+5*5-12*8+15*3+20*9+10*6+7*5+15*3)*0,6		316,80																		
20.3	=(7*5+3,5*2+5*5+12*8+15*3+20*9+10*6+7*5+15*3)*0,6							316,80													
20.4	=528*0,1*1,3								68,64												
20.5	=68,64									68,64											
20.6	=(7*5+3,5*2+5*5-12*8+15*3+20*9+10*6+7*5+15*3)*0,4															211,20					
20.7	=(7*5+3,5*2+5*5-12*8+15*3+20*9+10*6+7*5+15*3)*0,6																316,80				
21.0	RUA SÃO MAMEDE																				
21.1	=171,51	171,51																			
21.2	=9,6987										9,70										
21.3	=171,51											171,51									
21.4	=171,51*0,0004												0,07								
21.5	=9,6987*2,5548*0,0566+0,068604													1,47							
21.6	=9,6987*2,5548+0,068604														24,85						
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS																				
22.1	=146,6	146,60																			
22.2	=7,6468										7,65										
22.3	=146,6											146,60									
22.4	=146,6*0,0004												0,06								
22.5	=7,6468*2,5548*0,0566+0,05864													1,16							
22.6	=7,6468*2,5548+0,05864														19,59						

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																		
		1.2	1.4	1.7	1.9	1.10	1.12	1.13	1.15	1.16	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	2.11	2.13	2.14	4.3	7.11
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	11083,82	1348,50	7,92	2885,10	259,60	36,00	1348,50	443,55	569,75	365,34	5796,26	2,32	55,15	935,69	3939,06	1348,50	377,00	52,00	4,95	546,91
23.0	AVENIDA CARLOS CRUZ																				
23.1	=11.66	11.66																			
23.2	=0.9328										0,93										
23.3	=11.66											11,66									
23.4	=11.66*0,0004												0,00								
23.5	=0,9328*2,5548*0,0566+0,004664													0,14							
23.6	=0,9328*2,5548+0,004664														2,39						
24.0	RUA SÃO BENEDITO																				
24.1	=12.89	12.89																			
24.2	=1.0312										1,03										
24.3	=12,89											12,89									
24.4	=12,89*0,0004												0,01								
24.5	=1,0312*2,5548*0,0566+0,005156													0,15							
24.6	=1,0312*2,5548+0,005156														2,64						
25.0	RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA																				
25.1	=49,35	49,35																			
25.2	=3.1581										3,16										
25.3	=49,35											49,35									
25.4	=49,35*0,0004												0,02								
25.5	=3,1581*2,5548*0,0566+0,01974													0,48							
25.6	=3,1581*2,5548+0,01974														8,09						
26.0	RUA MANOEL GOUVEIA																				

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - E 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
		1.2	1.4	1.7	1.9	1.10	1.12	1.13	1.15	1.16	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	2.11	2.13	2.14	4.3	7.11
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	11083,82	1348,50	7,92	2885,10	259,60	36,00	1348,50	443,55	569,75	365,34	5796,26	2,32	55,15	935,69	3939,06	1348,50	377,00	5220	4,95	546,91
26.1	=4*5 3*2+25*4,5+12*2+3*2+10*6+5*6	258,50																			
26.2	=(4*5+3*2+25*4,5+12*2-3*2-10*6+5*6)*0,6		155,10																		
26.3	=(4*5+3*2+25*4,5+12*2 3*2 10*6+5*6)*0,6							155,10													
26.4	=258,5*0,05*1,3								16,80												
26.5	=16,8025									16,80											
26.6	=(4*5+3*2+25*4,5+12*2-3*2-10*6+5*6)*0,4															103,40					
26.7	=(4*5+3*2+25*4,5+12*2-3*2-10*6+5*6)*0,6																155,10				
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA																				
27.1	=374,45	374,45																			
27.2	=16,9957										17,00										
27.3	=374,45											374,45									
27.4	-374,45*0,0004												0,15								
27.5	-16,9957*2,5548*0,0566+0,14978													2,61							
27.6	=16,9957*2,5548+0,14978														43,57						
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO																				
28.1	=675,23	675,23																			
28.2	=41,108										41,11										
28.3	-675,23											675,23									
28.4	-675,23*0,0004												0,27								
28.5	=41,108*2,5548*0,0566+0,270092													6,21							
28.6	=41,108*2,5548+0,270092														105,29						

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																		
		1.2	1.4	1.7	1.9	1.10	1.12	1.13	1.15	1.16	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	2.11	2.13	2.14	4.3	7.11
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	11083,82	1348,50	7,92	2885,10	259,60	36,00	1348,50	443,55	569,75	365,34	5796,26	2,32	55,15	935,69	3939,06	1348,50	377,00	522,00	4,95	546,91
29.0	RUA LEÃO XIII																				
29.1	=31.98	31.98																			
29.2	=1,599										1,60										
29.3	=31.98											31,98									
29.4	=31.98*0,0004												0,01								
29.5	=1,599*2,5548*0,0566+0,012792													0,24							
29.6	=1,599*2.5548+0,012792														4,10						
30.0	RUA PADRE CÍCERO																				
30.1	=103,03	103,03																			
30.2	=5.1515										5,15										
30.3	=103,03											103,03									
30.4	=103,03*0,0004												0,04								
30.5	=5,1515*2,5548*0,0566+0,041212													0,79							
30.6	=5,1515*2.5548+0,041212														13,20						
31.0	RUA DO CRUZEIRO																				
31.1	=3,42	3,42																			
31.2	=0,171										0,17										
31.3	=3,42											3,42									
31.4	=3,42*0,0004												0,00								
31.5	=0,171*2,5548*0,0566+0,001368													0,03							
31.6	=0,171*2,5548+0,001368														0,44						
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA																				

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																		
		1.2	1.4	1.7	1.9	1.10	1.12	1.13	1.15	1.16	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	2.11	2.13	2.14	4.3	7.11
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	11083,82	1348,50	7,92	2885,10	259,60	36,00	1348,50	443,55	569,75	365,34	5796,26	2,32	55,15	935,69	3939,06	1348,50	377,00	52,00	4,95	546,91
32.1	=66,76	66,76																			
32.2	=3,338										3,34										
32.3	=66,76											66,76									
32.4	=66,76*0,0004												0,03								
32.5	=3,338*2,5548*0,0566+0,026704													0,51							
32.6	=3,338*2,5548+0,026704														8,55						
33.0	RUA PADRE ANTÔNIO ALMEIDA AGRA																				
33.1	=1183	1183,00																			
33.2	=59,15										59,15										
33.3	=1183											1183,00									
33.4	=1183*0,0004												0,47								
33.5	=59,15*2,5548*0,0566+0,4732													9,03							
33.6	=59,15*2,5548+0,4732														151,59						
34.0	AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA																				
34.1	=80,26	80,26																			
34.2	=4,013										4,01										
34.3	=80,26											80,26									
34.4	=80,26*0,0004												0,03								
34.5	=4,013*2,5548*0,0566+0,032104													0,61							
34.6	=4,013*2,5548+0,032104														10,28						
35.0	RUA SANTO AGOSTINHO																				

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																		
		1.2	1.4	1.7	1.9	1.10	1.12	1.13	1.15	1.16	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	2.11	2.13	2.14	4.3	7.11
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	11083,82	1348,50	7,92	2885,10	259,60	36,00	1348,50	443,55	569,75	365,34	5796,26	2,32	55,15	935,69	3939,06	1348,50	377,00	52,00	4,95	546,91
35.1	=57.65	57.65																			
35.2	=1.7295										1,73										
35.3	=57,65											57,65									
35.4	=57,65*0,0004												0,02								
35.5	=1,7295*2,5548*0,0566+0,02306													0,27							
35.6	=1,7295*2,5548+0,02306														4,44						
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM																				
36.1	=668,15	668,15																			
36.2	=C314*0.1					66,82															
36.3	=66,815									66,82											
36.2	=61,8168										61,82										
36.3	=668,15											668,15									
36.4	=668,15*0,0004												0,27								
36.5	=61,8168*2,5548*0,0566+0,26726													9,21							
36.6	=61,8168*2,5548+0,26726														158,20						
37.0	RUA SANTA CECÍLIA																				
37.1	=38.61	38.61																			
37.2	=1,1583										1,16										
37.3	=38.61											38,61									
37.4	=38.61*0,0004												0,02								
37.5	=1.1583*2,5548*0,0566+0.015444													0,18							
37.6	=1.1583*2,5548+0.015444														2,97						

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - E - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																		
		1.2	1.4	1.7	1.9	1.10	1.12	1.13	1.15	1.16	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	2.11	2.13	2.14	4.3	7.11
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	11083,82	1348,50	7,92	2885,10	259,60	36,00	1348,50	443,55	569,75	365,34	5796,26	2,32	55,15	935,69	3939,06	1348,50	377,00	52,00	4,95	546,91
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA																				
38.1	=43.07	43.07																			
38.2	=2.1535										2,15										
38.3	=43.07											43,07									
38.4	=43,07*0,0004												0,02								
38.5	=2,1535*2,5548*0,0566+0,017228													0,33							
38.6	=2.1535*2,5548+0,017228														5,52						
39.0	RUA TODOS OS SANTOS																				
39.1	=36,39	36.39																			
39.2	=1,8195										1,82										
39.3	=36,39											36,39									
39.4	=36,39*0,0004												0,01								
39.5	=1,8195*2,5548*0,0566+0,014556													0,28							
39.6	=1,8195*2,5548+0,014556														4,66						
40.0	RUA COLETOR JOSE VITORINO																				
40.1	=40*6+13*5+15*3	350,00																			
40.2	=(40*6+13*5+15*3)*0.6		210,00																		
40.3	=(40*6+13*5+15*3)*0.6							210,00													
40.4	=350*0.05*1,3								22,75												
40.5	=22,75									22,75											
40.6	=(40*6+13*5+15*3)*0.4															140,00					

Beógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 4979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA [illegible] - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
		1.2	1.4	1.7	1.9	1.10	1.12	1.13	1.15	1.16	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	2.11	2.13	2.14	4.3	7.11
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	11083,82	1348,50	7,92	2885,10	259,60	36,00	1348,50	443,55	569,75	365,34	5796,26	2,32	55,15	935,69	3939,06	1348,50	377,00	52,00	4,95	546,91
40.7	=(40*6|13*5|15*3)*0.6																210,00				
41.0	RUA CORONEL FAUSTO GUIMARÃES																				
41.1	=28,54	28,54																			
41.2	=2,1344										2,13										
41.3	=28,54											28,54									
41.4	=28,54*0,0004												0,01								
41.5	=2,1344*2,5548*0,0566|0,011416													0,32							
41.6	=2,1344*2,5548|0,011416														5,46						
42.0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA																				
42.1	=87,43	87,43																			
42.2	=4,3715										4,37										
42.3	=87,43											87,43									
42.4	=87,43*0,0004												0,03								
42.5	=4.3715*2,5548*0,0566+0.034972													0,67							
42.6	=4.3715*2,5548+0.034972														11,20						
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ																				
43.1	=547,29	547,29																			
43.2	=454,28*0,1+93,01*0,15					59,38															
43.3	=59,3795									59,38											
43.4	=60,6303										60,63										
43.5	=547,29											547,29									

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 14979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																		
		1.2	1.4	1.7	1.9	1.10	1.12	1.13	1.15	1.16	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	2.11	2.13	2.14	4.3	7.11
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	11083,82	1348,50	7,92	2885,10	259,60	36,00	1348,50	443,55	569,75	365,34	5796,26	2,32	55,15	935,69	3939,06	1348,50	377,00	522,00	4,95	546,91
43.6	=547,29*0,0004												0,22								
43.7	=60,6303*2.5548*0.0566+0,218916													8,99							
43.8	=60,6303*2.5548+0,218916														155,12						
44.0	RUA MANOEL TAVARES LOPES																				
44.1	=19,54	19,54																			
44.2	=1,5632										1,56										
44.3	=19,54											19,54									
44.4	=19,54*0,0004												0,01								
44.5	=1,5632*2.5548*0.0566+0,007816													0,23							
44.6	=1,5632*2.5548+0,007816														4,00						

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - E - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B1	1,60	X	1,60	=	2,56	X	0,05	=	0,13
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B2	1,80	X	1,50	=	2,70	X	0,05	=	0,14
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B3	2,00	X	1,70	=	3,40	X	0,05	=	0,17
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B4	2,60	X	1,80	=	4,68	X	0,05	=	0,23
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B5	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B6	3,00	X	2,90	=	8,70	X	0,05	=	0,44
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B7	2,40	X	1,30	=	3,12	X	0,05	=	0,16
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B8	2,70	X	1,40	=	3,78	X	0,05	=	0,19
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B9	3,00	X	2,30	=	6,90	X	0,05	=	0,35
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B10	1,30	X	1,30	=	1,69	X	0,05	=	0,08
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B11	2,20	X	1,30	=	2,86	X	0,05	=	0,14
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B12	1,90	X	1,70	=	3,23	X	0,05	=	0,16
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B13	1,90	X	1,60	=	3,04	X	0,05	=	0,15
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B14	2,40	X	1,50	=	3,60	X	0,05	=	0,18
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B15	1,20	X	1,20	=	1,44	X	0,05	=	0,07
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B16	1,80	X	1,60	=	2,88	X	0,05	=	0,14
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B17	1,70	X	1,30	=	2,21	X	0,05	=	0,11
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B18	2,30	X	1,70	=	3,91	X	0,05	=	0,20
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B19	1,70	X	1,60	=	2,72	X	0,05	=	0,14
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B20	2,10	X	1,30	=	2,73	X	0,05	=	0,14
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B21	1,50	X	1,30	=	1,95	X	0,05	=	0,10
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B22	1,70	X	1,70	=	2,89	X	0,05	=	0,14
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B23	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B24	1,20	X	1,20	=	1,44	X	0,05	=	0,07
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B25	1,90	X	1,60	=	3,04	X	0,05	=	0,15
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B26	2,20	X	1,70	=	3,74	X	0,05	=	0,19
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B27	6,50	X	2,10	=	13,65	X	0,10	=	1,37
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B28	8,60	X	1,20	=	10,32	X	0,05	=	0,52
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B29	1,40	X	1,10	=	1,54	X	0,05	=	0,08
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B30	2,00	X	2,40	=	4,80	X	0,05	=	0,24
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B31	2,80	X	2,60	=	7,28	X	0,05	=	0,36
03.0	AVENIDA AILTON GOMES	ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA	DIVERSOS	02/03/2026	B32	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,05	=	0,11
03.0	**AVENIDA AILTON GOMES**	**ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA**	**DIVERSOS**					**ÁREA**	**=**	**122,68**		**VOLUME**	**=**	**6,82**
04.0	RUA ANTÔNIO VIEIRA	ENCONTRO COM A RUA MARIA DO SOCORRO	PROFESSORA MARIA GERLI	02/03/2026	B1	15,60	X	3,60	=	56,16	X	0,08	=	4,49
04.0	**RUA ANTÔNIO VIEIRA**	**ENCONTRO COM A RUA MARIA DO SOCORRO**	**PROFESSORA MARIA GERLI**					**ÁREA**	**=**	**56,16**		**VOLUME**	**=**	**4,49**
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	02/03/2026	B1	2,30	X	4,50	=	10,35	X	0,08	=	0,83

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA-CE - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	Mº	5796,26		VOLUME	Mº	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (Mº)		ESP.		VOLUME (Mº)
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	02/03/2026	B2	5,60	X	3,50	=	19,60	X	0,05	=	0,98
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	02/03/2026	B3	4,00	X	2,80	=	11,20	X	0,05	=	0,56
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	02/03/2026	B4	1,20	X	1,40	=	1,68	X	0,05	=	0,08
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	02/03/2026	B5	2,40	X	1,50	=	3,60	X	0,08	=	0,29
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B1-A	1,20	X	1,20	=	1,44	X	0,05	=	0,07
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B2-A	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,05	=	0,13
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B3-A	1,60	X	1,50	=	2,40	X	0,05	=	0,12
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B4-A	1,50	X	1,10	=	1,65	X	0,05	=	0,08
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B5-A	1,70	X	1,70	=	2,89	X	0,05	=	0,14
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B6	3,00	X	1,10	=	3,30	X	0,05	=	0,17
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B7	1,90	X	1,10	=	2,09	X	0,05	=	0,10
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B8	1,90	X	1,30	=	2,47	X	0,05	=	0,12
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B9	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B10	1,80	X	1,30	=	2,34	X	0,05	=	0,12
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B11	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B12	4,00	X	2,50	=	10,00	X	0,05	=	0,50
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B13	2,00	X	1,60	=	3,20	X	0,05	=	0,16
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B14	2,20	X	1,70	=	3,74	X	0,05	=	0,19
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B15	2,30	X	1,40	=	3,22	X	0,05	=	0,16
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B16	2,00	X	1,40	=	2,80	X	0,05	=	0,14
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B17	2,30	X	1,60	=	3,68	X	0,05	=	0,18
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B18	1,50	X	1,20	=	1,80	X	0,05	=	0,09
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B19	1,40	X	1,40	=	1,96	X	0,05	=	0,10
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B20	1,90	X	1,50	=	2,85	X	0,05	=	0,14
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B21	0,80	X	0,80	=	0,64	X	0,05	=	0,03
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	05/03/2026	B22	2,50	X	2,40	=	6,00	X	0,08	=	0,48
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	09/03/2026	B23	1,20	X	1,40	=	1,68	X	0,05	=	0,08
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	09/03/2026	B24	1,70	X	1,90	=	3,23	X	0,05	=	0,16
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	09/03/2026	B25	1,70	X	1,70	=	2,89	X	0,05	=	0,14
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	09/03/2026	B26	1,40	X	1,00	=	1,40	X	0,05	=	0,07
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	09/03/2026	B27	1,10	X	0,80	=	0,88	X	0,05	=	0,04
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	09/03/2026	B28	1,60	X	1,50	=	2,40	X	0,05	=	0,12
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	B29	1,80	X	1,80	=	3,24	X	0,05	=	0,16
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	B30	5,10	X	2,70	=	13,77	X	0,08	=	1,10
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	B31	3,10	X	1,40	=	4,34	X	0,08	=	0,35
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	B32	0,80	X	0,50	=	0,40	X	0,05	=	0,02
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	B33	2,10	X	1,80	=	3,78	X	0,05	=	0,19
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	B34	1,00	X	0,60	=	0,60	X	0,05	=	0,03
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	B35	2,80	X	1,80	=	5,04	X	0,08	=	0,40
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	B36	4,60	X	2,50	=	11,50	X	0,08	=	0,92
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	B37	0,60	X	0,60	=	0,36	X	0,05	=	0,02

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Andrade Magalhães
Engº Civil - CREA [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	Mº	5796,26		VOLUME	Mº	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B38**	1,80	X	1,60	=	2,88	X	0,05	=	0,14
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B39**	1,90	X	1,60	=	3,04	X	0,05	=	0,15
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B40**	0,50	X	0,50	=	0,25	X	0,05	=	0,01
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B41**	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B42**	1,40	X	1,60	=	2,24	X	0,05	=	0,11
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B43**	1,90	X	0,70	=	1,33	X	0,05	=	0,07
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B44**	0,60	X	0,50	=	0,30	X	0,05	=	0,02
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B45**	1,80	X	1,10	=	1,98	X	0,05	=	0,10
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B46**	2,50	X	1,20	=	3,00	X	0,05	=	0,15
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B47**	2,60	X	1,60	=	4,16	X	0,08	=	0,33
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B48**	2,40	X	0,40	=	0,96	X	0,08	=	0,08
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B49**	1,50	X	2,40	=	3,60	X	0,08	=	0,29
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B50**	1,80	X	1,50	=	2,70	X	0,08	=	0,22
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B51**	2,10	X	2,10	=	4,41	X	0,05	=	0,22
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B52**	2,30	X	1,40	=	3,22	X	0,05	=	0,16
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B53**	1,80	X	1,50	=	2,70	X	0,05	=	0,14
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B54**	2,10	X	1,50	=	3,15	X	0,05	=	0,16
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B55**	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B56**	2,30	X	1,60	=	3,68	X	0,05	=	0,18
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B57**	2,00	X	1,60	=	3,20	X	0,05	=	0,16
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B58**	1,10	X	1,20	=	1,32	X	0,05	=	0,07
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B59**	2,50	X	0,90	=	2,25	X	0,05	=	0,11
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B60**	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,05	=	0,13
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B61**	1,70	X	1,60	=	2,72	X	0,05	=	0,14
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B62**	1,10	X	0,90	=	0,99	X	0,05	=	0,05
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B63**	6,80	X	1,30	=	8,84	X	0,08	=	0,71
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B64**	1,40	X	1,10	=	1,54	X	0,05	=	0,08
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	16/03/2026	**B65**	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B66**	4,10	X	3,50	=	14,35	X	0,05	=	0,72
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B67**	2,80	X	2,40	=	6,72	X	0,05	=	0,34
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B68**	2,60	X	1,50	=	3,90	X	0,05	=	0,20
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B69**	2,10	X	2,00	=	4,20	X	0,05	=	0,21
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B70**	3,90	X	2,70	=	10,53	X	0,05	=	0,53
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B71**	2,90	X	2,20	=	6,38	X	0,05	=	0,32
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B72**	4,00	X	1,40	=	5,60	X	0,05	=	0,28
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B73**	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,05	=	0,11
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B74**	4,40	X	1,40	=	6,16	X	0,05	=	0,31
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B75**	0,80	X	0,70	=	0,56	X	0,05	=	0,03
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B76**	9,10	X	1,00	=	9,10	X	0,05	=	0,46
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B77**	3,00	X	1,80	=	5,40	X	0,05	=	0,27
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B78**	1,50	X	1,00	=	1,50	X	0,05	=	0,08

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA-CE - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9º MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B79	1,00	X	1,20	=	1,20	X	0,05	=	0,06
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B80	4,00	X	1,10	=	4,40	X	0,05	=	0,22
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B81	1,00	X	1,10	=	1,10	X	0,05	=	0,06
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B82	2,10	X	1,60	=	3,36	X	0,05	=	0,17
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B83	1,80	X	1,20	=	2,16	X	0,05	=	0,11
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B84	2,20	X	1,10	=	2,42	X	0,05	=	0,12
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B85	7,50	X	1,10	=	8,25	X	0,05	=	0,41
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B86	4,40	X	1,10	=	4,84	X	0,03	=	0,15
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B87	3,30	X	1,40	=	4,62	X	0,03	=	0,14
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B88	2,40	X	1,10	=	2,64	X	0,03	=	0,08
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B89	1,60	X	1,10	=	1,76	X	0,03	=	0,05
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B90	1,00	X	0,80	=	0,80	X	0,03	=	0,02
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B91	0,90	X	1,80	=	1,62	X	0,03	=	0,05
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B92	0,90	X	1,80	=	1,62	X	0,03	=	0,05
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B93	6,80	X	1,50	=	10,20	X	0,03	=	0,31
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B94	2,10	X	1,50	=	3,15	X	0,03	=	0,09
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B95	2,20	X	0,70	=	1,54	X	0,03	=	0,05
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B96	0,60	X	0,70	=	0,42	X	0,03	=	0,01
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B97	3,00	X	1,00	=	3,00	X	0,03	=	0,09
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B98	2,60	X	1,10	=	2,86	X	0,03	=	0,09
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B99	4,80	X	0,90	=	4,32	X	0,03	=	0,13
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B100	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,03	=	0,08
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B101	1,80	X	1,10	=	1,98	X	0,03	=	0,06
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B102	2,00	X	0,90	=	1,80	X	0,03	=	0,05
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B103	0,80	X	0,70	=	0,56	X	0,03	=	0,02
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B104	1,60	X	1,20	=	1,92	X	0,03	=	0,06
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B105	1,80	X	1,10	=	1,98	X	0,03	=	0,06
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B106	2,50	X	1,10	=	2,75	X	0,03	=	0,08
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B107	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,03	=	0,08
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B108	2,00	X	1,20	=	2,40	X	0,03	=	0,07
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B109	1,80	X	1,20	=	2,16	X	0,03	=	0,06
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B110	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,03	=	0,04
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B111	1,80	X	1,30	=	2,34	X	0,03	=	0,07
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B112	2,20	X	1,30	=	2,86	X	0,03	=	0,09
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B113	3,70	X	1,20	=	4,44	X	0,03	=	0,13
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B114	2,50	X	1,90	=	4,75	X	0,03	=	0,14
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B115	2,10	X	1,80	=	3,78	X	0,03	=	0,11
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B116	1,00	X	0,80	=	0,80	X	0,03	=	0,02
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B117	3,20	X	1,40	=	4,48	X	0,03	=	0,13
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B118	2,50	X	2,00	=	5,00	X	0,03	=	0,15
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	B119	1,50	X	1,60	=	2,40	X	0,03	=	0,07

Déógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 41979-D

Paulo Adriano de Alencar Magalhães
Engº Civil - CREA - CE - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9º MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B120**	10,30	X	1,50	=	15,45	X	0,03	=	0,46
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B121**	1,70	X	1,30	=	2,21	X	0,03	=	0,07
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B122**	2,30	X	1,50	=	3,45	X	0,03	=	0,10
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B123**	5,00	X	1,10	=	5,50	X	0,03	=	0,17
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B124**	2,00	X	1,20	=	2,40	X	0,03	=	0,07
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B125**	4,40	X	2,90	=	12,76	X	0,03	=	0,38
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B126**	2,50	X	1,20	=	3,00	X	0,03	=	0,09
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B127**	4,80	X	0,90	=	4,32	X	0,03	=	0,13
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B128**	3,10	X	1,50	=	4,65	X	0,03	=	0,14
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B129**	4,10	X	1,50	=	6,15	X	0,03	=	0,18
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B130**	3,90	X	0,90	=	3,51	X	0,03	=	0,11
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B131**	1,90	X	1,10	=	2,09	X	0,03	=	0,06
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B132**	1,40	X	1,00	=	1,40	X	0,03	=	0,04
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B133**	2,60	X	1,60	=	4,16	X	0,03	=	0,12
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B134**	1,10	X	1,60	=	1,76	X	0,03	=	0,05
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B135**	0,80	X	0,80	=	0,64	X	0,03	=	0,02
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B136**	2,10	X	1,20	=	2,52	X	0,03	=	0,08
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B137**	0,80	X	0,70	=	0,56	X	0,03	=	0,02
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B138**	2,10	X	1,80	=	3,78	X	0,03	=	0,11
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B139**	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,03	=	0,03
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B140**	1,90	X	1,60	=	3,04	X	0,03	=	0,09
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B141**	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,03	=	0,03
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B142**	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,03	=	0,07
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B143**	1,80	X	1,70	=	3,06	X	0,03	=	0,09
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B144**	3,50	X	1,40	=	4,90	X	0,03	=	0,15
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B145**	3,30	X	0,90	=	2,97	X	0,03	=	0,09
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B146**	2,60	X	1,60	=	4,16	X	0,03	=	0,12
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B147**	1,90	X	2,10	=	3,99	X	0,03	=	0,12
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B148**	0,80	X	0,80	=	0,64	X	0,03	=	0,02
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B149**	1,10	X	1,20	=	1,32	X	0,03	=	0,04
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B150**	1,60	X	0,60	=	0,96	X	0,03	=	0,03
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	17/03/2026	**B151**	4,70	X	2,00	=	9,40	X	0,03	=	0,28
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	**B152**	1,50	X	1,20	=	1,80	X	0,05	=	0,09
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	**B153**	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	**B154**	3,70	X	1,00	=	3,70	X	0,05	=	0,19
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	**B155**	3,30	X	1,60	=	5,28	X	0,05	=	0,26
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	**B156**	4,00	X	1,60	=	6,40	X	0,05	=	0,32
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	**B157**	0,70	X	0,60	=	0,42	X	0,05	=	0,02
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	**B158**	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	**B159**	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	**B160**	3,50	X	1,10	=	3,85	X	0,05	=	0,19

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	Mº	5796,26		VOLUME	Mº	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B161	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B162	0,80	X	0,40	=	0,32	X	0,05	=	0,02
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B163	2,50	X	1,30	=	3,25	X	0,05	=	0,16
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B164	2,20	X	1,60	=	3,52	X	0,05	=	0,18
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B165	3,60	X	1,60	=	5,76	X	0,05	=	0,29
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B166	1,00	X	1,10	=	1,10	X	0,05	=	0,06
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B167	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,05	=	0,13
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B168	1,60	X	1,10	=	1,76	X	0,05	=	0,09
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B169	1,40	X	1,00	=	1,40	X	0,05	=	0,07
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B170	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B171	2,60	X	1,60	=	4,16	X	0,05	=	0,21
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B172	3,20	X	1,60	=	5,12	X	0,05	=	0,26
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B173	1,80	X	1,50	=	2,70	X	0,05	=	0,14
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B174	0,90	X	0,40	=	0,36	X	0,05	=	0,02
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B175	5,20	X	3,30	=	17,16	X	0,05	=	0,86
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B176	1,80	X	1,50	=	2,70	X	0,05	=	0,14
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B177	0,50	X	0,40	=	0,20	X	0,05	=	0,01
05.0	AVENIDA CASTELO BRANCO	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR	DIVERSOS	18/03/2026	B178	2,80	X	2,50	=	7,00	X	0,05	=	0,35
05.0	**AVENIDA CASTELO BRANCO**	**ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR**	**DIVERSOS**					**ÁREA**	=	**638,99**		**VOLUME**	=	**29,89**
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	05/03/2026	B1	3,80	X	0,80	=	3,04	X	0,08	=	0,24
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	05/03/2026	B2	2,50	X	2,30	=	5,75	X	0,08	=	0,46
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B3	3,10	X	1,90	=	5,89	X	0,05	=	0,29
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B4	2,10	X	1,90	=	3,99	X	0,05	=	0,20
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B5	2,10	X	1,60	=	3,36	X	0,05	=	0,17
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B6	1,30	X	0,30	=	0,39	X	0,05	=	0,02
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B7	1,90	X	1,30	=	2,47	X	0,05	=	0,12
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B8	5,70	X	2,90	=	16,53	X	0,05	=	0,83
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B9	2,20	X	2,20	=	4,84	X	0,05	=	0,24
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B10	1,10	X	0,80	=	0,88	X	0,05	=	0,04
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B11	2,50	X	0,90	=	2,25	X	0,05	=	0,11
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B12	1,60	X	0,80	=	1,28	X	0,05	=	0,06
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B13	6,50	X	2,90	–	18,85	X	0,05	–	0,94
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B14	1,70	X	0,40	=	0,68	X	0,05	=	0,03
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B15	0,80	X	0,70	–	0,56	X	0,05	–	0,03
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B16	2,30	X	2,10	=	4,83	X	0,05	=	0,24
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B17	0,90	X	0,70	=	0,63	X	0,05	=	0,03
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B18	4,90	X	3,10	=	15,19	X	0,05	=	0,76
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B19	1,80	X	1,30	=	2,34	X	0,05	=	0,12
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B20	4,30	X	3,10	=	13,33	X	0,05	=	0,67

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 14979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B21	2,50	X	1,10	=	2,75	X	0,05	=	0,14
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B22	3,00	X	1,70	=	5,10	X	0,05	=	0,26
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B23	2,60	X	2,70	=	7,02	X	0,05	=	0,35
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B24	1,30	X	1,40	=	1,82	X	0,05	=	0,09
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B25	4,10	X	2,00	=	8,20	X	0,05	=	0,41
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B26	2,10	X	1,30	=	2,73	X	0,05	=	0,14
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B27	4,50	X	2,00	=	9,00	X	0,05	=	0,45
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B28	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,05	=	0,07
08.0	RUA PIO X	ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	19/03/2026	B29	3,10	X	1,70	=	5,27	X	0,05	=	0,26
08.0	**RUA PIO X**	**ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS**	**SALESIANOS**					**ÁREA**	=	**150,29**		**VOLUME**	=	**7,78**
09.0	RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ	ENTRE A AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA E A RUA SINHA RIBEIRO	CENTRO	05/03/2026	B1	1,50	X	1,30	=	1,95	X	0,05	=	0,10
09.0	RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ	ENTRE A AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA E A RUA SINHA RIBEIRO	CENTRO	05/03/2026	B2	1,50	X	1,30	=	1,95	X	0,05	=	0,10
09.0	RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ	ENTRE A AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA E A RUA SINHA RIBEIRO	CENTRO	05/03/2026	B3	2,40	X	0,90	=	2,16	X	0,05	=	0,11
09.0	RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ	ENTRE A AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA E A RUA SINHA RIBEIRO	CENTRO	05/03/2026	B4	2,00	X	1,70	=	3,40	X	0,08	=	0,27
09.0	RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ	ENTRE A AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA E A RUA SINHA RIBEIRO	CENTRO	05/03/2026	B5	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,08	=	0,08
09.0	RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ	ENTRE A AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA E A RUA SINHA RIBEIRO	CENTRO	05/03/2026	B6	1,60	X	2,00	=	3,20	X	0,08	=	0,26
09.0	RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ	ENTRE A AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA E A RUA SINHA RIBEIRO	CENTRO	05/03/2026	B7	1,50	X	1,40	=	2,10	X	0,05	=	0,11
09.0	RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ	ENTRE A AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA E A RUA SINHA RIBEIRO	CENTRO	05/03/2026	B8	6,40	X	1,40	=	8,96	X	0,08	=	0,72
09.0	**RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ**	**ENTRE A AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA E A RUA SINHA RIBEIRO**	**CENTRO**					**ÁREA**	=	**24,72**		**VOLUME**	=	**1,73**
10.0	RUA SÃO PEDRO	ENTRE A RUA DA MATRIZ E A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ	CENTRO	05/03/2026	B1	1,90	X	1,50	=	2,85	X	0,08	=	0,23
10.0	RUA SÃO PEDRO	ENTRE A RUA DA MATRIZ E A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ	CENTRO	05/03/2026	B2	3,10	X	2,40	=	7,44	X	0,08	=	0,60
10.0	RUA SÃO PEDRO	ENTRE A RUA DA MATRIZ E A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ	CENTRO	05/03/2026	B3	1,90	X	1,90	=	3,61	X	0,08	=	0,29
10.0	RUA SÃO PEDRO	ENTRE A RUA DA MATRIZ E A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ	CENTRO	05/03/2026	B4	1,80	X	1,80	=	3,24	X	0,08	=	0,26
10.0	RUA SÃO PEDRO	ENTRE A RUA DA MATRIZ E A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ	CENTRO	05/03/2026	B5	2,20	X	1,70	=	3,74	X	0,08	=	0,30
10.0	**RUA SÃO PEDRO**	**ENTRE A RUA DA MATRIZ E A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ**	**CENTRO**					**ÁREA**	=	**20,88**		**VOLUME**	=	**1,67**

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
11.0	RUA DUCA BRINGEL	ENCONTRO COM A AV. LEÃO SAMPAIO	LAGOA SECA	06/03/2026	B1	1,80	X	1,10	=	1,98	X	0,08	=	0,16
11.0	RUA DUCA BRINGEL	ENCONTRO COM A AV. LEÃO SAMPAIO	LAGOA SECA	06/03/2026	B2	3,50	X	1,30	=	4,55	X	0,08	=	0,36
11.0	RUA DUCA BRINGEL	ENCONTRO COM A AV. LEÃO SAMPAIO	LAGOA SECA	06/03/2026	B3	1,50	X	1,30	=	1,95	X	0,08	=	0,16
11.0	RUA DUCA BRINGEL	ENCONTRO COM A AV. LEÃO SAMPAIO	LAGOA SECA	06/03/2026	B4	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,08	=	0,17
11.0	RUA DUCA BRINGEL	ENCONTRO COM A AV. LEÃO SAMPAIO	LAGOA SECA	06/03/2026	B5	2,20	X	1,20	=	2,64	X	0,08	=	0,21
11.0	RUA DUCA BRINGEL	ENCONTRO COM A AV. LEÃO SAMPAIO	LAGOA SECA	06/03/2026	B6	2,10	X	1,10	=	2,31	X	0,08	=	0,18
11.0	RUA DUCA BRINGEL	ENCONTRO COM A AV. LEÃO SAMPAIO	LAGOA SECA	06/03/2026	B7	3,30	X	1,60	=	5,28	X	0,08	=	0,42
11.0	RUA DUCA BRINGEL	ENCONTRO COM A AV. LEÃO SAMPAIO	LAGOA SECA	06/03/2026	B8	5,20	X	2,50	=	13,00	X	0,08	=	1,04
11.0	RUA DUCA BRINGEL	ENCONTRO COM A AV. LEÃO SAMPAIO	LAGOA SECA	06/03/2026	B9	3,20	X	2,30	=	7,36	X	0,08	=	0,59
11.0	RUA DUCA BRINGEL	ENCONTRO COM A AV. LEÃO SAMPAIO	LAGOA SECA	06/03/2026	B10	5,50	X	3,10	=	17,05	X	0,08	=	1,36
11.0	**RUA DUCA BRINGEL**	**ENCONTRO COM A AV. LEÃO SAMPAIO**	**LAGOA SECA**					**ÁREA**	**=**	**58,20**		**VOLUME**	**=**	**4,66**
12.0	RUA SÃO PAULO	ENCONTRO COM A RUA SÃO LUIZ	CENTRO	06/03/2026	B1	6,40	X	1,50	=	9,60	X	0,08	=	0,77
12.0	**RUA SÃO PAULO**	**ENCONTRO COM A RUA SÃO LUIZ**	**CENTRO**					**ÁREA**	**=**	**9,60**		**VOLUME**	**=**	**0,77**
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B1	2,00	X	2,40	=	4,80	X	0,05	=	0,24
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B2	6,30	X	2,10	=	13,23	X	0,05	=	0,66
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B3	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,05	=	0,11
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B4	1,30	X	1,40	=	1,82	X	0,05	=	0,09
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B5	1,50	X	1,70	=	2,55	X	0,05	=	0,13
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B6	1,60	X	1,70	=	2,72	X	0,05	=	0,14
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B7	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B8	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B9	1,20	X	1,30	=	1,56	X	0,05	=	0,08
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B10	3,80	X	1,70	=	6,46	X	0,05	=	0,32
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B11	1,80	X	1,30	=	2,34	X	0,05	=	0,12
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B12	1,70	X	1,20	=	2,04	X	0,05	=	0,10
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B13	2,70	X	2,80	=	7,56	X	0,05	=	0,38
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B14	1,20	X	1,40	=	1,68	X	0,05	=	0,08
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B15	2,60	X	1,50	=	3,90	X	0,05	=	0,20
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B16	2,10	X	1,60	=	3,36	X	0,05	=	0,17
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B17	4,60	X	2,80	=	12,88	X	0,05	=	0,64
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B18	3,30	X	3,00	=	9,90	X	0,05	=	0,50
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B19	1,90	X	1,50	=	2,85	X	0,05	=	0,14
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B20	3,60	X	2,30	=	8,28	X	0,05	=	0,41
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B21	3,60	X	2,60	=	9,36	X	0,05	=	0,47
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B22	1,90	X	1,00	=	1,90	X	0,05	=	0,10
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B23	4,20	X	1,60	=	6,72	X	0,05	=	0,34
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B24	3,60	X	3,00	=	10,80	X	0,05	=	0,54
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B25	2,20	X	1,60	=	3,52	X	0,05	=	0,18
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	B26	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA [illegible] - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	09/03/2026	**B27**	1,50	X	3,10	=	4,65	X	0,05	=	0,23
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	11/03/2026	**B28**	1,50	X	1,30	=	1,95	X	0,05	=	0,10
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	11/03/2026	**B29**	1,70	X	1,20	=	2,04	X	0,05	=	0,10
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	11/03/2026	**B30**	1,40	X	1,00	=	1,40	X	0,05	=	0,07
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	12/03/2026	**B31**	2,60	X	1,30	=	3,38	X	0,05	=	0,17
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	12/03/2026	**B32**	1,40	X	1,10	=	1,54	X	0,05	=	0,08
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	12/03/2026	**B33**	3,50	X	1,10	=	3,85	X	0,05	=	0,19
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	12/03/2026	**B34**	0,50	X	0,50	=	0,25	X	0,05	=	0,01
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	12/03/2026	**B35**	0,80	X	0,60	=	0,48	X	0,05	=	0,02
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	12/03/2026	**B36**	1,10	X	0,90	=	0,99	X	0,05	=	0,05
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	12/03/2026	**B37**	0,50	X	0,50	=	0,25	X	0,05	=	0,01
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	12/03/2026	**B38**	1,40	X	1,80	=	2,52	X	0,05	=	0,13
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	12/03/2026	**B39**	1,60	X	1,10	=	1,76	X	0,05	=	0,09
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	12/03/2026	**B40**	0,80	X	0,80	=	0,64	X	0,05	=	0,03
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	12/03/2026	**B41**	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	12/03/2026	**B42**	1,40	X	1,60	=	2,24	X	0,05	=	0,11
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	12/03/2026	**B43**	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,05	=	0,07
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	12/03/2026	**B44**	1,50	X	1,10	=	1,65	X	0,05	=	0,08
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	18/03/2026	**B45**	1,00	X	0,80	=	0,80	X	0,05	=	0,04
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	18/03/2026	**B46**	1,60	X	0,80	=	1,28	X	0,05	=	0,06
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	18/03/2026	**B47**	1,30	X	1,10	=	1,43	X	0,05	=	0,07
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	18/03/2026	**B48**	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,05	=	0,06
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	18/03/2026	**B49**	2,30	X	1,30	=	2,99	X	0,05	=	0,15
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	18/03/2026	**B50**	1,90	X	1,20	=	2,28	X	0,05	=	0,11
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	18/03/2026	**B51**	0,80	X	0,40	=	0,32	X	0,05	=	0,02
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	18/03/2026	**B52**	0,70	X	0,50	=	0,35	X	0,05	=	0,02
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	18/03/2026	**B53**	2,40	X	1,90	=	4,56	X	0,05	=	0,23
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	18/03/2026	**B54**	6,40	X	3,20	=	20,48	X	0,05	=	1,02
14.0	AVENIDA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA	DIVERSOS	18/03/2026	**B55**	3,00	X	1,80	=	5,40	X	0,05	=	0,27
14.0	**AVENIDA PADRE CÍCERO**	**ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA**	**DIVERSOS**					**ÁREA**	**=**	**200,58**		**VOLUME**	**=**	**10,03**
15.0	RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO	ENCONTRO COM A AV. CASTELO BRANCO	TIRADENTES	09/03/2026	**B1**	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09
15.0	RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO	ENCONTRO COM A AV. CASTELO BRANCO	TIRADENTES	09/03/2026	**B2**	2,00	X	2,00	=	4,00	X	0,08	=	0,32
15.0	RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO	ENCONTRO COM A AV. CASTELO BRANCO	TIRADENTES	09/03/2026	**B3**	1,90	X	2,70	=	5,13	X	0,08	=	0,41
15.0	RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO	ENCONTRO COM A AV. CASTELO BRANCO	TIRADENTES	09/03/2026	**B4**	2,70	X	3,70	=	9,99	X	0,08	=	0,80
15.0	RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO	ENCONTRO COM A AV. CASTELO BRANCO	TIRADENTES	09/03/2026	**B5**	1,50	X	3,10	=	4,65	X	0,08	=	0,37
15.0	RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO	ENCONTRO COM A AV. CASTELO BRANCO	TIRADENTES	11/03/2026	**B6**	1,80	X	1,60	=	2,88	X	0,08	=	0,23
15.0	RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO	ENCONTRO COM A AV. CASTELO BRANCO	TIRADENTES	11/03/2026	**B7**	4,40	X	1,80	=	7,92	X	0,08	=	0,63
15.0	RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO	ENCONTRO COM A AV. CASTELO BRANCO	TIRADENTES	11/03/2026	**B8**	2,20	X	0,80	=	1,76	X	0,08	=	0,14
15.0	RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO	ENCONTRO COM A AV. CASTELO BRANCO	TIRADENTES	11/03/2026	**B9**	2,40	X	0,60	=	1,44	X	0,08	=	0,12
15.0	**RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO**	**ENCONTRO COM A AV. CASTELO BRANCO**	**TIRADENTES**					**ÁREA**	**=**	**39,59**		**VOLUME**	**=**	**3,11**

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								ÁREA	Mº	5796,26		VOLUME	Mº	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (Mº)
16.0	AVENIDA ANA SARAIVA DE MENEZES	ENTRE A RUA ANDERSON CABOCLO E A RUA JOSE SALVIANO DE SOUZA	JARDIM GONZAGA	09/03/2026	B1	5,00	X	2.80	=	14,00	X	0,08	=	1,12
16.0	AVENIDA ANA SARAIVA DE MENEZES	ENTRE A RUA ANDERSON CABOCLO E A RUA JOSE SALVIANO DE SOUZA	JARDIM GONZAGA	09/03/2026	B2	8,80	X	2,70	=	23,76	X	0.08	=	1,90
16.0	**AVENIDA ANA SARAIVA DE MENEZES**	**ENTRE A RUA ANDERSON CABOCLO E A RUA JOSE SALVIANO DE SOUZA**	**JARDIM GONZAGA**					**ÁREA**	=	**37,76**		**VOLUME**	=	**3,02**
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B1	2,50	X	1,90	=	4,75	X	0,05	=	0,24
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B2	1,80	X	0,80	=	1,44	X	0.05	=	0,07
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B3	2,20	X	3,30	=	7,26	X	0.05	=	0,36
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B4	1,40	X	1.50	=	2,10	X	0.05	=	0,11
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B5	3,00	X	3.50	=	10,50	X	0.05	=	0,53
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B6	4,20	X	0.90	=	3,78	X	0.05	=	0,19
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B7	1,00	X	2.60	=	2,60	X	0.05	=	0,13
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B8	1,20	X	1.50	=	1,80	X	0,05	=	0,09
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B9	1,20	X	2,40	=	2,88	X	0.05	=	0,14
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B10	1,10	X	5,40	=	5,94	X	0.05	=	0,30
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B11	2,40	X	2,30	=	5,52	X	0.05	=	0,28
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B12	1,40	X	5.40	=	7,56	X	0.05	=	0,38
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B13	2,20	X	3.20	=	7,04	X	0.05	=	0,35
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B14	4,70	X	2.10	=	9,87	X	0.05	=	0,49
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B15	2,60	X	1.60	=	4,16	X	0.05	=	0,21
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B16	1,60	X	1,60	=	2,56	X	0.05	=	0,13
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B17	7,20	X	5,20	=	37,44	X	0.08	=	3,00
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B18	0,70	X	0,70	=	0,49	X	0.05	=	0,02
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B19	1,10	X	0,90	=	0,99	X	0.05	=	0,05
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B20	1,60	X	2,90	=	4,64	X	0.05	=	0,23
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B21	2,40	X	1.20	=	2,88	X	0.05	=	0,14
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B22	2,20	X	1,50	=	3,30	X	0.05	=	0,17
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B23	1,30	X	2,70	=	3,51	X	0.05	=	0,18
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B24	1,80	X	1.10	=	1,98	X	0.05	=	0,10
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B25	1,80	X	1,20	=	2,16	X	0.05	=	0,11
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B26	3,10	X	1,90	=	5,89	X	0.05	=	0,29
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B27	1,30	X	1.70	=	2,21	X	0.05	=	0,11
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B28	1,60	X	1.30	=	2,08	X	0.05	=	0,10
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B29	10.80	X	0.80	=	8,64	X	0.05	=	0,43
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B30	1,50	X	1,80	=	2,70	X	0.05	=	0,14
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B31	2,00	X	0.80	=	1,60	X	0,05	=	0,08
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B32	1,90	X	1.30	=	2,47	X	0.05	=	0,12
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B33	1,50	X	0.50	=	0,75	X	0.05	=	0,04

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA CE - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

									AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B34	4,70	X	1,40	=	6,58	X	0,05	=	0,33
21.0	RUA SÃO MAMEDE	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS	10/03/2026	B35	1,20	X	1,20	=	1,44	X	0,05	=	0,07
21.0	**RUA SÃO MAMEDE**	**ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO**	**FRANCISCANOS**					**ÁREA**	=	**171,51**		**VOLUME**	=	**9,70**
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	10/03/2026	B1	1,60	X	1,50	=	2,40	X	0,05	=	0,12
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	10/03/2026	B2	1,10	X	0,80	=	0,88	X	0,05	=	0,04
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	10/03/2026	B3	1,40	X	1,10	=	1,54	X	0,05	=	0,08
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	10/03/2026	B4	3,30	X	3,20	=	10,56	X	0,08	=	0,84
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	10/03/2026	B5	1,00	X	2,20	=	2,20	X	0,05	=	0,11
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	10/03/2026	B6	1,30	X	3,80	=	4,94	X	0,05	=	0,25
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	10/03/2026	B7	2,10	X	2,10	=	4,41	X	0,05	=	0,22
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	10/03/2026	B8	2,50	X	0,90	=	2,25	X	0,05	=	0,11
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	10/03/2026	B9	2,30	X	1,80	=	4,14	X	0,05	=	0,21
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	10/03/2026	B10	3,10	X	1,50	=	4,65	X	0,05	=	0,23
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	10/03/2026	B11	1,00	X	1,10	=	1,10	X	0,05	=	0,06
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B12	2,20	X	1,80	=	3,96	X	0,05	=	0,20
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B13	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B14	0,90	X	0,80	=	0,72	X	0,05	=	0,04
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B15	1,20	X	0,90	=	1,08	X	0,05	=	0,05
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B16	3,90	X	1,70	=	6,63	X	0,05	=	0,33
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B17	4,10	X	1,30	=	5,33	X	0,05	=	0,27
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B18	1,60	X	1,20	=	1,92	X	0,05	=	0,10
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B19	2,20	X	1,60	=	3,52	X	0,05	=	0,18
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B20	1,70	X	1,50	=	2,55	X	0,05	=	0,13
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B21	1,40	X	1,80	=	2,52	X	0,05	=	0,13
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B22	1,10	X	3,80	=	4,18	X	0,05	=	0,21
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B23	1,00	X	2,20	=	2,20	X	0,05	=	0,11
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B24	1,00	X	0,70	=	0,70	X	0,05	=	0,04
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B25	1,20	X	0,80	=	0,96	X	0,05	=	0,05
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B26	1,70	X	1,40	=	2,38	X	0,05	=	0,12
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B27	0,70	X	0,70	−	0,49	X	0,05	=	0,02
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B28	2,00	X	1,40	=	2,80	X	0,05	=	0,14
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B29	3,00	X	2,40	−	7,20	X	0,05	=	0,36
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B30	2,40	X	1,10	=	2,64	X	0,05	=	0,13
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B31	1,00	X	1,40	=	1,40	X	0,05	=	0,07
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B32	1,80	X	0,70	=	1,26	X	0,05	=	0,06
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B33	2,30	X	1,30	=	2,99	X	0,05	=	0,15
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B34	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B35	2,40	X	1,60	=	3,84	X	0,05	=	0,19
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B36	1,60	X	0,80	=	1,28	X	0,05	=	0,06
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B37	2,90	X	1,40	=	4,06	X	0,05	=	0,20

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B38	3,10	X	0,60	=	1,86	X	0,05	=	0,09
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B39	1,10	X	0,90	=	0,99	X	0,05	=	0,05
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B40	8,60	X	0,70	=	6,02	X	0,05	=	0,30
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B41	2,10	X	2,30	=	4,83	X	0,05	=	0,24
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B42	0,70	X	0,60	=	0,42	X	0,05	=	0,02
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B43	0,90	X	0,60	=	0,54	X	0,05	=	0,03
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B44	4,60	X	1,50	=	6,90	X	0,05	=	0,35
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B45	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B46	0,80	X	0,60	=	0,48	X	0,05	=	0,02
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B47	2,70	X	1,40	=	3,78	X	0,05	=	0,19
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B48	1,00	X	1,20	=	1,20	X	0,05	=	0,06
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B49	0,90	X	0,80	=	0,72	X	0,05	=	0,04
22.0	RUA CAMPOS ELÍSEOS	ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA	TIMBAUBAS	11/03/2026	B50	9,00	X	0,80	=	7,20	X	0,05	=	0,36
22.0	**RUA CAMPOS ELÍSEOS**	**ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA**	**TIMBAUBAS**					**ÁREA**	=	**146,60**		**VOLUME**	=	**7,65**
23.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA SANTA LUZIA	FATIMA	11/03/2026	B1	2,80	X	1,10	=	3,08	X	0,08	=	0,25
23.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA SANTA LUZIA	FATIMA	11/03/2026	B2	1,80	X	1,30	=	2,34	X	0,08	=	0,19
23.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA SANTA LUZIA	FATIMA	11/03/2026	B3	1,30	X	1,00	=	1,30	X	0,08	=	0,10
23.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA SANTA LUZIA	FATIMA	11/03/2026	B4	1,00	X	1,10	=	1,10	X	0,08	=	0,09
23.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA SANTA LUZIA	FATIMA	11/03/2026	B5	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,08	=	0,18
23.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA SANTA LUZIA	FATIMA	11/03/2026	B6	1,60	X	1,00	=	1,60	X	0,08	=	0,13
23.0	**AVENIDA CARLOS CRUZ**	**ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA SANTA LUZIA**	**FATIMA**					**ÁREA**	=	**11,66**		**VOLUME**	=	**0,93**
24.0	RUA SÃO BENEDITO	CRUZAMENTO COM A RUA DOM BOSCO	FRANCISCANOS	11/03/2026	B1	1,80	X	1,10	=	1,98	X	0,08	=	0,16
24.0	RUA SÃO BENEDITO	CRUZAMENTO COM A RUA DOM BOSCO	FRANCISCANOS	11/03/2026	B2	0,70	X	0,60	=	0,42	X	0,08	=	0,03
24.0	RUA SÃO BENEDITO	CRUZAMENTO COM A RUA DOM BOSCO	FRANCISCANOS	11/03/2026	B3	4,00	X	1,70	=	6,80	X	0,08	=	0,54
24.0	RUA SÃO BENEDITO	CRUZAMENTO COM A RUA DOM BOSCO	FRANCISCANOS	11/03/2026	B4	1,30	X	1,00	=	1,30	X	0,08	=	0,10
24.0	RUA SÃO BENEDITO	CRUZAMENTO COM A RUA DOM BOSCO	FRANCISCANOS	11/03/2026	B5	1,20	X	0,80	=	0,96	X	0,08	=	0,08
24.0	RUA SÃO BENEDITO	CRUZAMENTO COM A RUA DOM BOSCO	FRANCISCANOS	11/03/2026	B6	1,30	X	1,10	=	1,43	X	0,08	=	0,11
24.0	**RUA SÃO BENEDITO**	**CRUZAMENTO COM A RUA DOM BOSCO**	**FRANCISCANOS**					**ÁREA**	=	**12,89**		**VOLUME**	=	**1,03**
25.0	RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA	ENTRE A TRAVESSA BEATO JOSE LOURENÇO E A RUA CEL. FILEMON TELES	TIRADENTES	12/03/2026	B1	1,40	X	0,90	=	1,26	X	0,05	=	0,06
25.0	RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA	ENTRE A TRAVESSA BEATO JOSE LOURENÇO E A RUA CEL. FILEMON TELES	TIRADENTES	12/03/2026	B2	1,90	X	1,50	=	2,85	X	0,05	=	0,14
25.0	RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA	ENTRE A TRAVESSA BEATO JOSE LOURENÇO E A RUA CEL. FILEMON TELES	TIRADENTES	12/03/2026	B3	2,20	X	1,40	=	3,08	X	0,05	=	0,15
25.0	RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA	ENTRE A TRAVESSA BEATO JOSE LOURENÇO E A RUA CEL. FILEMON TELES	TIRADENTES	12/03/2026	B4	8,20	X	0,70	=	5,74	X	0,08	=	0,46
25.0	RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA	ENTRE A TRAVESSA BEATO JOSE LOURENÇO E A RUA CEL. FILEMON TELES	TIRADENTES	12/03/2026	B5	3,30	X	1,10	=	3,63	X	0,08	=	0,29

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
25.0	RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA	ENTRE A TRAVESSA BEATO JOSE LOURENÇO E A RUA CEL. FILEMON TELES	TIRADENTES	12/03/2026	**B6**	3,90	X	3,50	=	13,65	X	0,08	=	1,09
25.0	RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA	ENTRE A TRAVESSA BEATO JOSE LOURENÇO E A RUA CEL. FILEMON TELES	TIRADENTES	12/03/2026	**B7**	7,90	X	1,80	=	14,22	X	0,05	=	0,71
25.0	RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA	ENTRE A TRAVESSA BEATO JOSE LOURENÇO E A RUA CEL. FILEMON TELES	TIRADENTES	12/03/2026	**B8**	4,10	X	1,20	=	4,92	X	0,05	=	0,25
25.0	**RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA**	**ENTRE A TRAVESSA BEATO JOSE LOURENÇO E A RUA CEL. FILEMON TELES**	**TIRADENTES**					**ÁREA**	**=**	**49,35**		**VOLUME**	**=**	**3,16**
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	16/03/2026	**B1**	5,20	X	2,10	=	10,92	X	0,10	=	1,09
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	16/03/2026	**B2**	4,00	X	0,90	=	3,60	X	0,10	=	0,36
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	18/03/2026	**B3**	3,90	X	2,50	=	9,75	X	0,05	=	0,49
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	18/03/2026	**B4**	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,05	=	0,11
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	18/03/2026	**B5**	6,80	X	1,60	=	10,88	X	0,05	=	0,54
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	18/03/2026	**B6**	2,10	X	1,70	=	3,57	X	0,05	=	0,18
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	18/03/2026	**B7**	2,40	X	1,70	=	4,08	X	0,05	=	0,20
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	18/03/2026	**B8**	2,10	X	1,70	=	3,57	X	0,05	=	0,18
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	18/03/2026	**B9**	4,00	X	1,90	=	7,60	X	0,05	=	0,38
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	18/03/2026	**B10**	2,80	X	1,60	=	4,48	X	0,05	=	0,22
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	18/03/2026	**B11**	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,05	=	0,07
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	18/03/2026	**B12**	2,10	X	1,40	=	2,94	X	0,05	=	0,15
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	18/03/2026	**B13**	2,80	X	1,10	=	3,08	X	0,05	=	0,15
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	18/03/2026	**B14**	1,60	X	1,20	=	1,92	X	0,05	=	0,10
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	18/03/2026	**B15**	3,60	X	1,80	=	6,48	X	0,05	=	0,32
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	18/03/2026	**B16**	3,30	X	1,20	=	3,96	X	0,05	=	0,20
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B17**	2,60	X	1,60	=	4,16	X	0,03	=	0,12
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B18**	2,40	X	2,20	=	5,28	X	0,03	=	0,16
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B19**	3,50	X	2,30	=	8,05	X	0,03	=	0,24
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B20**	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,03	=	0,04
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B21**	2,30	X	1,50	=	3,45	X	0,03	=	0,10
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B22**	2,30	X	1,40	=	3,22	X	0,03	=	0,10
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B23**	2,20	X	2,20	=	4,84	X	0,03	=	0,15
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B24**	1,50	X	1,30	=	1,95	X	0,03	=	0,06
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B25**	5,30	X	1,70	=	9,01	X	0,03	=	0,27
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B26**	5,70	X	2,00	=	11,40	X	0,03	=	0,34
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B27**	2,50	X	1,90	=	4,75	X	0,03	=	0,14
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B28**	1,20	X	1,20	=	1,44	X	0,03	=	0,04
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B29**	6,30	X	3,70	=	23,31	X	0,03	=	0,70
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B30**	3,80	X	2,70	=	10,26	X	0,05	=	0,51
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B31**	11,30	X	1,10	=	12,43	X	0,05	=	0,62
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B32**	6,20	X	0,80	=	4,96	X	0,05	=	0,25
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	**B33**	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - [illegible]8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	B34	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,05	=	0,06
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	B35	1,40	X	0,80	=	1,12	X	0,05	=	0,06
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	B36	4,00	X	1,20	=	4,80	X	0,05	=	0,24
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	B37	3,40	X	0,90	=	3,06	X	0,05	=	0,15
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	19/03/2026	B38	4,50	X	2,00	=	9,00	X	0,05	=	0,45
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B39	4,70	X	2,80	=	13,16	X	0,05	=	0,66
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B40	6,80	X	1,40	=	9,52	X	0,05	=	0,48
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B41	4,30	X	1,50	=	6,45	X	0,05	=	0,32
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B42	4,30	X	1,20	=	5,16	X	0,05	=	0,26
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B43	3,30	X	1,20	=	3,96	X	0,05	=	0,20
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B44	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B45	4,50	X	2,20	=	9,90	X	0,05	=	0,50
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B46	0,60	X	0,50	=	0,30	X	0,05	=	0,02
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B47	1,00	X	0,60	=	0,60	X	0,05	=	0,03
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B48	2,30	X	2,20	=	5,06	X	0,05	=	0,25
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B49	2,50	X	1,10	=	2,75	X	0,05	=	0,14
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B50	3,30	X	2,20	=	7,26	X	0,05	=	0,36
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B51	4,60	X	3,50	=	16,10	X	0,05	=	0,81
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B52	14,20	X	1,40	=	19,88	X	0,05	=	0,99
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B53	3,80	X	1,20	=	4,56	X	0,05	=	0,23
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B54	4,50	X	1,10	=	4,95	X	0,05	=	0,25
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B55	2,00	X	0,90	=	1,80	X	0,05	=	0,09
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B56	2,30	X	1,50	=	3,45	X	0,05	=	0,17
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B57	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B58	1,90	X	1,60	=	3,04	X	0,05	=	0,15
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B59	1,60	X	1,60	=	2,56	X	0,05	=	0,13
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B60	1,80	X	1,20	=	2,16	X	0,03	=	0,06
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B61	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,03	=	0,04
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B62	1,70	X	1,20	=	2,04	X	0,03	=	0,06
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B63	2,90	X	1,70	=	4,93	X	0,03	=	0,15
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B64	1,70	X	1,10	=	1,87	X	0,03	=	0,06
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B65	1,80	X	1,20	=	2,16	X	0,03	=	0,06
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B66	4,40	X	1,40	=	6,16	X	0,03	=	0,18
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B67	3,50	X	1,50	=	5,25	X	0,03	=	0,16
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B68	3,50	X	1,00	=	3,50	X	0,03	=	0,11
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B69	3,00	X	1,20	=	3,60	X	0,03	=	0,11
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B70	2,50	X	1,30	=	3,25	X	0,03	=	0,10
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B71	1,90	X	1,10	=	2,09	X	0,03	=	0,06
27.0	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES	AEROPORTO	20/03/2026	B72	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,03	=	0,07
27.0	**AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA**	**ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES**	**AEROPORTO**					**ÁREA**	=	**374,45**		**VOLUME**	=	**17,00**

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9º MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B1	3,60	X	1,80	=	6,48	X	0,05	=	0,32
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B2	3,80	X	4,20	=	15,96	X	0,05	=	0,80
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B3	3,10	X	2,40	=	7,44	X	0,05	=	0,37
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B4	3,30	X	2,20	=	7,26	X	0,05	=	0,36
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B5	1,80	X	1,20	=	2,16	X	0,05	=	0,11
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B6	2,50	X	2,30	=	5,75	X	0,05	=	0,29
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B7	1,80	X	1,30	=	2,34	X	0,05	=	0,12
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B8	4,20	X	1,80	=	7,56	X	0,05	=	0,38
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B9	1,30	X	1,20	=	1,56	X	0,05	=	0,08
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B10	1,30	X	1,20	=	1,56	X	0,05	=	0,08
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B11	2,60	X	1,50	=	3,90	X	0,05	=	0,20
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B12	3,00	X	3,10	=	9,30	X	0,08	=	0,74
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B13	1,30	X	1,20	=	1,56	X	0,05	=	0,08
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B14	2,30	X	1,60	=	3,68	X	0,05	=	0,18
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B15	2,90	X	1,70	=	4,93	X	0,05	=	0,25
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B16	3,40	X	1,70	=	5,78	X	0,05	=	0,29
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B17	2,00	X	1,00	=	2,00	X	0,05	=	0,10
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B18	4,00	X	1,90	=	7,60	X	0,05	=	0,38
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B19	1,40	X	1,10	=	1,54	X	0,05	=	0,08
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B20	1,90	X	1,20	=	2,28	X	0,05	=	0,11
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B21	3,00	X	2,00	=	6,00	X	0,05	=	0,30
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B22	1,80	X	1,60	=	2,88	X	0,05	=	0,14

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B23**	2,30	X	1,70	=	3,91	X	0.05	=	0,20
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B24**	1,00	X	1.00	=	1,00	X	0.05	=	0,05
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B25**	2,50	X	1.20	=	3,00	X	0.05	=	0,15
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B26**	1,40	X	1.40	=	1,96	X	0.05	=	0,10
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B27**	1,90	X	1.80	=	3,42	X	0.05	=	0,17
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B28**	1,50	X	1.20	=	1,80	X	0.05	=	0,09
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B29**	1,50	X	1.40	=	2,10	X	0.05	=	0,11
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B30**	1,00	X	1,20	=	1,20	X	0.05	=	0,06
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B31**	2,60	X	2.40	=	6,24	X	0.05	=	0,31
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B32**	2,00	X	1.60	=	3,20	X	0.05	=	0,16
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B33**	1,80	X	2.20	=	3,96	X	0.08	=	0,32
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B34**	1,90	X	1.40	=	2,66	X	0.05	=	0,13
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B35**	3,80	X	1.30	=	4,94	X	0.05	=	0,25
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B36**	2,00	X	2.00	=	4,00	X	0.08	=	0,32
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B37**	3,00	X	3.10	=	9,30	X	0.08	=	0,74
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B38**	4,00	X	2.60	=	10,40	X	0.08	=	0,83
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B39**	3,90	X	3.30	=	12,87	X	0.08	=	1,03
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B40**	1,60	X	1.20	=	1,92	X	0.05	=	0,10
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B41**	1,20	X	1.00	=	1,20	X	0.05	=	0,06
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B42**	1,60	X	1.40	=	2,24	X	0.05	=	0,11
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B43**	1,40	X	1.00	=	1,40	X	0.05	=	0,07
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	**B44**	2,30	X	1.90	=	4,37	X	0.05	=	0,22

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

									AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B45	1,90	X	1,60	=	3,04	X	0,05	=	0,15
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B46	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B47	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B48	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,08	=	0,11
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B49	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,08	=	0,11
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B50	3,20	X	3,40	=	10,88	X	0,08	=	0,87
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	16/03/2026	B51	12,40	X	1,30	=	16,12	X	0,08	=	1,29
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B52	12,20	X	1,80	=	21,96	X	0,08	=	1,76
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B53	3,60	X	1,30	=	4,68	X	0,05	=	0,23
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B54	1,80	X	1,30	=	2,34	X	0,05	=	0,12
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B55	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,05	=	0,11
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B56	1,50	X	1,50	=	2,25	X	0,05	=	0,11
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B57	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,05	=	0,13
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B58	1,80	X	1,00	=	1,80	X	0,05	=	0,09
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B59	1,00	X	0,90	=	0,90	X	0,05	=	0,05
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B60	1,10	X	0,80	=	0,88	X	0,05	=	0,04
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B61	1,40	X	1,20	=	1,68	X	0,05	=	0,08
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B62	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B63	1,90	X	1,10	=	2,09	X	0,05	=	0,10
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B64	1,30	X	1,00	=	1,30	X	0,05	=	0,07
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B65	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B66	1,50	X	1,00	=	1,50	X	0,05	=	0,08

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B67**	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B68**	0,90	X	0,90	=	0,81	X	0,05	=	0,04
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B69**	1,40	X	1,60	=	2,24	X	0,05	=	0,11
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B70**	0,30	X	0,30	=	0,09	X	0,05	=	0,00
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B71**	4,10	X	2,30	=	9,43	X	0,10	=	0,94
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B72**	2,50	X	3,70	=	9,25	X	0,10	=	0,93
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B73**	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B74**	2,00	X	1,60	=	3,20	X	0,05	=	0,16
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B75**	1,30	X	1,90	=	2,47	X	0,05	=	0,12
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B76**	2,60	X	1,90	=	4,94	X	0,05	=	0,25
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B77**	1,20	X	1,50	=	1,80	X	0,05	=	0,09
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B78**	2,30	X	1,00	=	2,30	X	0,05	=	0,12
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B79**	2,40	X	3,40	=	8,16	X	0,10	=	0,82
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B80**	2,90	X	2,70	=	7,83	X	0,10	=	0,78
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B81**	2,70	X	2,60	=	7,02	X	0,05	=	0,35
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B82**	4,30	X	1,80	=	7,74	X	0,08	=	0,62
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B83**	2,20	X	1,10	=	2,42	X	0,05	=	0,12
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B84**	2,60	X	1,40	=	3,64	X	0,05	=	0,18
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B85**	1,60	X	1,50	=	2,40	X	0,05	=	0,12
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B86**	1,00	X	1,10	=	1,10	X	0,05	=	0,06
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B87**	1,00	X	1,20	=	1,20	X	0,05	=	0,06
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	**B88**	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,05	=	0,13

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B89	1,50	X	1,30	=	1,95	X	0,05	=	0,10
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B90	1,70	X	1,50	=	2,55	X	0,05	=	0,13
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B91	1,40	X	1,20	=	1,68	X	0,05	=	0,08
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B92	1,50	X	1,50	=	2,25	X	0,05	=	0,11
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B93	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B94	1,50	X	1,30	=	1,95	X	0,05	=	0,10
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B95	1,70	X	1,40	=	2,38	X	0,05	=	0,12
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B96	1,50	X	1,20	=	1,80	X	0,05	=	0,09
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B97	1,30	X	1,00	=	1,30	X	0,05	=	0,07
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B98	1,70	X	1,50	=	2,55	X	0,05	=	0,13
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B99	1,40	X	1,20	=	1,68	X	0,05	=	0,08
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B100	1,30	X	1,40	=	1,82	X	0,05	=	0,09
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B101	1,60	X	1,60	=	2,56	X	0,05	=	0,13
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B102	1,40	X	1,60	=	2,24	X	0,05	=	0,11
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B103	1,60	X	1,20	=	1,92	X	0,05	=	0,10
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B104	1,70	X	1,40	=	2,38	X	0,05	=	0,12
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B105	2,50	X	1,80	=	4,50	X	0,05	=	0,23
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B106	2,30	X	1,60	=	3,68	X	0,05	=	0,18
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B107	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,05	=	0,06
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B108	2,10	X	1,50	=	3,15	X	0,05	=	0,16
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B109	2,10	X	1,30	=	2,73	X	0,05	=	0,14
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B110	2,80	X	1,30	=	3,64	X	0,05	=	0,18

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

									AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34		
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)			ESP.		VOLUME (M³)		
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B111	1,30	X	1,20	=	1,56	X	0,05	=	0,08			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B112	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,05	=	0,07			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B113	1,40	X	1,60	=	2,24	X	0,05	=	0,11			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B114	1,00	X	1,10	=	1,10	X	0,05	=	0,06			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B115	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B116	2,50	X	0,80	=	2,00	X	0,05	=	0,10			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B117	2,80	X	0,90	=	2,52	X	0,05	=	0,13			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B118	0,90	X	0,90	=	0,81	X	0,05	=	0,04			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B119	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,05	=	0,06			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B120	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,05	=	0,07			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B121	3,40	X	1,20	=	4,08	X	0,05	=	0,20			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B122	1,50	X	1,10	=	1,65	X	0,05	=	0,08			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B123	1,30	X	1,00	=	1,30	X	0,05	=	0,07			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B124	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B125	1,40	X	1,00	=	1,40	X	0,05	=	0,07			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B126	2,10	X	1,60	=	3,36	X	0,05	=	0,17			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	17/03/2026	B127	1,40	X	1,60	=	2,24	X	0,05	=	0,11			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B128	1,70	X	1,30	=	2,21	X	0,05	=	0,11			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B129	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B130	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B131	1,50	X	1,10	=	1,65	X	0,05	=	0,08			
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B132	1,70	X	1,80	=	3,06	X	0,05	=	0,15			

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

									AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B133	1,60	X	1,70	=	2,72	X	0,05	=	0,14
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B134	1,90	X	1,50	=	2,85	X	0,05	=	0,14
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B135	1,20	X	1,20	=	1,44	X	0,05	=	0,07
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B136	1,50	X	1,50	=	2,25	X	0,05	=	0,11
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B137	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,05	=	0,06
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B138	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B139	0,70	X	0,70	=	0,49	X	0,05	=	0,02
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B140	1,70	X	1,70	-	2,89	X	0,05	-	0,14
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B141	1,90	X	1,70	=	3,23	X	0,05	=	0,16
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B142	1,70	X	1,10	=	1,87	X	0,05	=	0,09
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B143	1,30	X	0,80	=	1,04	X	0,05	=	0,05
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B144	0,50	X	1,30	=	0,65	X	0,05	=	0,03
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B145	1,40	X	3,70	=	5,18	X	0,05	=	0,26
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B146	1,40	X	3,40	=	4,76	X	0,05	=	0,24
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B147	1,90	X	2,90	=	5,51	X	0,05	=	0,28
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B148	2,20	X	1,80	=	3,96	X	0,05	=	0,20
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B149	1,90	X	1,70	=	3,23	X	0,05	=	0,16
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B150	6,30	X	2,30	=	14,49	X	0,08	=	1,16
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B151	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B152	1,30	X	1,20	=	1,56	X	0,05	=	0,08
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B153	1,40	X	2,60	=	3,64	X	0,05	=	0,18
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B154	1,20	X	1,30	=	1,56	X	0,05	=	0,08

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B155	3,60	X	1,80	=	6,48	X	0,08	=	0,52
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B156	1,30	X	1,50	=	1,95	X	0,05	=	0,10
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B157	1,30	X	1,30	=	1,69	X	0,05	=	0,08
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B158	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B159	1,50	X	1,70	=	2,55	X	0,05	=	0,13
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B160	1,50	X	1,20	=	1,80	X	0,05	=	0,09
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B161	5,80	X	1,10	=	6,38	X	0,08	=	0,51
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B162	1,30	X	0,90	-	1,17	X	0,05	-	0,06
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B163	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,05	=	0,07
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B164	1,30	X	1,00	=	1,30	X	0,05	=	0,07
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B165	3,80	X	1,20	=	4,56	X	0,05	=	0,23
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B166	4,00	X	1,40	=	5,60	X	0,08	=	0,45
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B167	4,50	X	1,10	=	4,95	X	0,08	=	0,40
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B168	4,50	X	1,00	=	4,50	X	0,05	=	0,23
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B169	1,00	X	2,30	=	2,30	X	0,08	=	0,18
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B170	2,10	X	3,70	=	7,77	X	0,08	=	0,62
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B171	1,30	X	1,10	=	1,43	X	0,05	=	0,07
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B172	0,80	X	1,00	=	0,80	X	0,05	=	0,04
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B173	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B174	1,90	X	2,40	=	4,56	X	0,08	=	0,36
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B175	2,10	X	1,60	=	3,36	X	0,08	=	0,27
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B176	1,50	X	1,80	=	2,70	X	0,05	=	0,14

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B177	1,90	X	1,80	=	3,42	X	0,05	=	0,17
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B178	2,80	X	2,30	=	6,44	X	0,08	=	0,52
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B179	1,40	X	1,20	=	1,68	X	0,05	=	0,08
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B180	0,90	X	0,80	=	0,72	X	0,05	=	0,04
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B181	5,20	X	2,10	=	10,92	X	0,08	=	0,87
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B182	1,80	X	1,80	=	3,24	X	0,05	=	0,16
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B183	5,60	X	2,00	=	11,20	X	0,05	=	0,56
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B184	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B185	1,80	X	2,60	=	4,68	X	0,08	=	0,37
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B186	1,80	X	1,80	=	3,24	X	0,05	=	0,16
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B187	1,40	X	1,20	=	1,68	X	0,05	=	0,08
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B188	1,00	X	1,20	=	1,20	X	0,05	=	0,06
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B189	1,90	X	2,50	=	4,75	X	0,05	=	0,24
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B190	2,00	X	1,90	=	3,80	X	0,05	=	0,19
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B191	1,10	X	0,90	=	0,99	X	0,05	=	0,05
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B192	1,50	X	1,10	=	1,65	X	0,05	=	0,08
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B193	3,20	X	2,00	=	6,40	X	0,05	=	0,32
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B194	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B195	1,00	X	1,30	=	1,30	X	0,05	=	0,07
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B196	1,80	X	1,50	=	2,70	X	0,05	=	0,14
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B197	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B198	2,10	X	2,00	=	4,20	X	0,05	=	0,21

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
28.0	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL	18/03/2026	B199	2,60	X	1,10	=	2,86	X	0,05	=	0,14
28.0	**ESTRADA DO SÃO GONÇALO**	**ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO**	**CARITE/ ZONA RURAL**					**ÁREA**	=	**675,23**		**VOLUME**	=	**41,11**
29.0	RUA LEÃO XIII	ENTRE A RUA DELMIRO GOUVEIA E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	18/03/2026	B1	1,30	X	1,20	=	1,56	X	0,05	=	0,08
29.0	RUA LEÃO XIII	ENTRE A RUA DELMIRO GOUVEIA E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	18/03/2026	B2	2,20	X	1,60	=	3,52	X	0,05	=	0,18
29.0	RUA LEÃO XIII	ENTRE A RUA DELMIRO GOUVEIA E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	18/03/2026	B3	4,10	X	2,10	=	8,61	X	0,05	=	0,43
29.0	RUA LEÃO XIII	ENTRE A RUA DELMIRO GOUVEIA E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	18/03/2026	B4	2,50	X	1,30	=	3,25	X	0,05	=	0,16
29.0	RUA LEÃO XIII	ENTRE A RUA DELMIRO GOUVEIA E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	18/03/2026	B5	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,05	=	0,07
29.0	RUA LEÃO XIII	ENTRE A RUA DELMIRO GOUVEIA E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	18/03/2026	B6	2,40	X	1,30	=	3,12	X	0,05	=	0,16
29.0	RUA LEÃO XIII	ENTRE A RUA DELMIRO GOUVEIA E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	18/03/2026	B7	3,50	X	1,10	=	3,85	X	0,05	=	0,19
29.0	RUA LEÃO XIII	ENTRE A RUA DELMIRO GOUVEIA E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	18/03/2026	B8	2,10	X	2,00	=	4,20	X	0,05	=	0,21
29.0	RUA LEÃO XIII	ENTRE A RUA DELMIRO GOUVEIA E A RUA JOSE MARROCOS	SALESIANOS	18/03/2026	B9	1,70	X	1,50	=	2,55	X	0,05	=	0,13
29.0	**RUA LEÃO XIII**	**ENTRE A RUA DELMIRO GOUVEIA E A RUA JOSE MARROCOS**	**SALESIANOS**					**ÁREA**	=	**31,98**		**VOLUME**	=	**1,60**
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B1	1,80	X	1,60	=	2,88	X	0,05	=	0,14
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B2	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,05	=	0,06
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B3	0,90	X	0,80	=	0,72	X	0,05	=	0,04
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B4	0,30	X	0,30	=	0,09	X	0,05	=	0,00
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B5	0,40	X	0,30	=	0,12	X	0,05	=	0,01
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B6	2,40	X	1,40	=	3,36	X	0,05	=	0,17
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B7	2,50	X	1,80	=	4,50	X	0,05	=	0,23
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B8	1,30	X	1,20	=	1,56	X	0,05	=	0,08
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B9	1,50	X	1,20	=	1,80	X	0,05	=	0,09
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B10	3,30	X	0,90	=	2,97	X	0,05	=	0,15
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B11	1,80	X	1,10	=	1,98	X	0,05	=	0,10
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B12	0,60	X	0,50	=	0,30	X	0,05	=	0,02
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B13	0,70	X	0,50	=	0,35	X	0,05	=	0,02
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B14	0,90	X	0,80	=	0,72	X	0,05	=	0,04

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

									AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34			
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B15**	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B16**	2,40	X	1,00	=	2,40	X	0,05	=	0,12				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B17**	1,90	X	1,10	=	2,09	X	0,05	=	0,10				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B18**	0,80	X	0,80	=	0,64	X	0,05	=	0,03				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B19**	1,70	X	1,10	=	1,87	X	0,05	=	0,09				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B20**	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,05	=	0,06				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B21**	0,70	X	0,80	=	0,56	X	0,05	=	0,03				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B22**	2,00	X	1,60	=	3,20	X	0,05	=	0,16				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B23**	2,70	X	1,90	=	5,13	X	0,05	=	0,26				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B24**	2,20	X	1,00	=	2,20	X	0,05	=	0,11				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B25**	2,80	X	1,80	=	5,04	X	0,05	=	0,25				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B26**	2,30	X	1,70	=	3,91	X	0,05	=	0,20				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B27**	2,30	X	1,30	=	2,99	X	0,05	=	0,15				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B28**	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B29**	2,10	X	1,20	=	2,52	X	0,05	=	0,13				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B30**	1,90	X	1,30	=	2,47	X	0,05	=	0,12				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B31**	0,80	X	0,90	=	0,72	X	0,05	=	0,04				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B32**	0,60	X	0,60	=	0,36	X	0,05	=	0,02				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B33**	1,20	X	0,90	=	1,08	X	0,05	=	0,05				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B34**	1,10	X	0,70	=	0,77	X	0,05	=	0,04				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B35**	1,40	X	1,40	=	1,96	X	0,05	=	0,10				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	**B36**	1,70	X	1,70	=	2,89	X	0,05	=	0,14				

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - [illegible]8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34				
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B37	0,90	X	0,80	=	0,72	X	0,05	=	0,04				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B38	0,80	X	0,80	=	0,64	X	0,05	=	0,03				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B39	0,90	X	0,80	=	0,72	X	0,05	=	0,04				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B40	3,10	X	1,10	=	3,41	X	0,05	=	0,17				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B41	1,70	X	0,90	=	1,53	X	0,05	=	0,08				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B42	0,70	X	0,40	=	0,28	X	0,05	=	0,01				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B43	1,40	X	0,80	=	1,12	X	0,05	=	0,06				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B44	1,40	X	1,10	=	1,54	X	0,05	=	0,08				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B45	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,05	=	0,13				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	18/03/2026	B46	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	20/03/2026	B47	2,50	X	1,20	=	3,00	X	0,05	=	0,15				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	20/03/2026	B48	1,70	X	1,60	=	2,72	X	0,05	=	0,14				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	20/03/2026	B49	2,50	X	1,50	=	3,75	X	0,05	=	0,19				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	20/03/2026	B50	1,30	X	1,30	=	1,69	X	0,05	=	0,08				
30.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA	CENTRO	20/03/2026	B51	3,00	X	3,00	=	9,00	X	0,05	=	0,45				
30.0	**RUA PADRE CÍCERO**	**ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA**	**CENTRO**					**ÁREA**	=	**103,03**		**VOLUME**	=	**5,15**				
31.0	RUA DO CRUZEIRO	CRUZAMENTO COM A RUA SÃO JOSE	CENTRO	18/03/2026	B1	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05				
31.0	RUA DO CRUZEIRO	CRUZAMENTO COM A RUA SÃO JOSE	CENTRO	18/03/2026	B2	2,20	X	1,10	=	2,42	X	0,05	=	0,12				
31.0	**RUA DO CRUZEIRO**	**CRUZAMENTO COM A RUA SÃO JOSE**	**CENTRO**					**ÁREA**	=	**3,42**		**VOLUME**	=	**0,17**				
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B1	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,05	=	0,06				
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B2	4,20	X	1,10	=	4,62	X	0,05	=	0,23				
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B3	1,00	X	0,80	=	0,80	X	0,05	=	0,04				
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B4	0,80	X	0,80	=	0,64	X	0,05	=	0,03				
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B5	1,20	X	1,30	=	1,56	X	0,05	=	0,08				
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B6	3,70	X	1,70	=	6,29	X	0,05	=	0,31				
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B7	1,10	X	0,50	=	0,55	X	0,05	=	0,03				

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Andrade Magalhães
Engº Civil - CREA [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B8	0,80	X	0.80	=	0,64	X	0,05	=	0,03
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B9	1,70	X	1.30	=	2,21	X	0,05	=	0,11
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B10	0,90	X	0.50	=	0,45	X	0,05	=	0,02
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B11	2,90	X	1.20	=	3,48	X	0,05	=	0,17
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B12	5,60	X	2.10	=	11,76	X	0,05	=	0,59
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B13	1,70	X	1.30	=	2,21	X	0,05	=	0,11
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B14	1,80	X	1.40	=	2,52	X	0,05	=	0,13
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B15	1,70	X	1.20	=	2,04	X	0,05	=	0,10
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B16	1,50	X	1.40	=	2,10	X	0,05	=	0,11
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B17	1,40	X	1.40	=	1,96	X	0,05	=	0,10
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B18	0,40	X	0.50	=	0,20	X	0,05	=	0,01
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B19	1,40	X	0.80	=	1,12	X	0,05	=	0,06
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B20	5,50	X	0.70	=	3,85	X	0,05	=	0,19
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B21	1,90	X	0.90	=	1,71	X	0,05	=	0,09
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B22	1,20	X	1.10	=	1,32	X	0,05	=	0,07
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B23	2,30	X	1,30	=	2,99	X	0,05	=	0,15
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B24	2,00	X	1.00	=	2,00	X	0,05	=	0,10
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B25	2,00	X	0.70	=	1,40	X	0,05	=	0,07
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B26	1,10	X	0.70	=	0,77	X	0,05	=	0,04
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B27	1,40	X	0.60	=	0,84	X	0,05	=	0,04
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B28	2,40	X	2.10	=	5,04	X	0,05	=	0,25
32.0	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO	SOCORRO	18/03/2026	B29	0,80	X	0.60	=	0,48	X	0,05	=	0,02
32.0	**AVENIDA LEANDRO BEZERRA**	**ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO**	**SOCORRO**					**ÁREA**	=	**66,76**		**VOLUME**	=	**3,34**
33.0	RUA PADRE ANTÔNIO ALMEIDA AGRA	ENTRE A RUA ODETE MATOS E A RUA ARNOBIO BACELAR CANECA	LAGOA SECA	18/03/2026	B1	140,00	X	8.45	=	1183,00	X	0,05	=	59,15
33.0	**RUA PADRE ANTÔNIO ALMEIDA AGRA**	**ENTRE A RUA ODETE MATOS E A RUA ARNOBIO BACELAR CANECA**	**LAGOA SECA**					**ÁREA**	=	**1183,00**		**VOLUME**	=	**59,15**
34.0	AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	JOSE GERALDO DA CRUZ	20/03/2026	B1	2,40	X	2.40	=	5,76	X	0.05	=	0,29
34.0	AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	JOSE GERALDO DA CRUZ	20/03/2026	B2	3,10	X	1.50	=	4,65	X	0,05	=	0,23
34.0	AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	JOSE GERALDO DA CRUZ	20/03/2026	B3	1,70	X	1,70	=	2,89	X	0.05	=	0,14
34.0	AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	JOSE GERALDO DA CRUZ	20/03/2026	B4	5,80	X	2.30	=	13,34	X	0.05	=	0,67
34.0	AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	JOSE GERALDO DA CRUZ	20/03/2026	B5	1,10	X	1.40	=	1,54	X	0.05	=	0,08
34.0	AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	JOSE GERALDO DA CRUZ	20/03/2026	B6	1,30	X	1.40	=	1,82	X	0.05	=	0,09

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
34.0	AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	JOSE GERALDO DA CRUZ	20/03/2026	B7	5,00	X	2,80	=	14,00	X	0,05	=	0,70
34.0	AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	JOSE GERALDO DA CRUZ	20/03/2026	B8	1,40	X	0,80	=	1,12	X	0,05	=	0,06
34.0	AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	JOSE GERALDO DA CRUZ	20/03/2026	B9	2,90	X	1,30	=	3,77	X	0,05	=	0,19
34.0	AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	JOSE GERALDO DA CRUZ	20/03/2026	B10	1,50	X	1,50	=	2,25	X	0,05	=	0,11
34.0	AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	JOSE GERALDO DA CRUZ	20/03/2026	B11	3,70	X	2,60	=	9,62	X	0,05	=	0,48
34.0	AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	JOSE GERALDO DA CRUZ	20/03/2026	B12	1,90	X	1,20	=	2,28	X	0,05	=	0,11
34.0	AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	JOSE GERALDO DA CRUZ	20/03/2026	B13	5,00	X	2,10	=	10,50	X	0,05	=	0,53
34.0	AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	JOSE GERALDO DA CRUZ	20/03/2026	B14	3,20	X	2,10	=	6,72	X	0,05	=	0,34
34.0	**AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA**	**ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE**	**JOSE GERALDO DA CRUZ**					**ÁREA**	=	**80,26**		**VOLUME**	=	**4,01**
35.0	RUA SANTO AGOSTINHO	ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO	CENTRO	20/03/2026	B1	1,00	X	0,80	=	0,80	X	0,03	=	0,02
35.0	RUA SANTO AGOSTINHO	ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO	CENTRO	20/03/2026	B2	2,50	X	1,80	=	4,50	X	0,03	=	0,14
35.0	RUA SANTO AGOSTINHO	ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO	CENTRO	20/03/2026	B3	2,50	X	2,10	=	5,25	X	0,03	=	0,16
35.0	RUA SANTO AGOSTINHO	ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO	CENTRO	20/03/2026	B4	2,70	X	1,50	=	4,05	X	0,03	=	0,12
35.0	RUA SANTO AGOSTINHO	ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO	CENTRO	20/03/2026	B5	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,03	=	0,08
35.0	RUA SANTO AGOSTINHO	ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO	CENTRO	20/03/2026	B6	3,40	X	2,30	=	7,82	X	0,03	=	0,23
35.0	RUA SANTO AGOSTINHO	ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO	CENTRO	20/03/2026	B7	3,00	X	2,20	=	6,60	X	0,03	=	0,20
35.0	RUA SANTO AGOSTINHO	ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO	CENTRO	20/03/2026	B8	2,40	X	0,80	=	1,92	X	0,03	=	0,06
35.0	RUA SANTO AGOSTINHO	ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO	CENTRO	20/03/2026	B9	1,80	X	0,70	=	1,26	X	0,03	=	0,04
35.0	RUA SANTO AGOSTINHO	ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO	CENTRO	20/03/2026	B10	3,70	X	1,20	=	4,44	X	0,03	=	0,13
35.0	RUA SANTO AGOSTINHO	ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO	CENTRO	20/03/2026	B11	2,00	X	1,30	=	2,60	X	0,03	=	0,08
35.0	RUA SANTO AGOSTINHO	ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO	CENTRO	20/03/2026	B12	1,90	X	1,10	=	2,09	X	0,03	=	0,06
35.0	RUA SANTO AGOSTINHO	ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO	CENTRO	20/03/2026	B13	2,40	X	2,00	=	4,80	X	0,03	=	0,14
35.0	RUA SANTO AGOSTINHO	ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO	CENTRO	20/03/2026	B14	1,80	X	1,60	=	2,88	X	0,03	=	0,09
35.0	RUA SANTO AGOSTINHO	ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO	CENTRO	20/03/2026	B15	3,40	X	1,80	=	6,12	X	0,03	=	0,18
35.0	**RUA SANTO AGOSTINHO**	**ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO**	**CENTRO**					**ÁREA**	=	**57,65**		**VOLUME**	=	**1,73**
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	23/03/2026	B1	3,50	X	2,40	=	8,40	X	0,08	=	0,67
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	23/03/2026	B2	3,20	X	3,00	=	9,60	X	0,08	=	0,77
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	23/03/2026	B3	2,80	X	1,90	=	5,32	X	0,08	=	0,43

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - PE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	23/03/2026	**B4**	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0.08	=	0,18
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	23/03/2026	**B5**	2,30	X	1,70	=	3,91	X	0.08	=	0,31
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	23/03/2026	**B6**	2,60	X	0.90	=	2,34	X	0.08	=	0,19
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	23/03/2026	**B7**	2,10	X	1,80	=	3,78	X	0.08	=	0,30
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	23/03/2026	**B8**	1,90	X	1,60	=	3,04	X	0,08	=	0,24
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	23/03/2026	**B9**	4,10	X	2,70	=	11,07	X	0,08	=	0,89
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	23/03/2026	**B10**	4,70	X	3,30	=	15,51	X	0,08	=	1,24
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	23/03/2026	**B11**	3,30	X	2,20	=	7,26	X	0,08	=	0,58
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	23/03/2026	**B12**	4,90	X	4,60	=	22,54	X	0,08	=	1,80
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	23/03/2026	**B13**	3,80	X	2.60	=	9,88	X	0.08	=	0,79
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	23/03/2026	**B14**	3,70	X	2.40	=	8,88	X	0.08	=	0,71
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	23/03/2026	**B15**	0,90	X	0.80	=	0,72	X	0.08	=	0,06
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	24/03/2026	**B16**	5,30	X	3.60	=	19,08	X	0.10	=	1,91
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	24/03/2026	**B17**	11,40	X	4.00	=	45,60	X	0.10	=	4,56
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	24/03/2026	**B18**	3,10	X	2.10	=	6,51	X	0.05	=	0,33
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	24/03/2026	**B19**	4,10	X	2,40	=	9,84	X	0.08	=	0,79
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	24/03/2026	**B20**	9,30	X	4,00	=	37,20	X	0.08	=	2,98
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	24/03/2026	**B21**	3,80	X	2,40	=	9,12	X	0,08	=	0,73
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	24/03/2026	**B22**	6,10	X	2.80	=	17,08	X	0.08	=	1,37
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	24/03/2026	**B23**	2,10	X	1,80	=	3,78	X	0.08	=	0,30
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	24/03/2026	**B24**	4,00	X	2.30	=	9,20	X	0.08	=	0,74
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	24/03/2026	**B25**	1,40	X	1.00	=	1,40	X	0.08	=	0,11

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	24/03/2026	B26	4,80	X	4,00	=	19,20	X	0,10	=	1,92
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	24/03/2026	B27	21,60	X	2,90	=	62,64	X	0,10	=	6,26
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	25/03/2026	B28	4,20	X	3,00	=	12,60	X	0,10	=	1,26
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	25/03/2026	B29	3,30	X	2,50	=	8,25	X	0,10	=	0,83
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	25/03/2026	B30	3,80	X	2,90	=	11,02	X	0,10	=	1,10
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	25/03/2026	B31	2,10	X	1,30	=	2,73	X	0,05	=	0,14
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	25/03/2026	B32	1,50	X	1,40	=	2,10	X	0,05	=	0,11
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	25/03/2026	B33	4,60	X	3,50	=	16,10	X	0,10	=	1,61
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	25/03/2026	B34	5,90	X	5,60	=	33,04	X	0,10	=	3,30
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	25/03/2026	B35	5,10	X	3,60	=	18,36	X	0,10	=	1,84
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	25/03/2026	B36	1,40	X	1,70	=	2,38	X	0,10	=	0,24
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	25/03/2026	B37	5,70	X	3,30	=	18,81	X	0,10	=	1,88
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	25/03/2026	B38	1,70	X	1,60	=	2,72	X	0,05	=	0,14
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	25/03/2026	B39	2,30	X	2,20	=	5,06	X	0,05	=	0,25
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	25/03/2026	B40	9,80	X	3,40	=	33,32	X	0,10	=	3,33
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	25/03/2026	B41	10,00	X	4,00	=	40,00	X	0,10	=	4,00
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	25/03/2026	B42	3,80	X	1,50	=	5,70	X	0,10	=	0,57
36.0	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA	31/03/2026	B43	14,20	X	7,10	=	100,82	X	0,10	=	10,08
36.0	**RODOVIA MIGUEL HOMEM**	**ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES**	**ROMEIRO AURELIANO PEREIRA**					**ÁREA**	=	**668,15**		**VOLUME**	=	**61,82**
37.0	RUA SANTA CECÍLIA	ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA	SOCORRO	23/03/2026	B1	1,30	X	1,10	=	1,43	X	0,03	=	0,04
37.0	RUA SANTA CECÍLIA	ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA	SOCORRO	23/03/2026	B2	2,00	X	1,80	=	3,60	X	0,03	=	0,11
37.0	RUA SANTA CECÍLIA	ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA	SOCORRO	23/03/2026	B3	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,03	=	0,05
37.0	RUA SANTA CECÍLIA	ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA	SOCORRO	23/03/2026	B4	1,30	X	1,00	=	1,30	X	0,03	=	0,04
37.0	RUA SANTA CECÍLIA	ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA	SOCORRO	23/03/2026	B5	2,50	X	1,50	=	3,75	X	0,03	=	0,11

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
37.0	RUA SANTA CECÍLIA	ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA	SOCORRO	23/03/2026	B6	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,03	=	0,04
37.0	RUA SANTA CECÍLIA	ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA	SOCORRO	23/03/2026	B7	1,70	X	1,30	=	2,21	X	0,03	=	0,07
37.0	RUA SANTA CECÍLIA	ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA	SOCORRO	23/03/2026	B8	1,60	X	1,10	=	1,76	X	0,03	=	0,05
37.0	RUA SANTA CECÍLIA	ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA	SOCORRO	23/03/2026	B9	2,30	X	1,00	=	2,30	X	0,03	=	0,07
37.0	RUA SANTA CECÍLIA	ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA	SOCORRO	23/03/2026	B10	2,40	X	0,90	=	2,16	X	0,03	=	0,06
37.0	RUA SANTA CECÍLIA	ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA	SOCORRO	23/03/2026	B11	2,30	X	2,00	=	4,60	X	0,03	=	0,14
37.0	RUA SANTA CECÍLIA	ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA	SOCORRO	23/03/2026	B12	0,70	X	0,60	=	0,42	X	0,03	=	0,01
37.0	RUA SANTA CECÍLIA	ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA	SOCORRO	23/03/2026	B13	1,70	X	0,70	=	1,19	X	0,03	=	0,04
37.0	RUA SANTA CECÍLIA	ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA	SOCORRO	23/03/2026	B14	5,10	X	1,80	=	9,18	X	0,03	=	0,28
37.0	RUA SANTA CECÍLIA	ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA	SOCORRO	23/03/2026	B15	1,00	X	0,80	=	0,80	X	0,03	=	0,02
37.0	RUA SANTA CECÍLIA	ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA	SOCORRO	23/03/2026	B16	1,10	X	0,70	=	0,77	X	0,03	=	0,02
37.0	**RUA SANTA CECÍLIA**	**ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA**	**SOCORRO**					**ÁREA**	=	**38,61**		**VOLUME**	=	**1,16**
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B1	1,60	X	0,70	=	1,12	X	0,05	=	0,06
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B2	1,70	X	1,30	=	2,21	X	0,05	=	0,11
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B3	2,00	X	1,00	=	2,00	X	0,05	=	0,10
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B4	1,50	X	1,30	=	1,95	X	0,05	=	0,10
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B5	1,50	X	1,20	=	1,80	X	0,05	=	0,09
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B6	2,20	X	1,20	=	2,64	X	0,05	=	0,13
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B7	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B8	1,10	X	0,60	=	0,66	X	0,05	=	0,03
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B9	1,70	X	1,10	=	1,87	X	0,05	=	0,09
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B10	1,40	X	1,10	=	1,54	X	0,05	=	0,08
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B11	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,05	=	0,07
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B12	2,00	X	0,70	=	1,40	X	0,05	=	0,07
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B13	0,80	X	0,60	=	0,48	X	0,05	=	0,02
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B14	0,80	X	0,80	=	0,64	X	0,05	=	0,03
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B15	1,20	X	0,50	=	0,60	X	0,05	=	0,03
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B16	2,20	X	1,50	=	3,30	X	0,05	=	0,17
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B17	1,80	X	0,80	=	1,44	X	0,05	=	0,07
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B18	2,00	X	0,90	=	1,80	X	0,05	=	0,09
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B19	1,00	X	0,40	=	0,40	X	0,05	=	0,02
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B20	2,30	X	1,50	=	3,45	X	0,05	=	0,17
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B21	1,20	X	1,20	=	1,44	X	0,05	=	0,07
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B22	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B23	1,20	X	0,90	=	1,08	X	0,05	=	0,05
38.0	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA	ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES	SALGADINHO	23/03/2026	B24	6,70	X	0,90	=	6,03	X	0,05	=	0,30
38.0	**RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA**	**ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES**	**SALGADINHO**					**ÁREA**	=	**43,07**		**VOLUME**	=	**2,15**
39.0	RUA TODOS OS SANTOS	ENTRE AV. CARLOS CRUZ E A RUA SÃO MAMEDE	SANTA TEREZA	23/03/2026	B1	2,70	X	2,50	=	6,75	X	0,05	=	0,34
39.0	RUA TODOS OS SANTOS	ENTRE AV. CARLOS CRUZ E A RUA SÃO MAMEDE	SANTA TEREZA	23/03/2026	B2	3,50	X	3,70	=	12,95	X	0,05	=	0,65

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

Secretaria Mun[illegible]cipal de Infraestr[illegible]tura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

ESTADO CEARÁ

PREFEITUR[illegible]A MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

SEINFRA - SECR[illegible]ETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA[illegible]DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

O: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES

ÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1

RATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002

SA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34			
M	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)			
0	RUA TODOS OS SANTOS	ENTRE AV. CARLOS CRUZ E A RUA SÃO MAMEDE	SANTA TEREZA	23/03/2026	B3	2,20	X	0,80	=	1,76	X	0,05	=	0,09			
0	RUA TODOS OS SANTOS	ENTRE AV. CARLOS CRUZ E A RUA SÃO MAMEDE	SANTA TEREZA	23/03/2026	B4	2,90	X	1,70	=	4,93	X	0,05	=	0,25			
0	RUA TODOS OS SANTOS	ENTRE AV. CARLOS CRUZ E A RUA SÃO MAMEDE	SANTA TEREZA	23/03/2026	B5	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,05	=	0,11			
0	RUA TODOS OS SANTOS	ENTRE AV. CARLOS CRUZ E A RUA SÃO MAMEDE	SANTA TEREZA	23/03/2026	B6	0,80	X	0,60	=	0,48	X	0,05	=	0,02			
0	RUA TODOS OS SANTOS	ENTRE AV. CARLOS CRUZ E A RUA SÃO MAMEDE	SANTA TEREZA	23/03/2026	B7	1,10	X	1,20	=	1,32	X	0,05	=	0,07			
0	RUA TODOS OS SANTOS	ENTRE AV. CARLOS CRUZ E A RUA SÃO MAMEDE	SANTA TEREZA	23/03/2026	B8	0,80	X	0,70	=	0,56	X	0,05	=	0,03			
0	RUA TODOS OS SANTOS	ENTRE AV. CARLOS CRUZ E A RUA SÃO MAMEDE	SANTA TEREZA	23/03/2026	B9	4,50	X	1,20	=	5,40	X	0,05	=	0,27			
0	**RUA TODOS OS SANTOS**	**ENTRE AV. CARLOS CRUZ E A RUA SÃO MAMEDE**	**SANTA TEREZA**					**ÁREA**	=	**36,39**		**VOLUME**	=	**1,82**			
0	RUA CORONEL FAUSTO GUIMARÃES	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A AV. AILTON GOMES	PIRAJÁ	26/03/2026	B1	4,70	X	3,40	=	15,98	X	0,08	=	1,28			
0	RUA CORONEL FAUSTO GUIMARÃES	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A AV. AILTON GOMES	PIRAJÁ	26/03/2026	B2	3,80	X	2,00	=	7,60	X	0,08	=	0,61			
0	RUA CORONEL FAUSTO GUIMARÃES	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A AV. AILTON GOMES	PIRAJÁ	26/03/2026	B3	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05			
0	RUA CORONEL FAUSTO GUIMARÃES	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A AV. AILTON GOMES	PIRAJÁ	26/03/2026	B4	1,20	X	1,20	=	1,44	X	0,05	=	0,07			
0	RUA CORONEL FAUSTO GUIMARÃES	ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A AV. AILTON GOMES	PIRAJÁ	26/03/2026	B5	2,80	X	0,90	=	2,52	X	0,05	=	0,13			
0	**RUA CORONEL FAUSTO GUIMARÃES**	**ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A AV. AILTON GOME[illegible]S**	**PIRAJÁ**					**ÁREA**	=	**28,54**		**VOLUME**	=	**2,13**			
0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENT[illegible]E CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B1	1,40	X	4,90	=	6,86	X	0,05	=	0,34			
0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENT[illegible]E CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B2	0,90	X	2,30	=	2,07	X	0,05	=	0,10			
0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENT[illegible]E CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B3	1,90	X	3,10	=	5,89	X	0,05	=	0,29			
0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENT[illegible]E CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B4	1,70	X	2,30	=	3,91	X	0,05	=	0,20			
0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENT[illegible]E CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B5	2,00	X	3,00	=	6,00	X	0,05	=	0,30			
0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENT[illegible]E CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B6	1,50	X	1,20	=	1,80	X	0,05	=	0,09			
0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENT[illegible]E CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B7	1,90	X	1,30	=	2,47	X	0,05	=	0,12			
0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENT[illegible]E CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B8	2,60	X	2,80	=	7,28	X	0,05	=	0,36			
0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENT[illegible]E CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B9	1,30	X	0,70	=	0,91	X	0,05	=	0,05			
0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENT[illegible]E CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B10	1,30	X	1,20	=	1,56	X	0,05	=	0,08			
0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENT[illegible]E CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B11	1,80	X	1,10	=	1,98	X	0,05	=	0,10			
0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENT[illegible]E CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B12	2,60	X	2,00	=	5,20	X	0,05	=	0,26			
0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENT[illegible]E CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B13	0,80	X	3,00	=	2,40	X	0,05	=	0,12			

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Alme[illegible] Magalhães
Engº Civil - CREA - [illegible]8966 - D
Coral Construtora Rod[illegible]ho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

									ÁREA	Mº	5796,26		VOLUME	Mº	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
42.0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENTE CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B14	2,70	X	2,40	=	6,48	X	0,05	=	0,32
42.0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENTE CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B15	0,80	X	1,10	=	0,88	X	0,05	=	0,04
42.0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENTE CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B16	5,70	X	1,50	=	8,55	X	0,05	=	0,43
42.0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENTE CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B17	1,00	X	1,30	=	1,30	X	0,05	=	0,07
42.0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENTE CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B18	3,20	X	2,10	=	6,72	X	0,05	=	0,34
42.0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENTE CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B19	3,40	X	1,20	=	4,08	X	0,05	=	0,20
42.0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENTE CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B20	1,10	X	1,20	=	1,32	X	0,05	=	0,07
42.0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENTE CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B21	5,20	X	1,60	=	8,32	X	0,05	=	0,42
42.0	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENTE CAVALCANTE	PREFEITO CARLOS CRUZ	27/03/2026	B22	2,90	X	0,50	=	1,45	X	0,05	=	0,07
42.0	**RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA**	**ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENTE CAVALCANTE**	**PREFEITO CARLOS CRUZ**					**ÁREA**	**=**	**87,43**		**VOLUME**	**=**	**4,37**
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	27/03/2026	B1	3,00	X	1,50	=	4,50	X	0,10	=	0,45
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	27/03/2026	B2	11,00	X	6,00	=	66,00	X	0,15	=	9,90
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	27/03/2026	B3	3,00	X	3,00	=	9,00	X	0,10	=	0,90
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	27/03/2026	B4	6,00	X	1,50	=	9,00	X	0,10	=	0,90
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	27/03/2026	B5	11,00	X	3,00	=	33,00	X	0,10	=	3,30
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	27/03/2026	B6	3,00	X	3,00	=	9,00	X	0,10	=	0,90
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	27/03/2026	B7	11,80	X	4,00	=	47,20	X	0,15	=	7,08
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	30/03/2026	B8	8,40	X	4,40	=	36,96	X	0,08	=	2,96
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	30/03/2026	B9	11,70	X	2,90	=	33,93	X	0,08	=	2,71
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	30/03/2026	B10	4,60	X	3,00	=	13,80	X	0,08	=	1,10
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	30/03/2026	B11	2,50	X	2,40	=	6,00	X	0,08	=	0,48
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	30/03/2026	B12	2,70	X	2,40	=	6,48	X	0,08	=	0,52

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44879-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA [illegible] 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 9ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
DATA (PERÍODO): 01/03/2026 A 31/03/2026

								AREA	M²	5796,26		VOLUME	M³	365,34
ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	X	LARG.		AREA (M²)		ESP.		VOLUME (M³)
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	30/03/2026	**B13**	6,60	X	2,10	=	13,86	X	0.08	=	1,11
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	30/03/2026	**B14**	2,30	X	2.00	=	4,60	X	0.08	=	0,37
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	30/03/2026	**B15**	6,80	X	4.10	=	27,88	X	0.08	=	2,23
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	30/03/2026	**B16**	6,50	X	3.90	=	25,35	X	0.08	=	2,03
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	30/03/2026	**B17**	2,40	X	1,50	=	3,60	X	0.08	=	0,29
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	30/03/2026	**B18**	6,40	X	4.20	=	26,88	X	0.08	=	2,15
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	30/03/2026	**B19**	4,80	X	4,40	=	21,12	X	0.08	=	1,69
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	31/03/2026	**B20**	16,50	X	2,50	=	41,25	X	0.10	=	4,13
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	31/03/2026	**B21**	3,40	X	1.60	=	5,44	X	0,10	=	0,54
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	31/03/2026	**B22**	4,10	X	2.30	=	9,43	X	0.10	=	0,94
43.0	AVENIDA CARLOS CRUZ	ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR	AEROPORTO	31/03/2026	**B23**	13.10	X	7.10	=	93,01	X	0.15	=	13,95
43.0	**AVENIDA CARLOS CRUZ**	**ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR**	**AEROPORTO**					**ÁREA**	=	**547,29**		**VOLUME**	=	**60,63**
44.0	RUA MANOEL TAVARES LOPES	ENCONTRO COM RUA MARIA NELI GONÇALVES	FREI DAMIÃO	30/03/2026	**B1**	4,70	X	3.80	=	17,86	X	0.08	=	1,43
44.0	RUA MANOEL TAVARES LOPES	ENCONTRO COM RUA MARIA NELI GONÇALVES	FREI DAMIÃO	30/03/2026	**B2**	2,40	X	0,70	=	1,68	X	0,08	=	0,13
44.0	**RUA MANOEL TAVARES LOPES**	**ENCONTRO COM RUA MARIA NELI GONÇALVES**	**FREI DAMIÃO**					**ÁREA**	=	**19,54**		**VOLUME**	=	**1,56**

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 24.11.2025-04	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA - TRECHO 4.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 24 de novembro de 2025.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

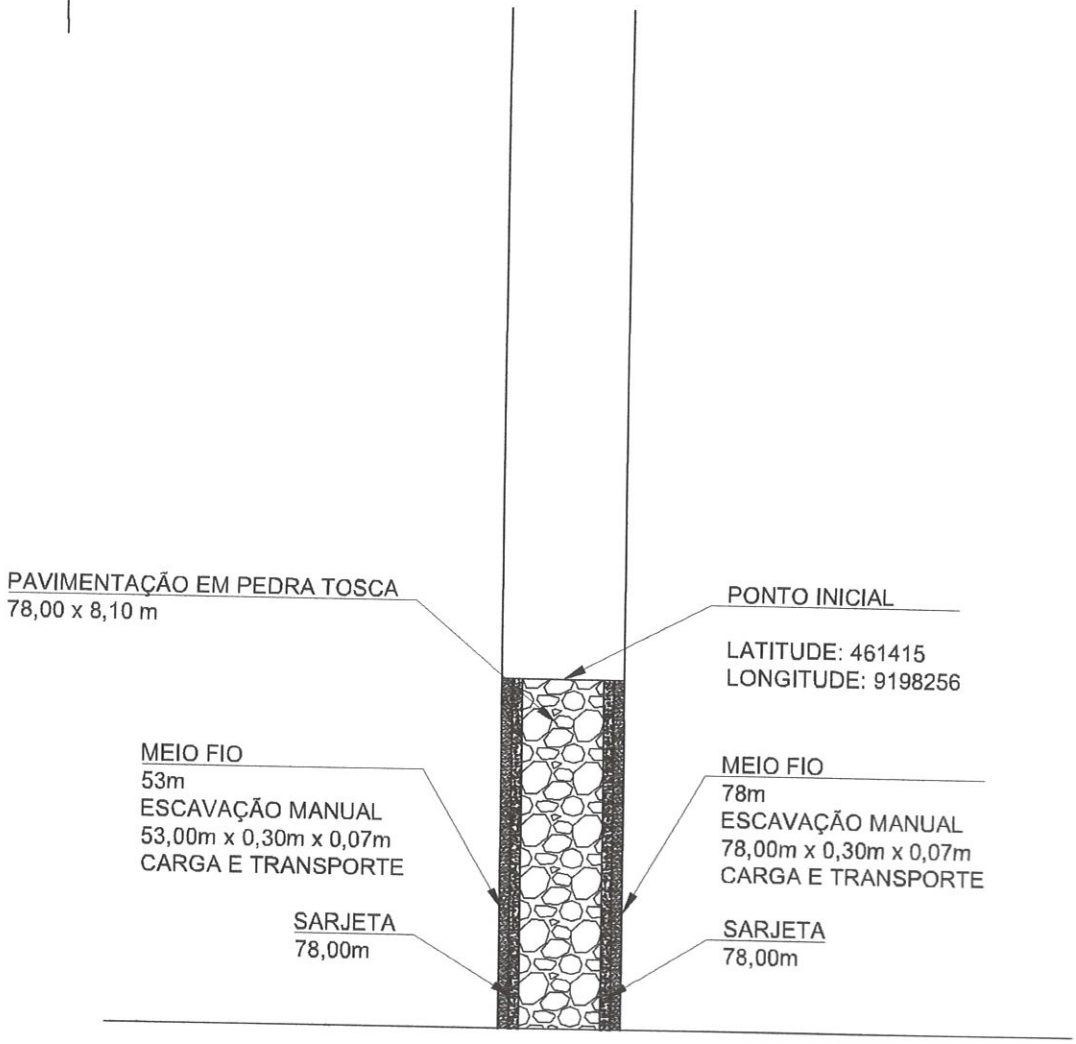

SERVIÇOS EXECUTADOS

- PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- EXECUÇÃO DE SARJETA
- MEIO FIO
- ESCAVAÇÃO MANUAL
- LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 01	**LOCALIDADE:** RUA JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA	**BAIRRO:** SÃO JOSÉ	**PRANCHA:** 1/2
SERVIÇO EXECUTADO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	**DATA:** 31/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	**LONG.:** 461415 **LAT.:** 9198256

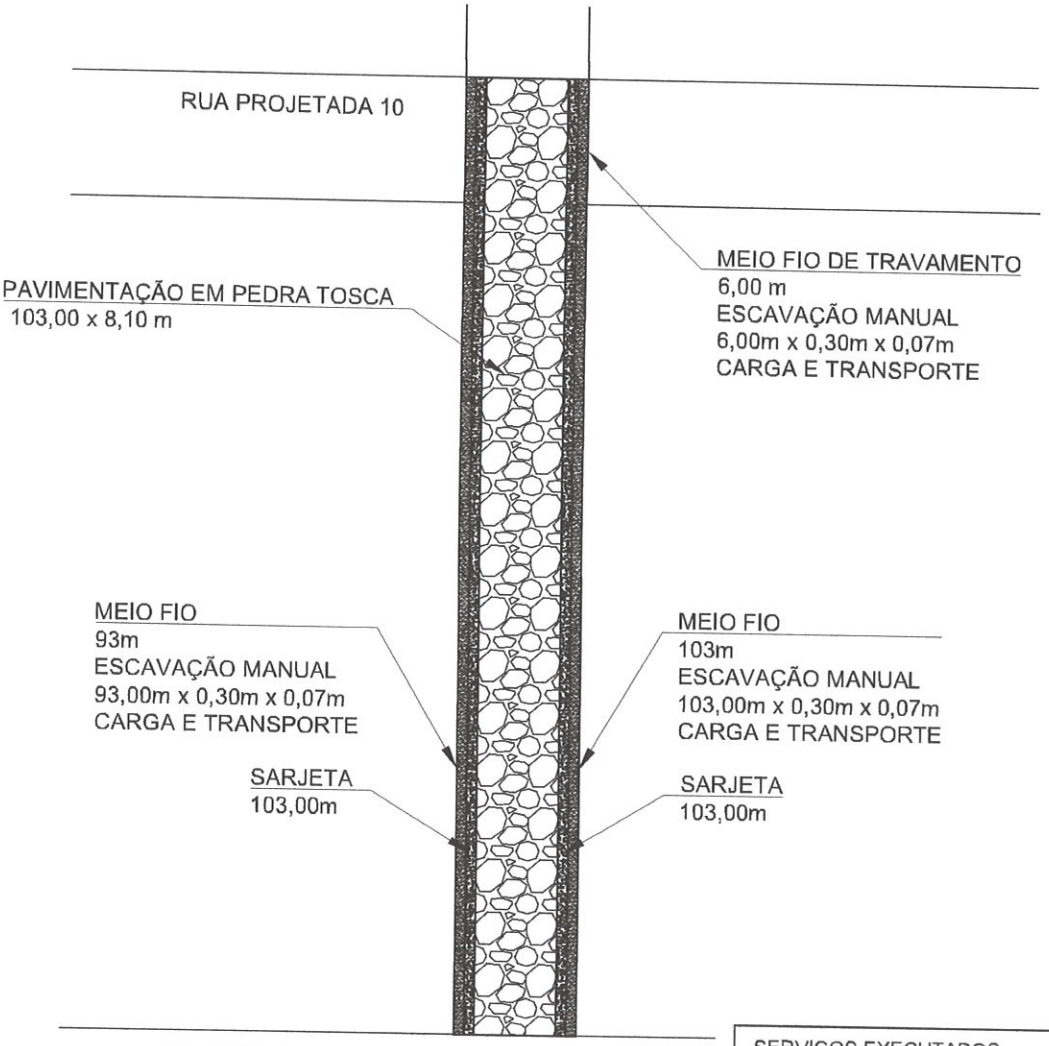

SERVIÇOS EXECUTADOS

- PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- EXECUÇÃO DE SARJETA
- MEIO FIO
- ESCAVAÇÃO MANUAL
- LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 01	**LOCALIDADE:** RUA JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA	**BAIRRO:** SÃO JOSÉ	**PRANCHA:** 2/2
SERVIÇO EXECUTADO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 461415 **LAT.:** 9198256
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	**DATA:** 31/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
1	RUA JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA - TRECHO 4	SÃO JOSÉ

TRECHO

INICIO: 461415; 9198256/ FIM: RUA SEM NOME (461448; 9198068)

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
HEITOR BORGES	31/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ÇAMENTO

ID:	01.0	RUA JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA - TRECHO 4				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1466,10	R$ 1,84	R$ 2.697,62
1.7	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	6,99	R$ 64,82	R$ 453,29
1.9	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1466,10	R$ 3,16	R$ 4.632,88
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	104,39	R$ 4,99	R$ 520,90
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	104,39	R$ 41,23	R$ 4.303,89
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.9	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1466,10	R$ 78,14	R$ 114.561,05
2.13	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	333,00	R$ 31,98	R$ 10.649,34
2.14	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	362,00	R$ 36,10	R$ 13.068,20
					TOTAL	R$ 150.887,17

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

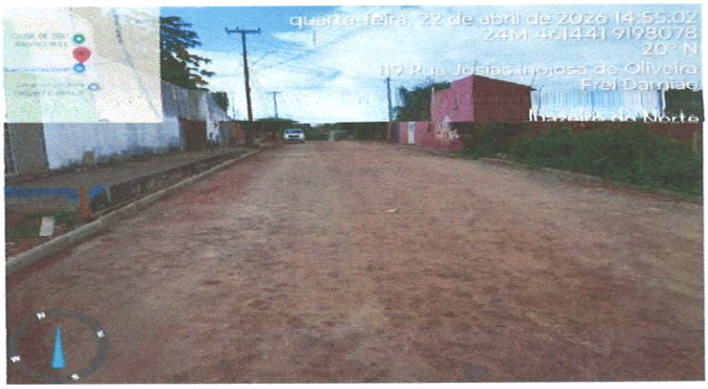

FOTO 02 - DEPOIS (1)

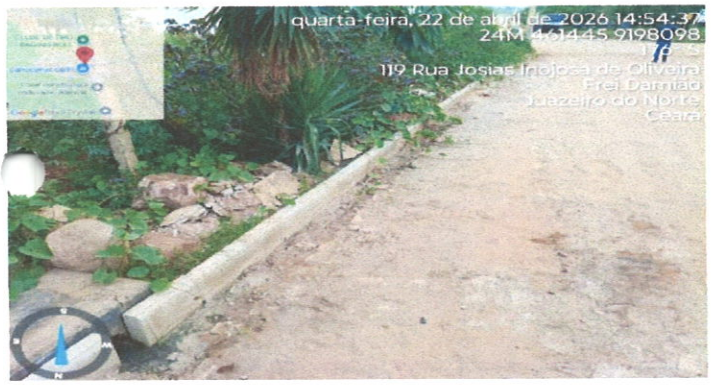

FOTO 03 - DEPOIS (2)

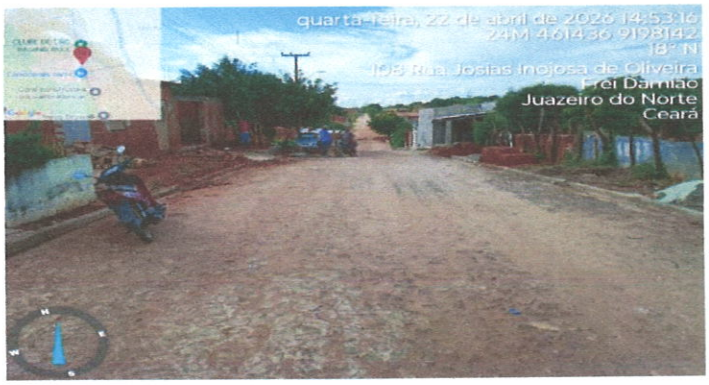

FOTO 04 - DEPOIS (3)

FOTO 05 - DEPOIS (4)

FOTO 06 - DEPOIS (5)

FOTO 07 - DEPOIS (6)

FOTO 08 - DEPOIS (7)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - DEPOIS (8)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 12.02.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 12 de fevereiro de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

RUA IARA MARIA
ALENCAR TORRES

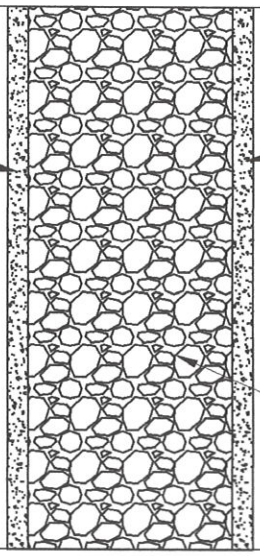

SARJETA
80,00 m

SARJETA
80,00 m

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
145,00 x 7,60 m

RUA MANOEL PIRACA
DE SOUZA

RUA JOSÉ
FRANCISCO DO
NASCIMENTO

SERVIÇOS EXECUTADOS

- PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- EXECUÇÃO DE SARJETA
- LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 02	**LOCALIDADE:** RUA JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO	**BAIRRO:** BETOLÂNDIA	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 469101 **LAT.:** 9200991
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	**DATA:** 31/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
2	RUA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO	BETOLÂNDIA

TRECHO

ENTRE A RUA MANOEL PIRACA DE SOUZA E A RUA IARA MARIA ALENCAR TORRES

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
HEITOR BORGES	31/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	2	RUA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1102,00	R$ 1,84	R$	2.027,68
1.9	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1102,00	R$ 3,16	R$	3.482,32
1.10	C3134	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/ TRANSP)	M3	133,41	R$ 71,18	R$	9.496,13
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	71,63	R$ 4,99	R$	357,43
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	71,63	R$ 41,23	R$	2.953,30
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM					
2.9	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1102,00	R$ 78,14	R$	86.110,28
2.14	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	160,00	R$ 36,10	R$	5.776,00
					TOTAL	R$	110.203,14

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

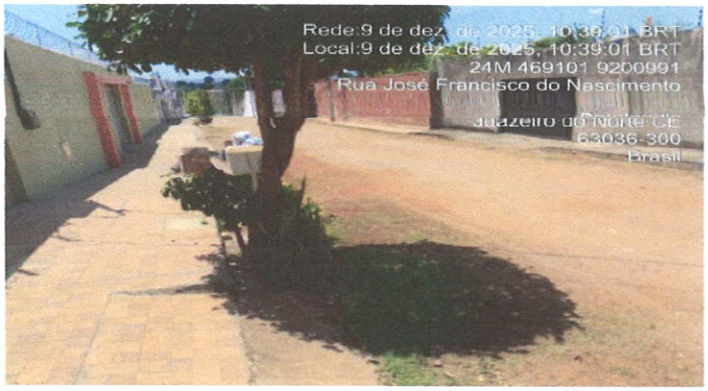

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

FOTO 07 - ANTES

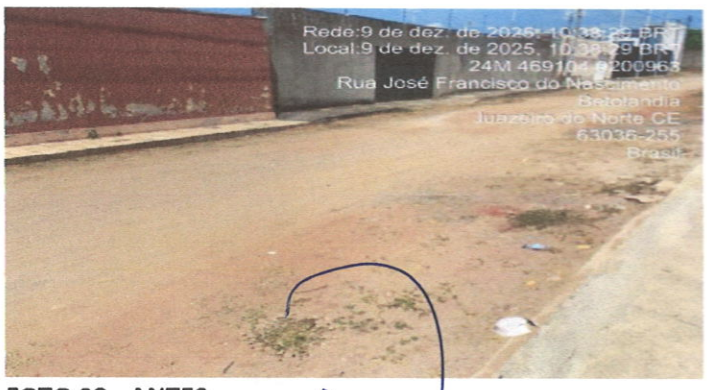

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

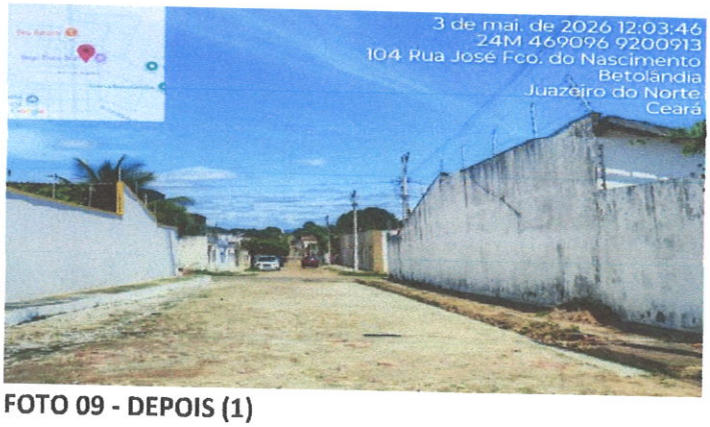

FOTO 09 - DEPOIS (1)

FOTO 10 - DEPOIS (2)

FOTO 11 - DEPOIS (3)

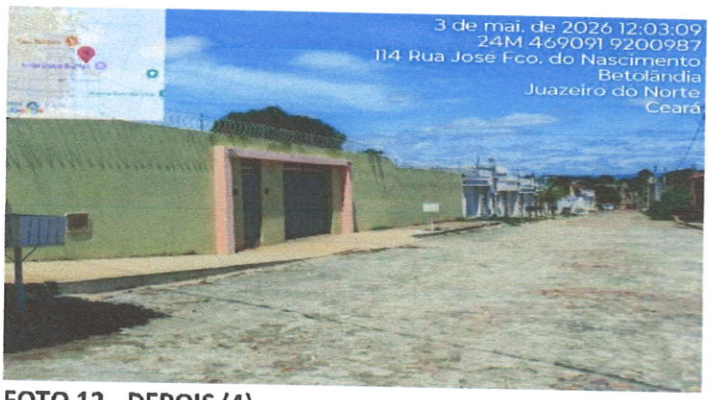

FOTO 12 - DEPOIS (4)

FOTO 13 - DEPOIS (5)

FOTO 14 - DEPOIS (6)

FOTO 15 - DEPOIS (7)

FOTO 16 - DEPOIS (8)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 17 - DEPOIS (9)

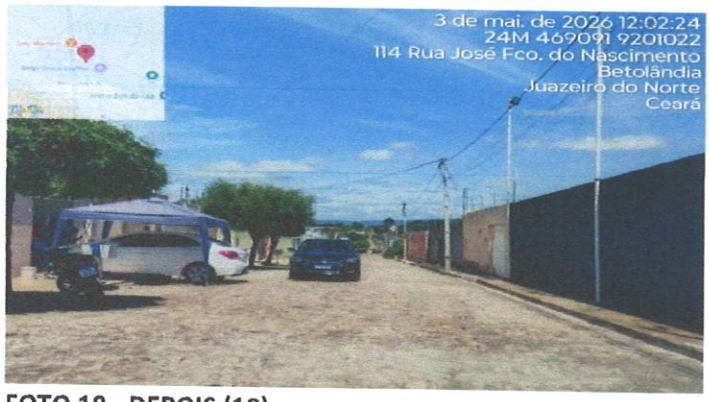

FOTO 18 - DEPOIS (10)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 02.03.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA JOSE ANASTACIO TAVARES .	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 2 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

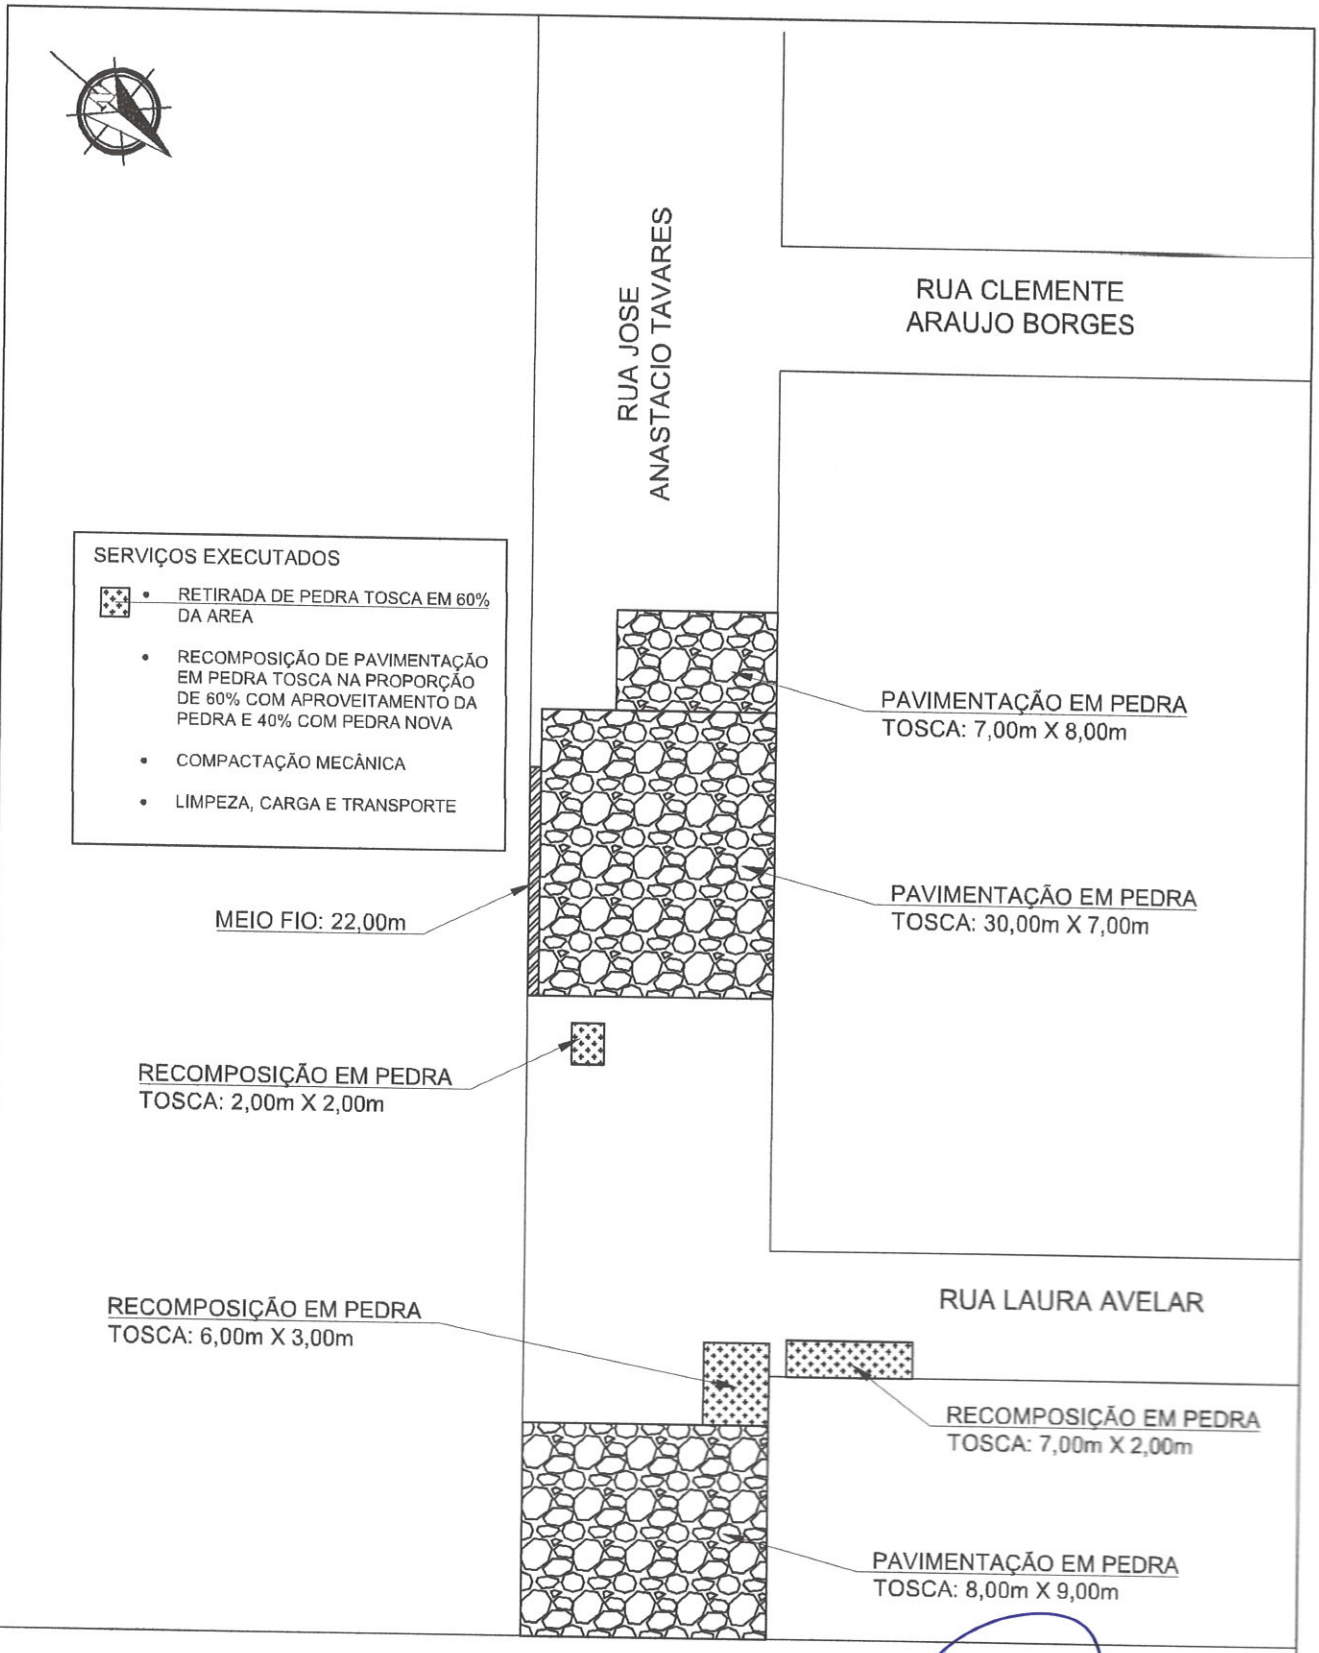

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 2A	**LOCALIDADE:** RUA JOSE ANASTACIO	**BAIRRO:** PLANALTO	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465462 **LAT.:** 9198822
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	**DATA:** 31/03/2026	**RESP. DESENHO:** HERMERSON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID: 45

ENDEREÇO: RUA JOSE ANASTACIO TAVARES

BAIRRO: PLANALTO

TRECHO: ENTRE A RUA METILDE FERREIRA E A RUA CLEMENTE DE ARAUJO BORGES

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO: 31/03/2026

EMPRESA EXECUTORA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO: N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	45	RUA JOSE ANASTACIO TAVARES						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I		P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	353,00	R$	1,84	R$	649,52
1.4	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	21,60	R$	14,68	R$	317,09
1.7	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,67	R$	64,82	R$	43,56
1.9	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	317,00	R$	3,16	R$	1.001,72
1.13	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	21,60	R$	1,35	R$	29,16
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	23,82	R$	4,99	R$	118,86
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	23,82	R$	41,23	R$	982,05
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM						
2.9	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	331,40	R$	78,14	R$	25.895,60
2.11	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	21,60	R$	37,98	R$	820,37
2.13	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	32,00	R$	31,98	R$	1.023,36
					TOTAL		R$	30.881,29

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (1)

FOTO 02 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (2)

FOTO 03 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (3)

FOTO 04 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (4)

FOTO 05 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (5)

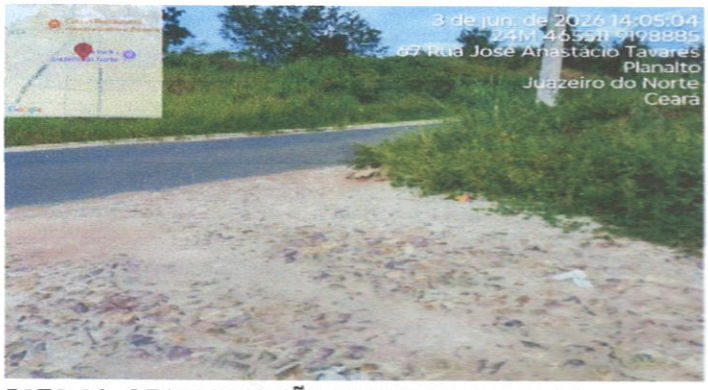

FOTO 06 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (6)

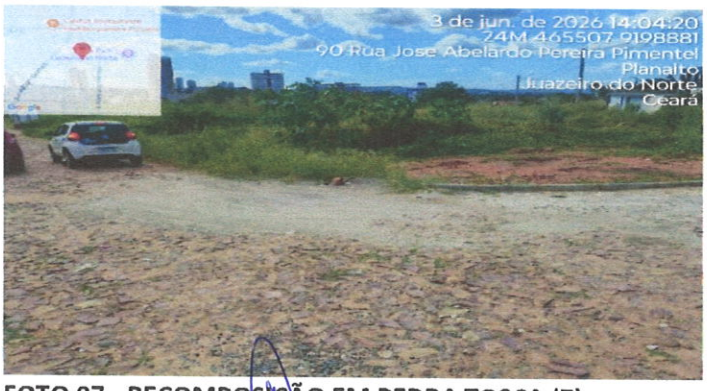

FOTO 07 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (7)

FOTO 08 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (8)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (9)

FOTO 10 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (10)

FOTO 11 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (11)

FOTO 12 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (12)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 02.03.2026-02	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) AVENIDA AILTON GOMES.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 2 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

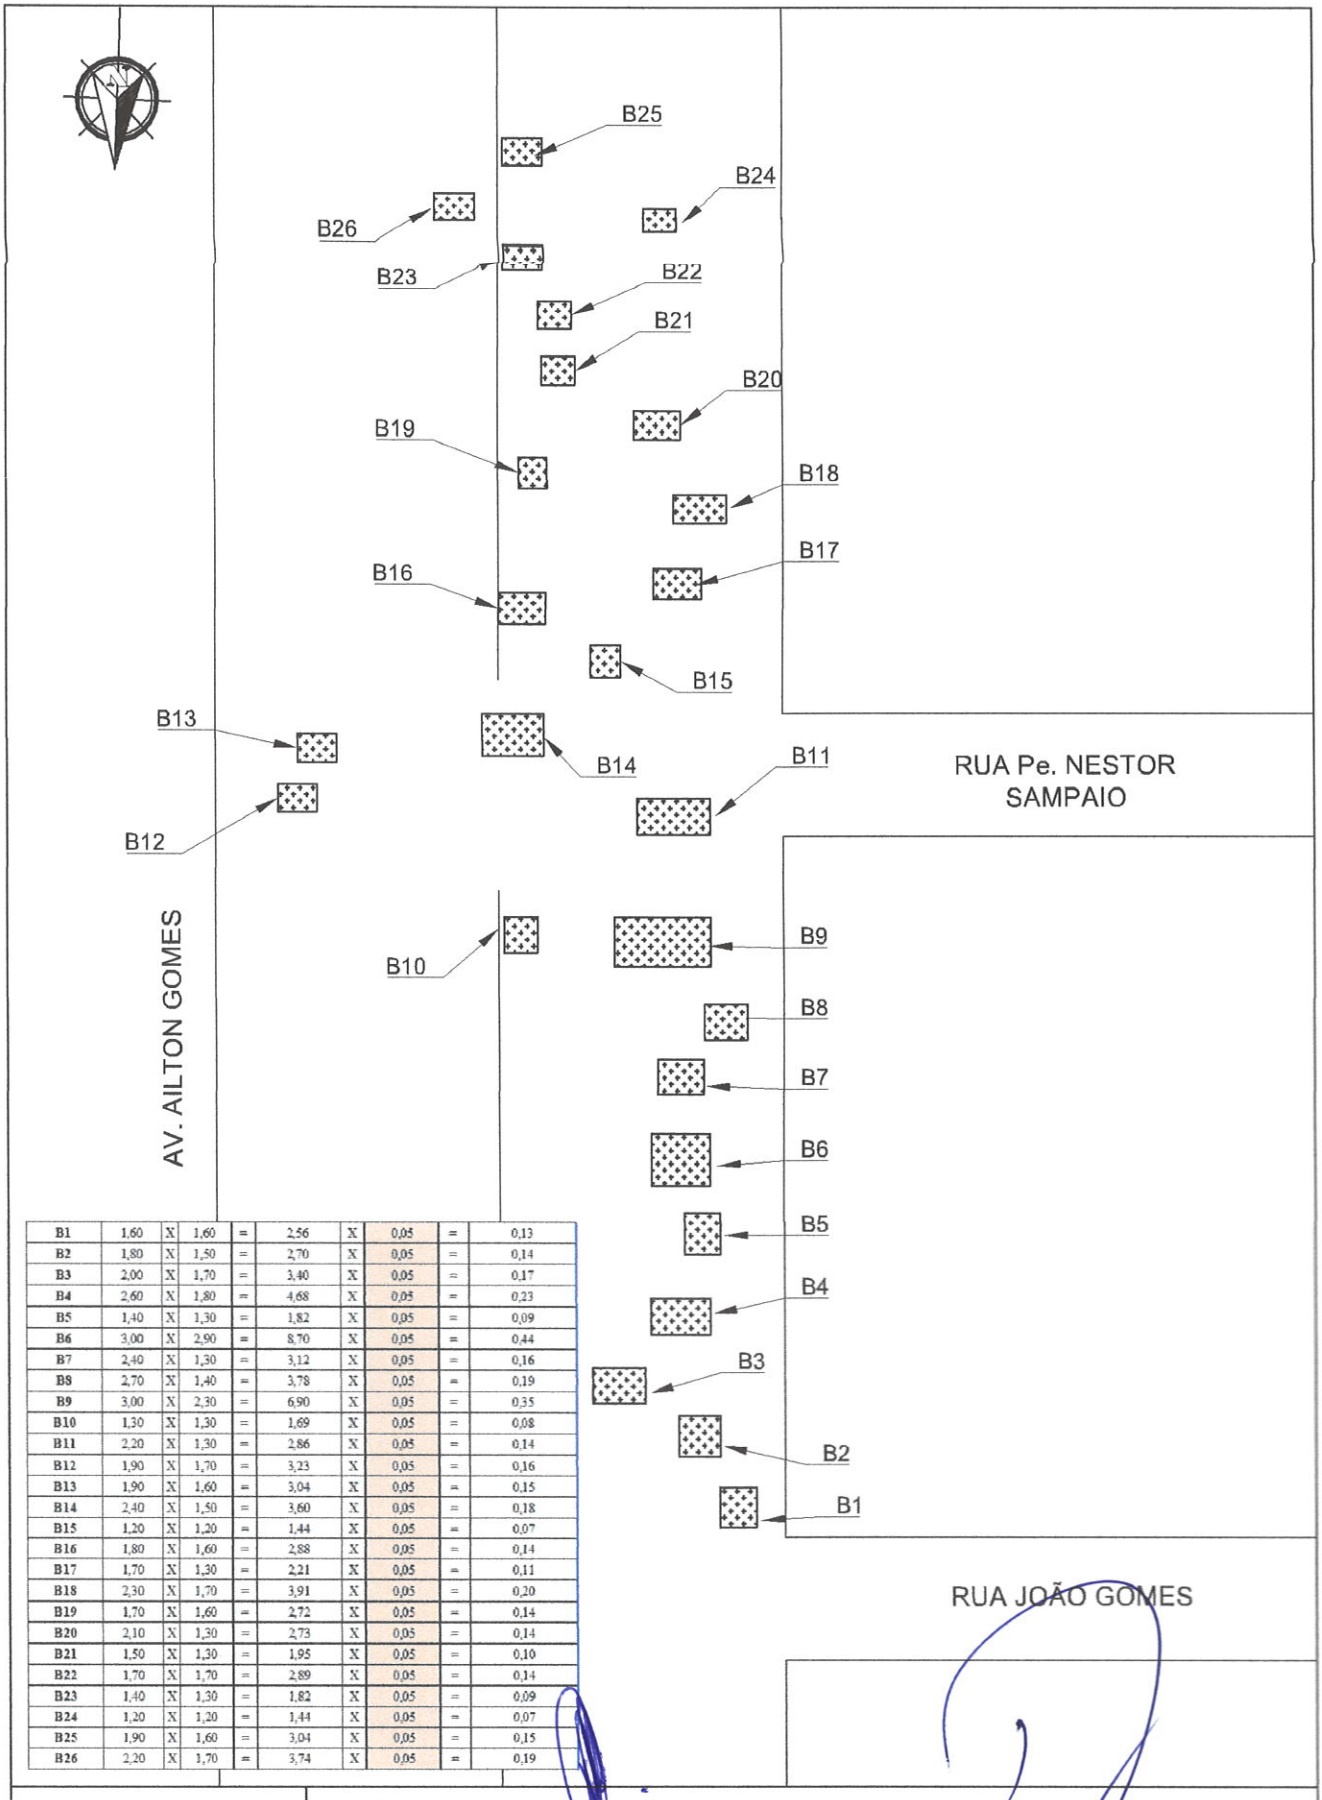

B1	1,60	X	1,60	=	2,56	X	0,05	=	0,13
B2	1,80	X	1,50	=	2,70	X	0,05	=	0,14
B3	2,00	X	1,70	=	3,40	X	0,05	=	0,17
B4	2,60	X	1,80	=	4,68	X	0,05	=	0,23
B5	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09
B6	3,00	X	2,90	=	8,70	X	0,05	=	0,44
B7	2,40	X	1,30	=	3,12	X	0,05	=	0,16
B8	2,70	X	1,40	=	3,78	X	0,05	=	0,19
B9	3,00	X	2,30	=	6,90	X	0,05	=	0,35
B10	1,30	X	1,30	=	1,69	X	0,05	=	0,08
B11	2,20	X	1,30	=	2,86	X	0,05	=	0,14
B12	1,90	X	1,70	=	3,23	X	0,05	=	0,16
B13	1,90	X	1,60	=	3,04	X	0,05	=	0,15
B14	2,40	X	1,50	=	3,60	X	0,05	=	0,18
B15	1,20	X	1,20	=	1,44	X	0,05	=	0,07
B16	1,80	X	1,60	=	2,88	X	0,05	=	0,14
B17	1,70	X	1,30	=	2,21	X	0,05	=	0,11
B18	2,30	X	1,70	=	3,91	X	0,05	=	0,20
B19	1,70	X	1,60	=	2,72	X	0,05	=	0,14
B20	2,10	X	1,30	=	2,73	X	0,05	=	0,14
B21	1,50	X	1,30	=	1,95	X	0,05	=	0,10
B22	1,70	X	1,70	=	2,89	X	0,05	=	0,14
B23	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09
B24	1,20	X	1,20	=	1,44	X	0,05	=	0,07
B25	1,90	X	1,60	=	3,04	X	0,05	=	0,15
B26	2,20	X	1,70	=	3,74	X	0,05	=	0,19

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 03	**LOCALIDADE:** AV. AILTON GOMES	**BAIRRO:** FRANCISCANOS	**PRANCHA:** 1/2
SERVIÇO EXECUTADO: EXECUÇÃO DE TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** LONG.: 465229 LAT.: 9202285
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 02/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

B27	6,50	X	2,10	=	13,65	X	0,10	=	1,37
B28	8,60	X	1,20	=	10,32	X	0,05	=	0,52
B29	1,40	X	1,10	=	1,54	X	0,05	=	0,08
B30	2,00	X	2,40	=	4,80	X	0,05	=	0,24
B31	2,80	X	2,60	=	7,28	X	0,05	=	0,36
B32	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,05	=	0,11
			ÁREA	=	**122,68**		**VOLUME**	=	**6,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 03	**LOCALIDADE:** AV. AILTON GOMES	**BAIRRO:** FRANCISCANOS	**PRANCHA:** 2/2
SERVIÇO EXECUTADO: EXECUÇÃO DE TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465057 **LAT.:** 9197581
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 02/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID: 3

ENDEREÇO: AVENIDA AILTON GOMES

BAIRRO: DIVERSOS

TRECHO: ENTRE A RUA JOÃO GOMES E A RUA MANOEL BALBINO DA SILVA

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM

DATA MEDIÇÃO: 02/03/2026

EMPRESA EXECUTORA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO: N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	3	AVENIDA AILTON GOMES				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	122,68	R$ 1,84	R$ 225,74
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	6,82	R$ 1.696,15	R$ 11.561,81
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/ TRANSP)	M2	122,68	R$ 0,33	R$ 40,48
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,05	R$ 3.062,93	R$ 150,31
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	1,03	R$ 472,85	R$ 489,28
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	17,46	R$ 30,12	R$ 526,01
					TOTAL	R$ 12.993,63

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

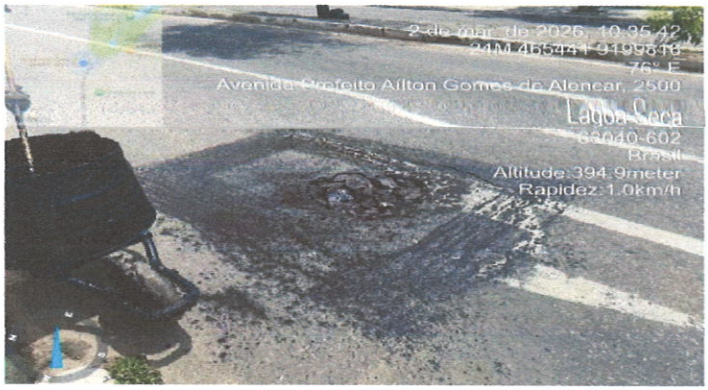

FOTO 02 - ANTES

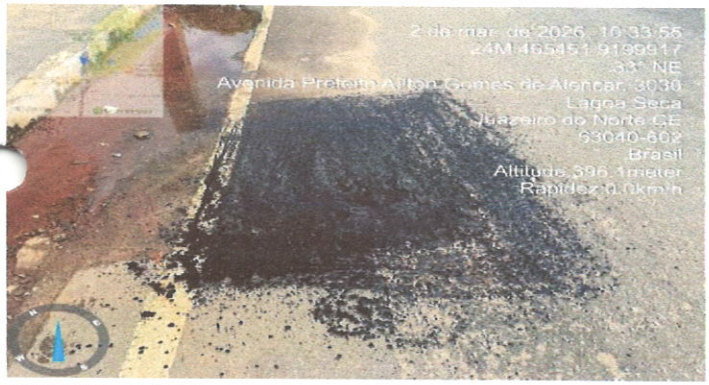

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

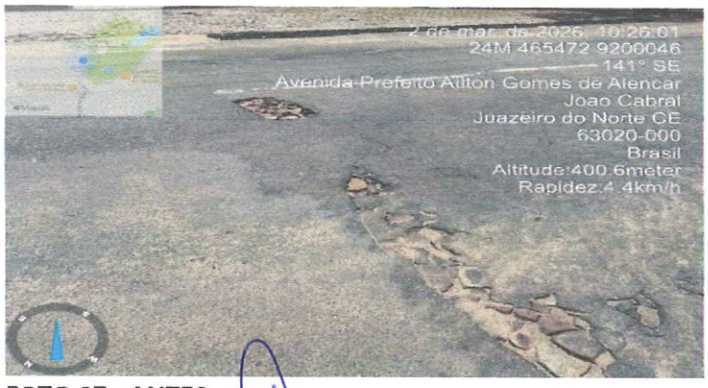

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

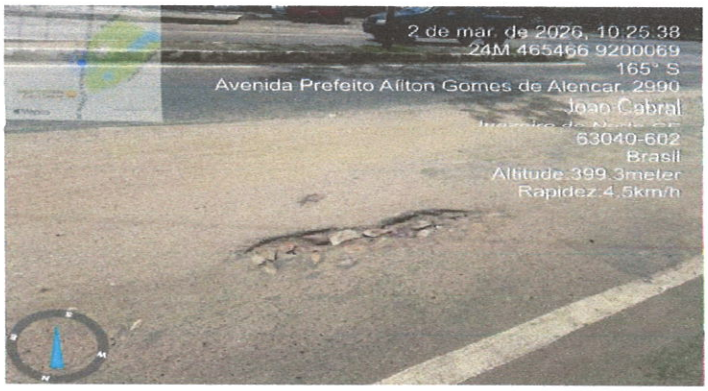

FOTO 09 - ANTES

FOTO 10 - ANTES

FOTO 11 - ANTES

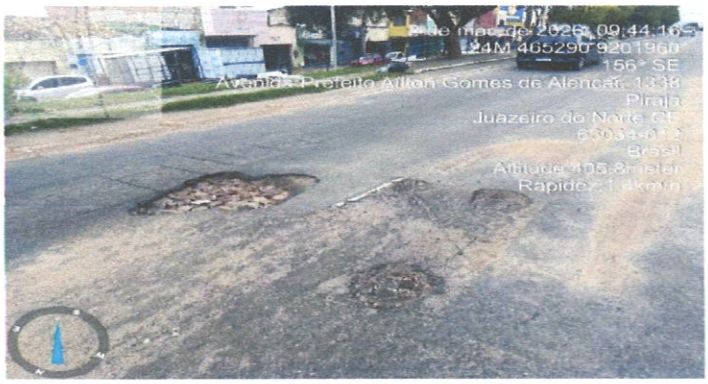

FOTO 12 - ANTES

FOTO 13 - ANTES

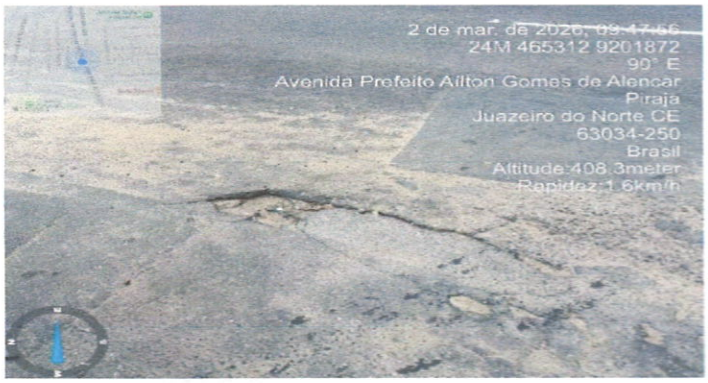

FOTO 14 - ANTES

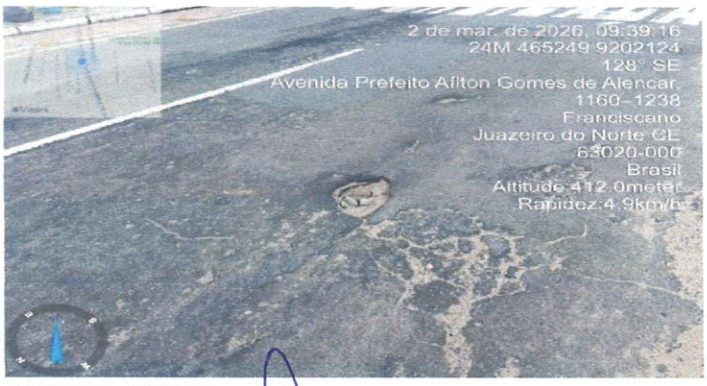

FOTO 15 - ANTES

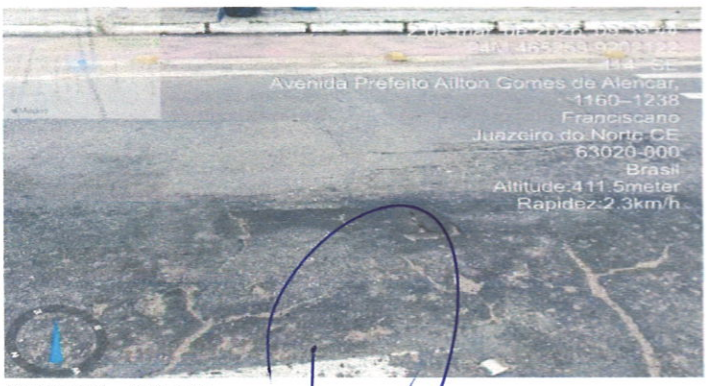

FOTO 16 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 17 - ANTES

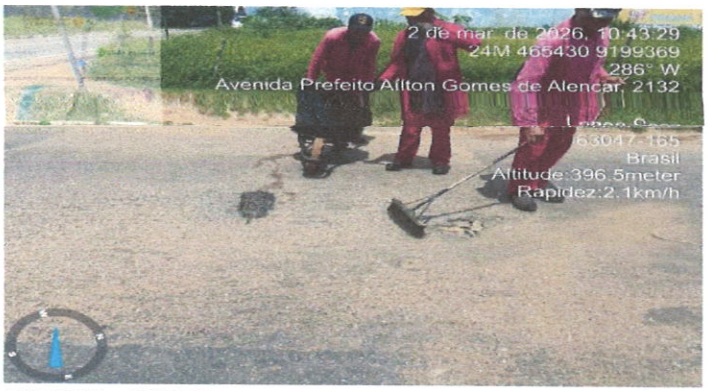

FOTO 18 - ANTES

FOTO 19 - ANTES

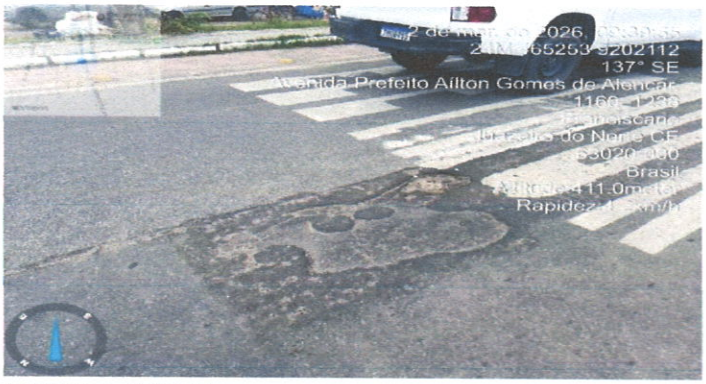

FOTO 20 - ANTES

FOTO 21 - ANTES

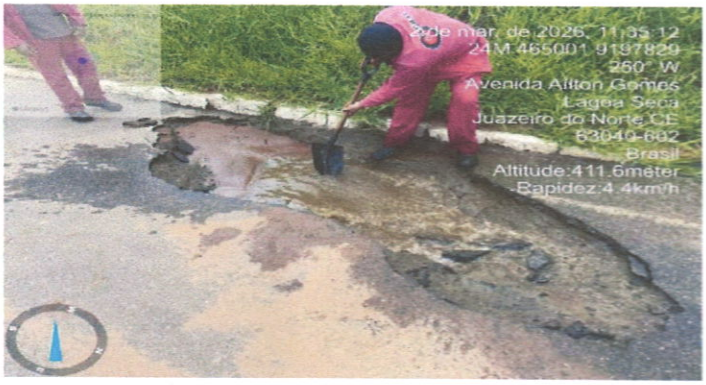

FOTO 22 - ANTES

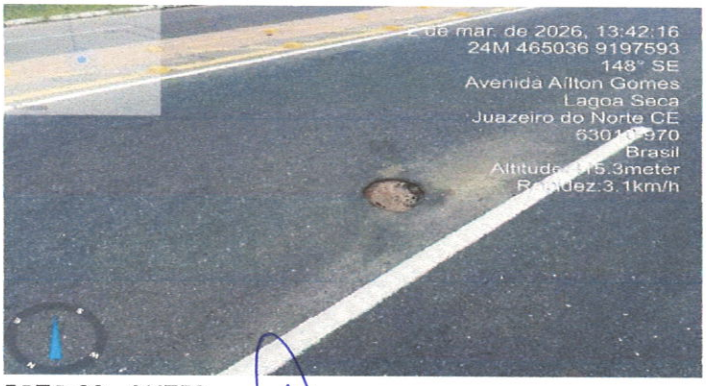

FOTO 23 - ANTES

FOTO 24 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 25 - ANTES

FOTO 26 - ANTES

FOTO 27 - ANTES

FOTO 28 - B1

FOTO 29 - B2 E B3

FOTO 30 - B4

FOTO 31 - B5

FOTO 32 - B6

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 33 - B7 E 8

FOTO 34 - B9 E 10

FOTO 35 - B11

FOTO 36 - B12

FOTO 37 - B13,14 E 15

FOTO 38 - B16

FOTO 39 - B17

FOTO 40 - B18

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 41 - B19

FOTO 42 - B20

FOTO 43 - B21

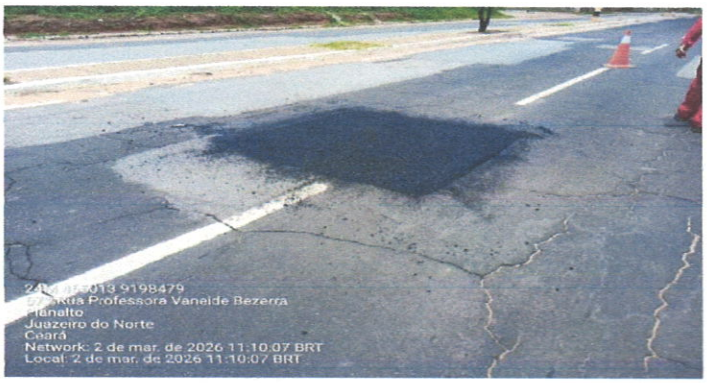

FOTO 44 - B22

FOTO 45 - B23

FOTO 46 - B24

FOTO 47 - B25

FOTO 48 - B26

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 49 - B27

FOTO 50 - B28

FOTO 51 - B29

FOTO 52 - B30

FOTO 53 - B31 E B32

FOTO 54 - B33

FOTO 55 - B34

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engª Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 02.03.2026-03	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA ANTÔNIO VIEIRA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 2 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

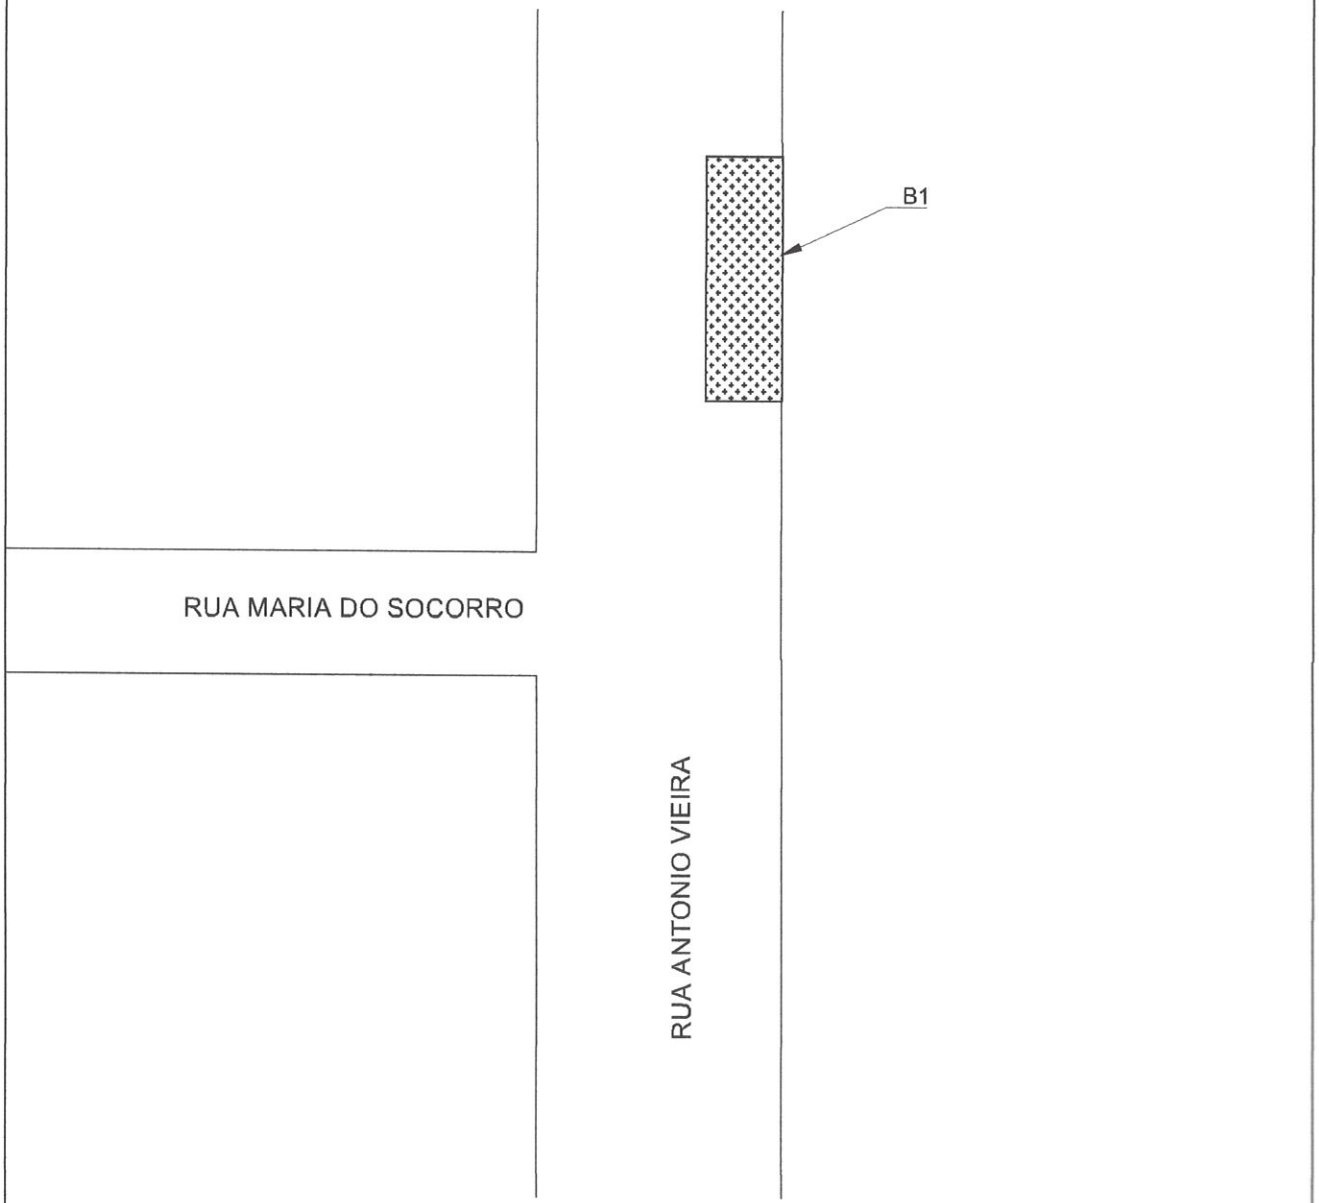

B1	15,60	X	3,60	=	56,16	X	0,08	=	4,49
			ÁREA	=	56,16		VOLUME	=	4,49

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 04	**LOCALIDADE:** RUA ANTONIO VIEIRA	**BAIRRO:** PROFESSORA MARIA GERLI	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 02/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	**LONG.:** 470165 **LAT.:** 9200557

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
4	RUA ANTÔNIO VIEIRA	PROFESSORA MARIA GERLI

TRECHO

ENCONTRO COM A RUA MARIA DO SOCORRO

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	02/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	4	RUA ANTÔNIO VIEIRA						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I		P. TOTAL C/B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	56,16	R$	1,84	R$	103,34
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM						
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	4,49	R$	1.696,15	R$	7.620,47
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/ TRANSP)	M2	56,16	R$	0,33	R$	18,53
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,02	R$	3.062,93	R$	68,81
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,67	R$	472,85	R$	317,81
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	11,50	R$	30,12	R$	346,40
					TOTAL		R$	8.475,36

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - B1

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO**
02.03.2026-04	CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO	**DATA DO CONTRATO**
2025.09.02-0002	02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A)	
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO:	
AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF	**N° DO TELEFONE/FAX**
07.195.191/0001-33	(85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) AVENIDA CASTELO BRANCO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO**
12 (DOZE) MESES	12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 2 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



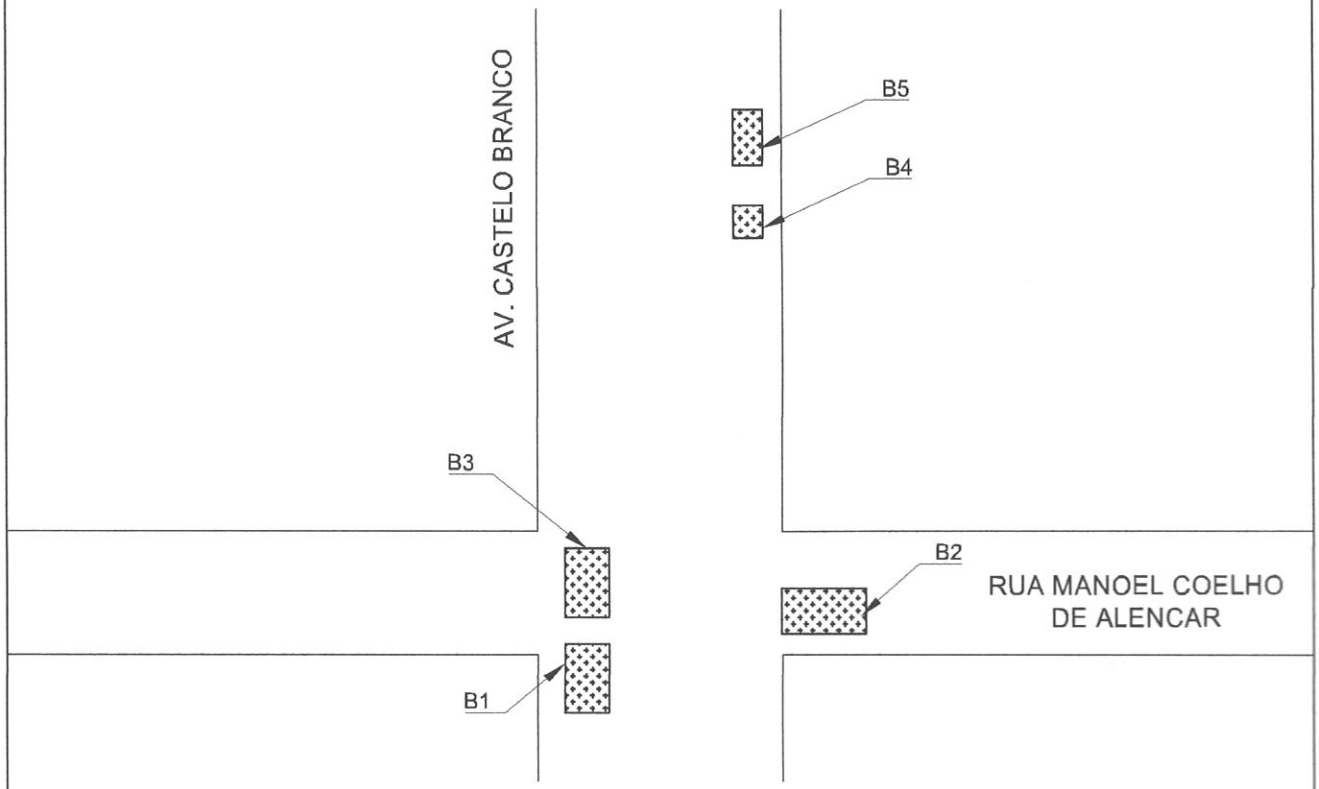

B1	2,30	X	4,50	=	10,35	X	0,08	=	0,83
B2	5,60	X	3,50	=	19,60	X	0,05	=	0,98
B3	4,00	X	2,80	=	11,20	X	0,05	=	0,56
B4	1,20	X	1,40	=	1,68	X	0,05	=	0,08
B5	2,40	X	1,50	=	3,60	X	0,08	=	0,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Aparecida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 05	**LOCALIDADE:** AV. CASTELO BRANCO	**BAIRRO:** BETOLÂNDIA	**PRANCHA:** 1/15
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 469024 **LAT.:** 9200688
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 02/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

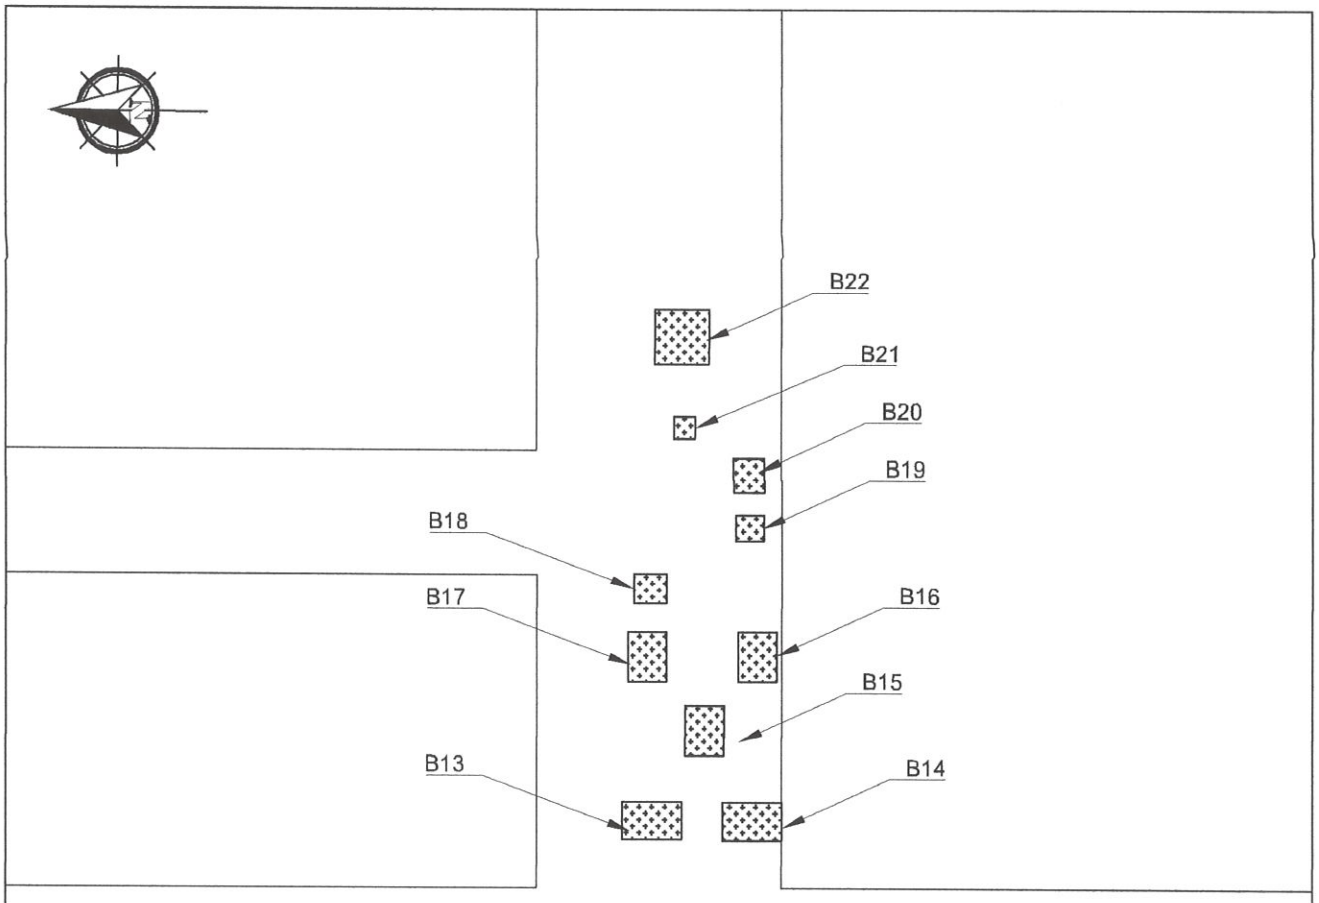

B1-A	1,20	X	1,20	=	1,44	X	0,05	=	0,07
B2-A	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,05	=	0,13
B3-A	1,60	X	1,50	=	2,40	X	0,05	=	0,12
B4-A	1,50	X	1,10	=	1,65	X	0,05	=	0,08
B5-A	1,70	X	1,70	=	2,89	X	0,05	=	0,14
B6	3,00	X	1,10	=	3,30	X	0,05	=	0,17
B7	1,90	X	1,10	=	2,09	X	0,05	=	0,10
B8	1,90	X	1,30	=	2,47	X	0,05	=	0,12
B9	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
B10	1,80	X	1,30	=	2,34	X	0,05	=	0,12
B11	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
B12	4,00	X	2,50	=	10,00	X	0,05	=	0,50
B13	2,00	X	1,60	=	3,20	X	0,05	=	0,16
B14	2,20	X	1,70	=	3,74	X	0,05	=	0,19
B15	2,30	X	1,40	=	3,22	X	0,05	=	0,16
B16	2,00	X	1,40	=	2,80	X	0,05	=	0,14
B17	2,30	X	1,60	=	3,68	X	0,05	=	0,18
B18	1,50	X	1,20	=	1,80	X	0,05	=	0,09
B19	1,40	X	1,40	=	1,96	X	0,05	=	0,10
B20	1,90	X	1,50	=	2,85	X	0,05	=	0,14
B21	0,80	X	0,80	=	0,64	X	0,05	=	0,03
B22	2,50	X	2,40	=	6,00	X	0,08	=	0,48

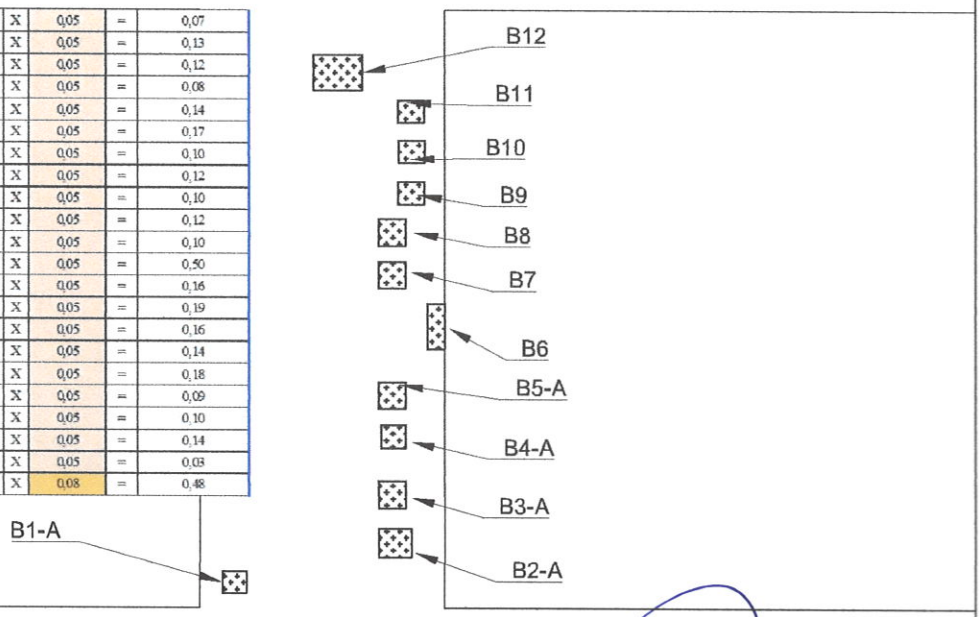

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 05	**LOCALIDADE:** AV. CASTELO BRANCO	**BAIRRO:** SANTA TEREZA	**PRANCHA:** 2/15
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 464067 **LAT.:** 9201655
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 05/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

B23	1,20	X	1,40	=	1,68	X	0,05	=	0,08
B24	1,70	X	1,90	=	3,23	X	0,05	=	0,16
B25	1,70	X	1,70	=	2,89	X	0,05	=	0,14
B26	1,40	X	1,00	=	1,40	X	0,05	=	0,07
B27	1,10	X	0,80	=	0,88	X	0,05	=	0,04
B28	1,60	X	1,50	=	2,40	X	0,05	=	0,12

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 46879/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 05	**LOCALIDADE:** AV. CASTELO BRANCO	**BAIRRO:** TIRADENTES	**PRANCHA:** 3/15
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 466864 **LAT.:** 9200973
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 09/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

B29	1,80	X	1,80	=	3,24	X	0,05	=	0,16
B30	5,10	X	2,70	=	13,77	X	0,08	=	1,10
B31	3,10	X	1,40	=	4,34	X	0,08	=	0,35
B32	0,80	X	0,50	=	0,40	X	0,05	=	0,02
B33	2,10	X	1,80	=	3,78	X	0,05	=	0,19
B34	1,00	X	0,60	=	0,60	X	0,05	=	0,03
B35	2,80	X	1,80	=	5,04	X	0,08	=	0,40
B36	4,60	X	2,50	=	11,50	X	0,08	=	0,92
B37	0,60	X	0,60	=	0,36	X	0,05	=	0,02
B38	1,80	X	1,60	=	2,88	X	0,05	=	0,14
B39	1,90	X	1,60	=	3,04	X	0,05	=	0,15
B40	0,50	X	0,50	=	0,25	X	0,05	=	0,01
B41	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05
B42	1,40	X	1,60	=	2,24	X	0,05	=	0,11

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 05	**LOCALIDADE:** AV. CASTELO BRANCO	**BAIRRO:** SANTA TEREZA	**PRANCHA:** 4/15
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** LONG.: 465043 LAT.: 9201578
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 16/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

B43	1,90	X	0,70	=	1,33	X	0,05	=	0,07
B44	0,60	X	0,50	=	0,30	X	0,05	=	0,02
B45	1,80	X	1,10	=	1,98	X	0,05	=	0,10
B46	2,50	X	1,20	=	3,00	X	0,05	=	0,15
B47	2,60	X	1,60	=	4,16	X	0,08	=	0,33

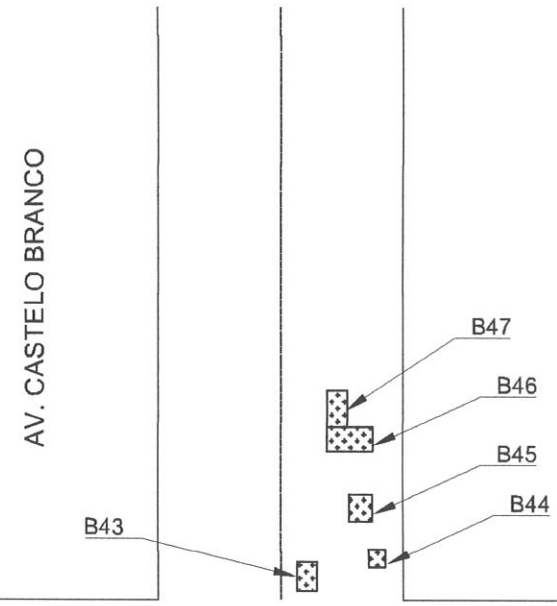

RUA DA PAZ

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 05	**LOCALIDADE:** AV. CASTELO BRANCO	**BAIRRO:** SANTA TEREZA	**PRANCHA:** 5/15
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO		**COORDENADAS UTM**	
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 16/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	**LONG.:** 465274 **LAT.:** 9201507

AV. AILTON GOMES

B65

B64

B63

B62

B61

B60

B59

B58

AV. PARAÍBA

B48	2,40	X	0,40	=	0,96	X	0,08	=	0,08
B49	1,50	X	2,40	=	3,60	X	0,08	=	0,29
B50	1,80	X	1,50	=	2,70	X	0,08	=	0,22
B51	2,10	X	2,10	=	4,41	X	0,05	=	0,22
B52	2,30	X	1,40	=	3,22	X	0,05	=	0,16
B53	1,80	X	1,50	=	2,70	X	0,05	=	0,14
B54	2,10	X	1,50	=	3,15	X	0,05	=	0,16
B55	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06
B56	2,30	X	1,60	=	3,68	X	0,05	=	0,18
B57	2,00	X	1,60	=	3,20	X	0,05	=	0,16
B58	1,10	X	1,20	=	1,32	X	0,05	=	0,07
B59	2,50	X	0,90	=	2,25	X	0,05	=	0,11
B60	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,05	=	0,13
B61	1,70	X	1,60	=	2,72	X	0,05	=	0,14
B62	1,10	X	0,90	=	0,99	X	0,05	=	0,05
B63	6,80	X	1,30	=	8,84	X	0,08	=	0,71
B64	1,40	X	1,10	=	1,54	X	0,05	=	0,08
B65	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10

B57

B56

B55

B54

B53

B52

B51

RUA JOAQUIM DA ROCHA

B50

B49

B48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 05	**LOCALIDADE:** AV. CASTELO BRANCO	**BAIRRO:** BETOLÂNDIA	**PRANCHA:** 6/15
SERVIÇO EXECUTADO:			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465303 **LAT.:** 9201493
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:**	**RESP. DESENHO:** 17/03/2026	

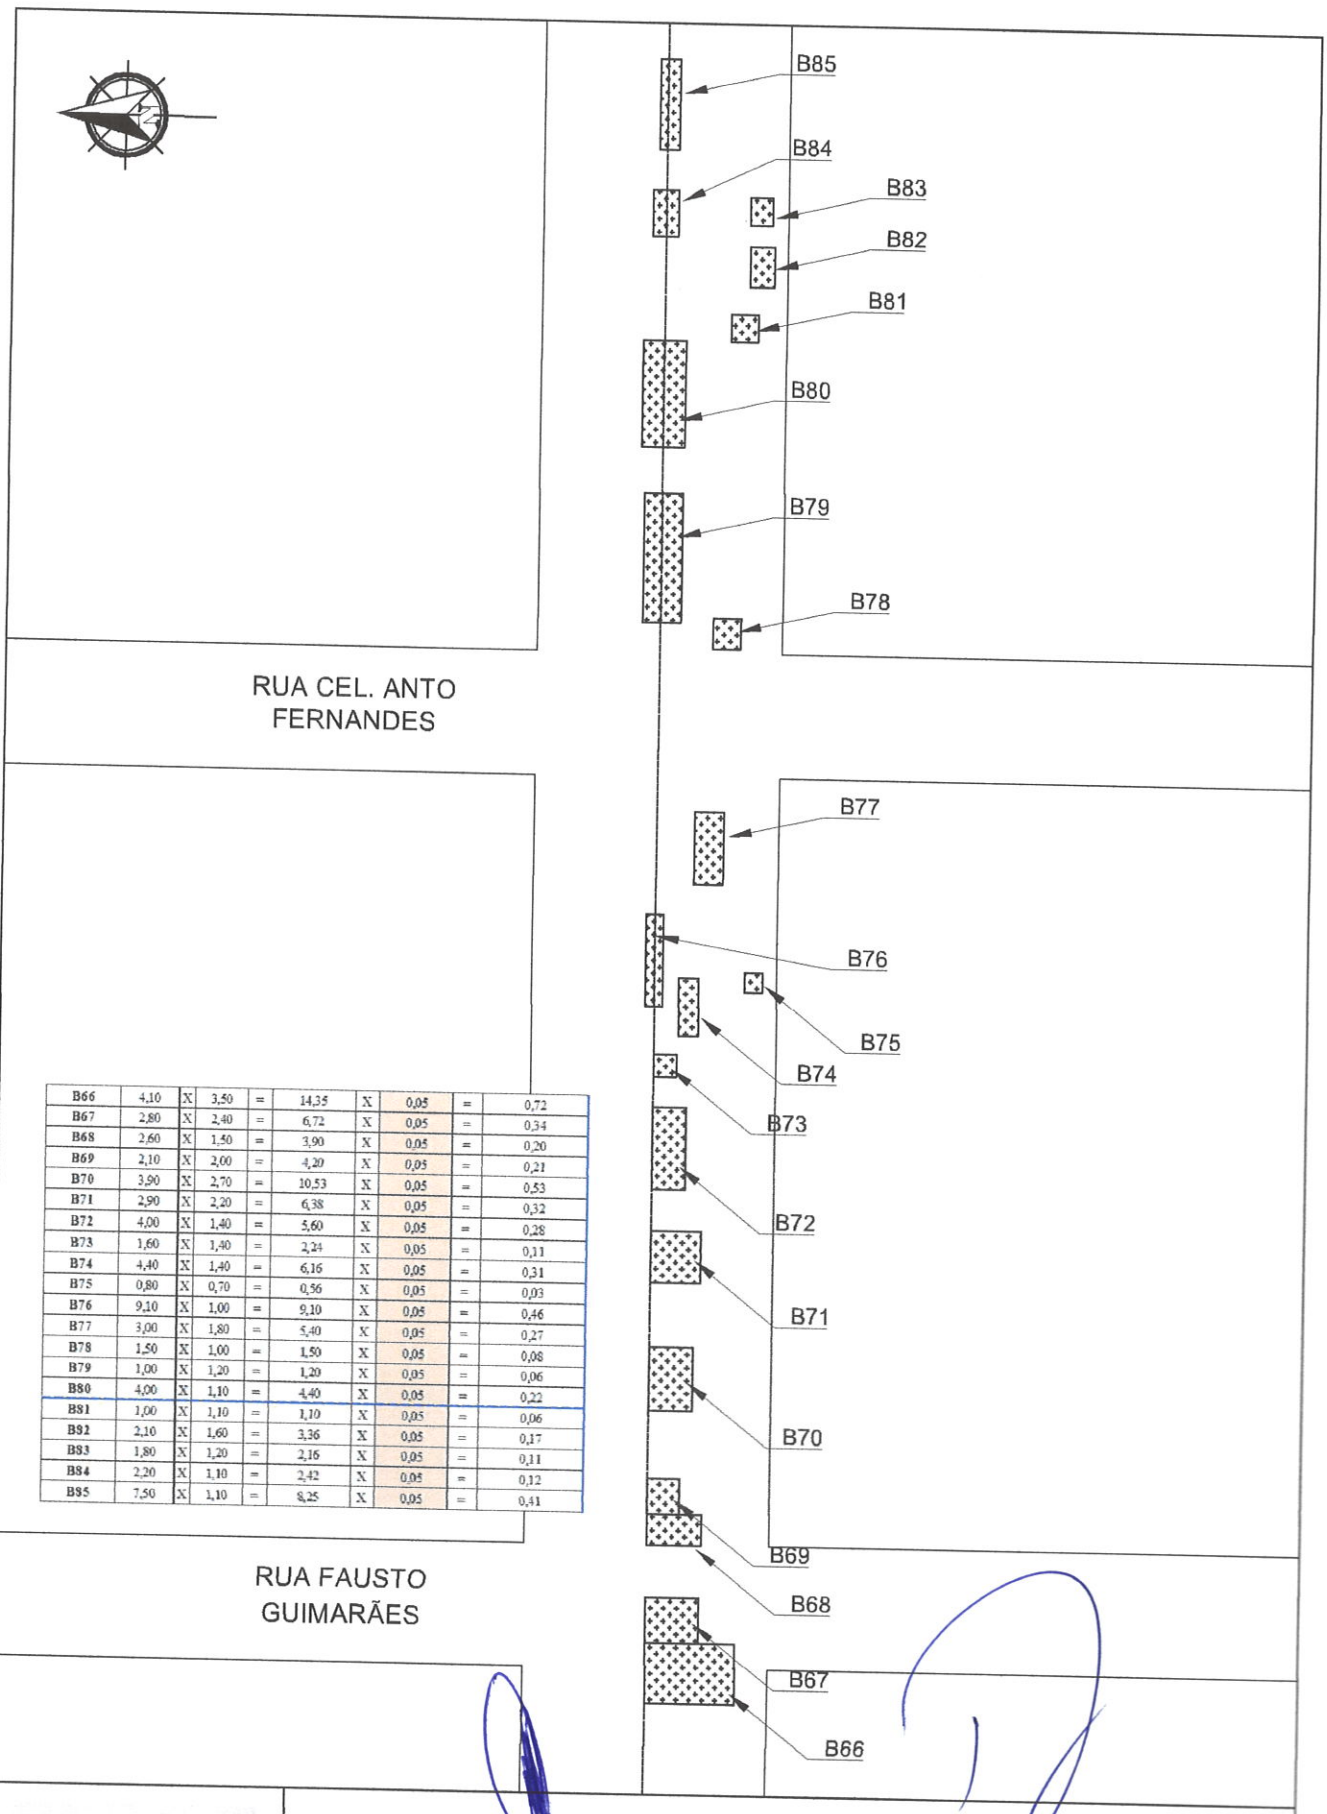

B66	4,10	X	3,50	=	14,35	X	0,05	=	0,72
B67	2,80	X	2,40	=	6,72	X	0,05	=	0,34
B68	2,60	X	1,50	=	3,90	X	0,05	=	0,20
B69	2,10	X	2,00	=	4,20	X	0,05	=	0,21
B70	3,90	X	2,70	=	10,53	X	0,05	=	0,53
B71	2,90	X	2,20	=	6,38	X	0,05	=	0,32
B72	4,00	X	1,40	=	5,60	X	0,05	=	0,28
B73	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,05	=	0,11
B74	4,40	X	1,40	=	6,16	X	0,05	=	0,31
B75	0,80	X	0,70	=	0,56	X	0,05	=	0,03
B76	9,10	X	1,00	=	9,10	X	0,05	=	0,46
B77	3,00	X	1,80	=	5,40	X	0,05	=	0,27
B78	1,50	X	1,00	=	1,50	X	0,05	=	0,08
B79	1,00	X	1,20	=	1,20	X	0,05	=	0,06
B80	4,00	X	1,10	=	4,40	X	0,05	=	0,22
B81	1,00	X	1,10	=	1,10	X	0,05	=	0,06
B82	2,10	X	1,60	=	3,36	X	0,05	=	0,17
B83	1,80	X	1,20	=	2,16	X	0,05	=	0,11
B84	2,20	X	1,10	=	2,42	X	0,05	=	0,12
B85	7,50	X	1,10	=	8,25	X	0,05	=	0,41

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes G. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 05	**LOCALIDADE:** AV. CASTELO BRANCO	**BAIRRO:** PIRAJÁ	**PRANCHA:** 7/15
SERVIÇO EXECUTADO:			**COORDENADAS UTM** LONG.: 465529 LAT.: 9201430
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:**	**RESP. DESENHO:** 17/03/2026	



RUA DO LIMOEIRO

B86	4,40	X	1,10	=	4,84	X	0,03	=	0,15
B87	3,30	X	1,40	=	4,62	X	0,03	=	0,14
B88	2,40	X	1,10	=	2,64	X	0,03	=	0,08
B89	1,60	X	1,10	=	1,76	X	0,03	=	0,05
B90	1,00	X	0,80	=	0,80	X	0,03	=	0,02
B91	0,90	X	1,80	=	1,62	X	0,03	=	0,05
B92	0,90	X	1,80	=	1,62	X	0,03	=	0,05
B93	6,80	X	1,50	=	10,20	X	0,03	=	0,31
B94	2,10	X	1,50	=	3,15	X	0,03	=	0,09
B95	2,20	X	0,70	=	1,54	X	0,03	=	0,05
B96	0,60	X	0,70	=	0,42	X	0,03	=	0,01
B97	3,00	X	1,00	=	3,00	X	0,03	=	0,09
B98	2,60	X	1,10	=	2,86	X	0,03	=	0,09
B99	4,80	X	0,90	=	4,32	X	0,03	=	0,13
B100	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,03	=	0,08
B101	1,80	X	1,10	=	1,98	X	0,03	=	0,06

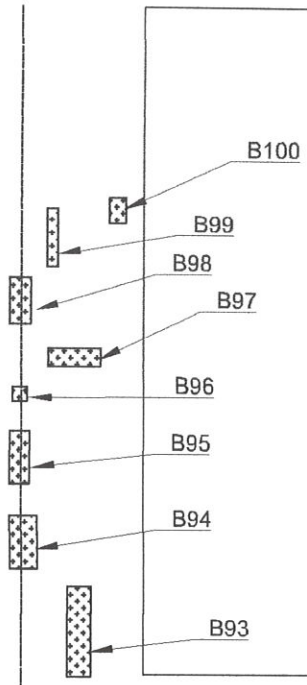

RUA SANTA ISABEL

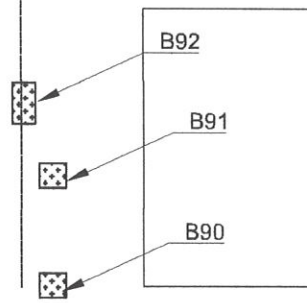

RUA VER. JOSÉ
XAVIER DE OLIVEIRA

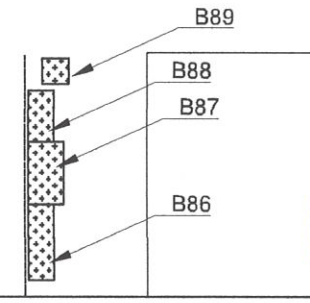

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 05	**LOCALIDADE:** AV. CASTELO BRANCO	**BAIRRO:** LIMOEIRO	**PRANCHA:** 8/15
SERVIÇO EXECUTADO:			**COORDENADAS UTM** LONG.: 465639 LAT.: 9201397
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:**	**RESP. DESENHO:** 17/03/2026	

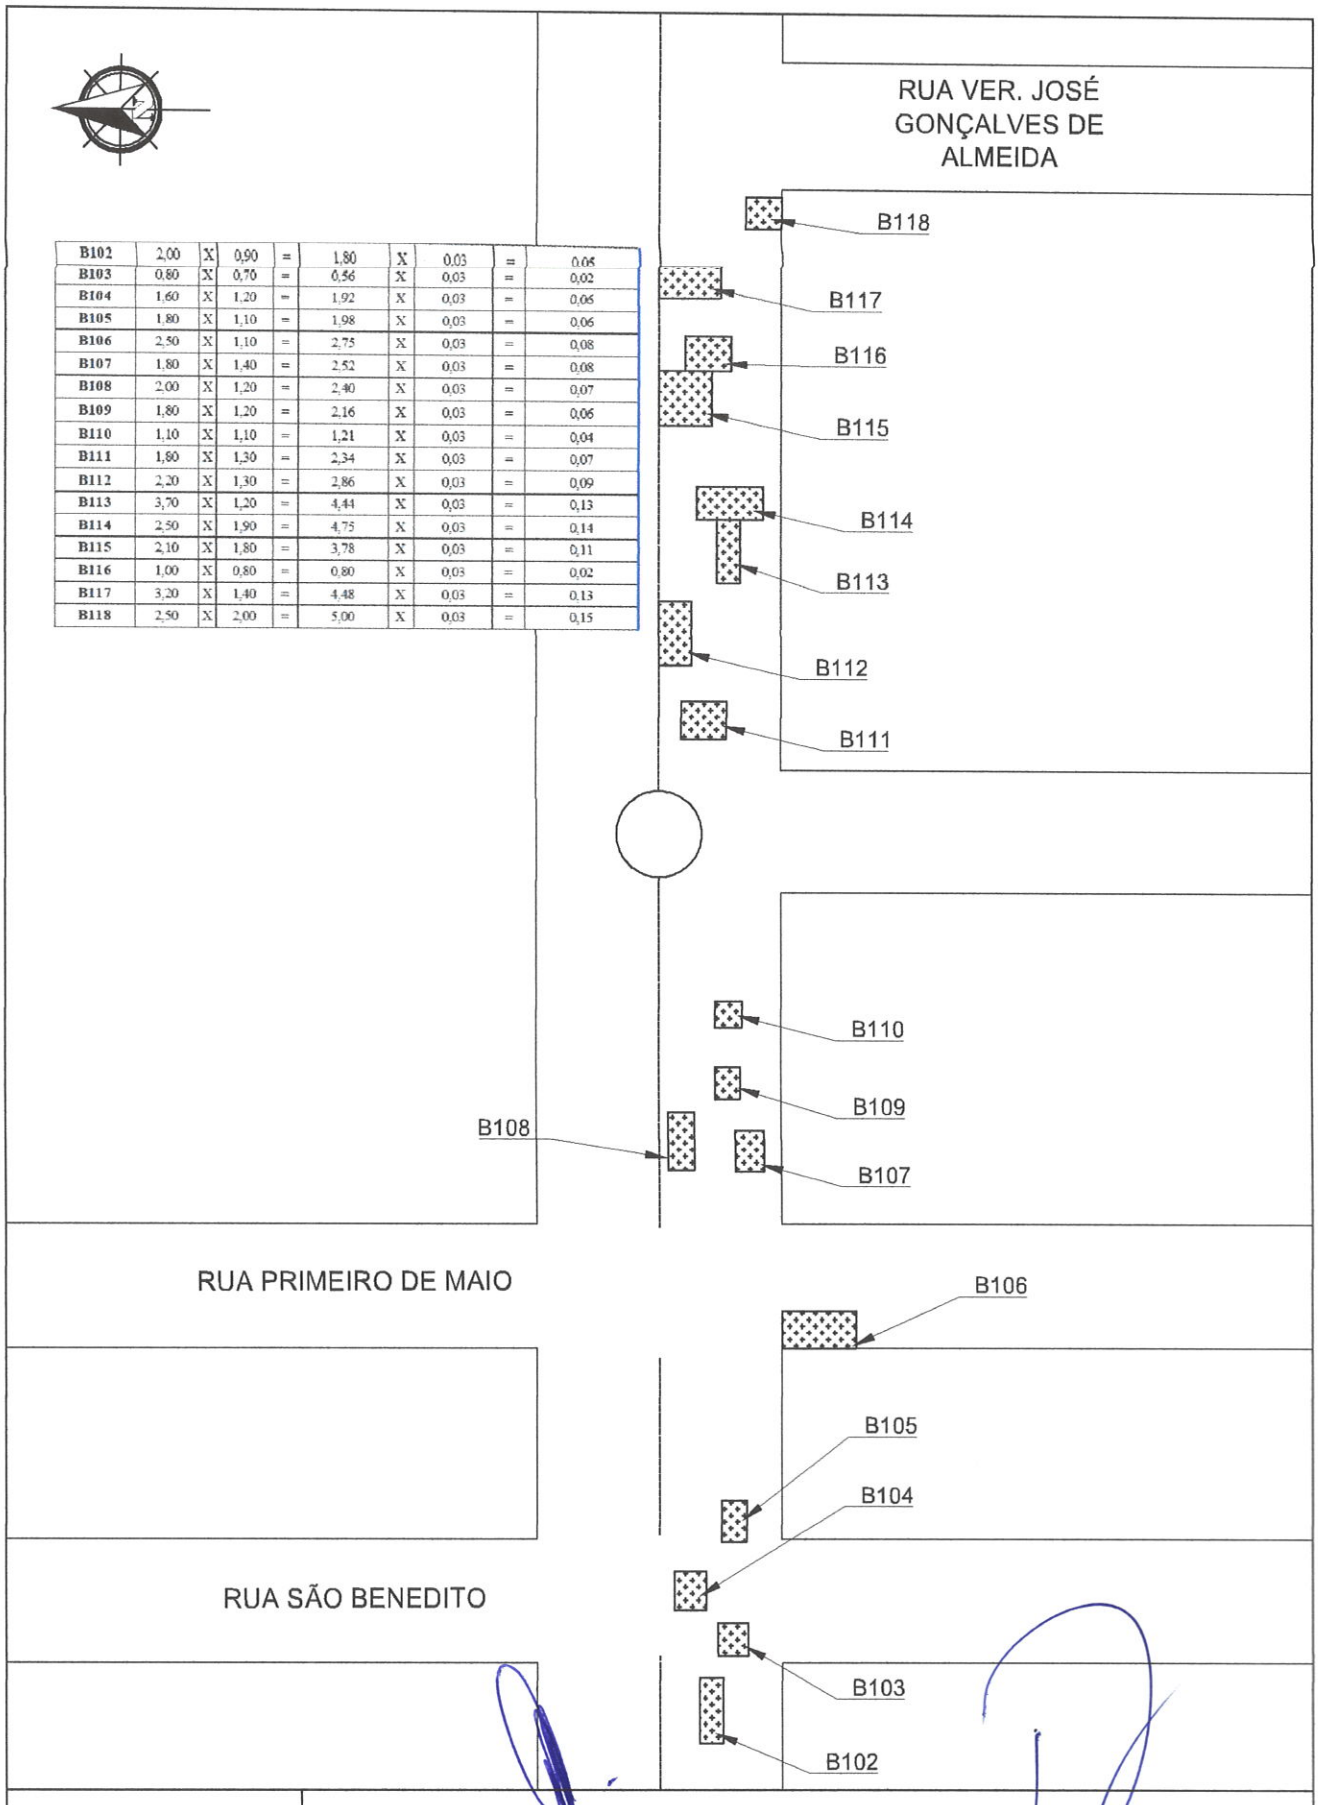

B102	2,00	X	0,90	=	1,80	X	0,03	=	0,05
B103	0,80	X	0,70	=	0,56	X	0,03	=	0,02
B104	1,60	X	1,20	=	1,92	X	0,03	=	0,06
B105	1,80	X	1,10	=	1,98	X	0,03	=	0,06
B106	2,50	X	1,10	=	2,75	X	0,03	=	0,08
B107	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,03	=	0,08
B108	2,00	X	1,20	=	2,40	X	0,03	=	0,07
B109	1,80	X	1,20	=	2,16	X	0,03	=	0,06
B110	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,03	=	0,04
B111	1,80	X	1,30	=	2,34	X	0,03	=	0,07
B112	2,20	X	1,30	=	2,86	X	0,03	=	0,09
B113	3,70	X	1,20	=	4,44	X	0,03	=	0,13
B114	2,50	X	1,90	=	4,75	X	0,03	=	0,14
B115	2,10	X	1,80	=	3,78	X	0,03	=	0,11
B116	1,00	X	0,80	=	0,80	X	0,03	=	0,02
B117	3,20	X	1,40	=	4,48	X	0,03	=	0,13
B118	2,50	X	2,00	=	5,00	X	0,03	=	0,15

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 05	**LOCALIDADE:** AV. CASTELO BRANCO	**BAIRRO:** LIMOEIRO	**PRANCHA:** 9/15
SERVIÇO EXECUTADO:			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465893 **LAT.:** 9201308
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 17/03/2026	**RESP. DESENHO:**	

B119	1,50	X	1,60	=	2,40	X	0,03	=	0,07
B120	10,30	X	1,50	=	15,45	X	0,03	=	0,46
B121	1,70	X	1,30	=	2,21	X	0,03	=	0,07
B122	2,30	X	1,50	=	3,45	X	0,03	=	0,10
B123	5,00	X	1,10	=	5,50	X	0,03	=	0,17
B124	2,00	X	1,20	=	2,40	X	0,03	=	0,07
B125	4,40	X	2,90	=	12,76	X	0,03	=	0,38
B126	2,50	X	1,20	=	3,00	X	0,03	=	0,09
B127	4,80	X	0,90	=	4,32	X	0,03	=	0,13
B128	3,10	X	1,50	=	4,65	X	0,03	=	0,14
B129	4,10	X	1,50	=	6,15	X	0,03	=	0,18

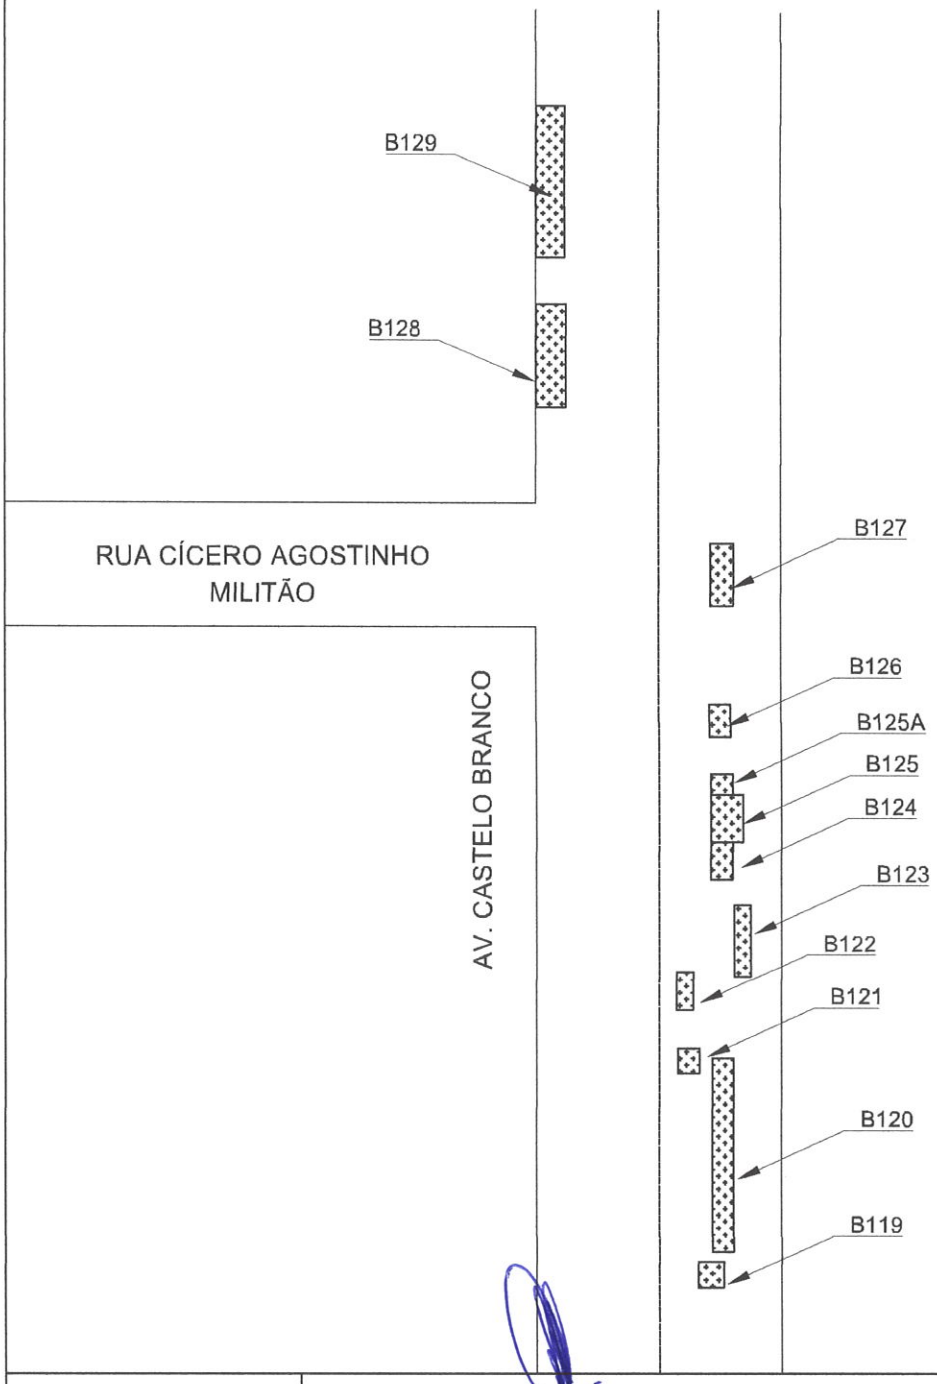

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 05	**LOCALIDADE:** AV. CASTELO BRANCO		**BAIRRO:** TIRADENTES	**PRANCHA:** 10/15
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO				**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 468329 **LAT.:** 9200738
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 17/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA		

B130	3,90	X	0,90	=	3,51	X	0,03	=	0,11
B131	1,90	X	1,10	=	2,09	X	0,03	=	0,06
B132	1,40	X	1,00	=	1,40	X	0,03	=	0,04
B133	2,60	X	1,60	=	4,16	X	0,03	=	0,12
B134	1,10	X	1,60	=	1,76	X	0,03	=	0,05
B135	0,80	X	0,80	=	0,64	X	0,03	=	0,02
B136	2,10	X	1,00	=	2,53	X	0,03	=	0,09
B137	0,80	X	0,70	=	0,56	X	0,03	=	0,02
B138	2,10	X	1,80	=	3,78	X	0,03	=	0,11

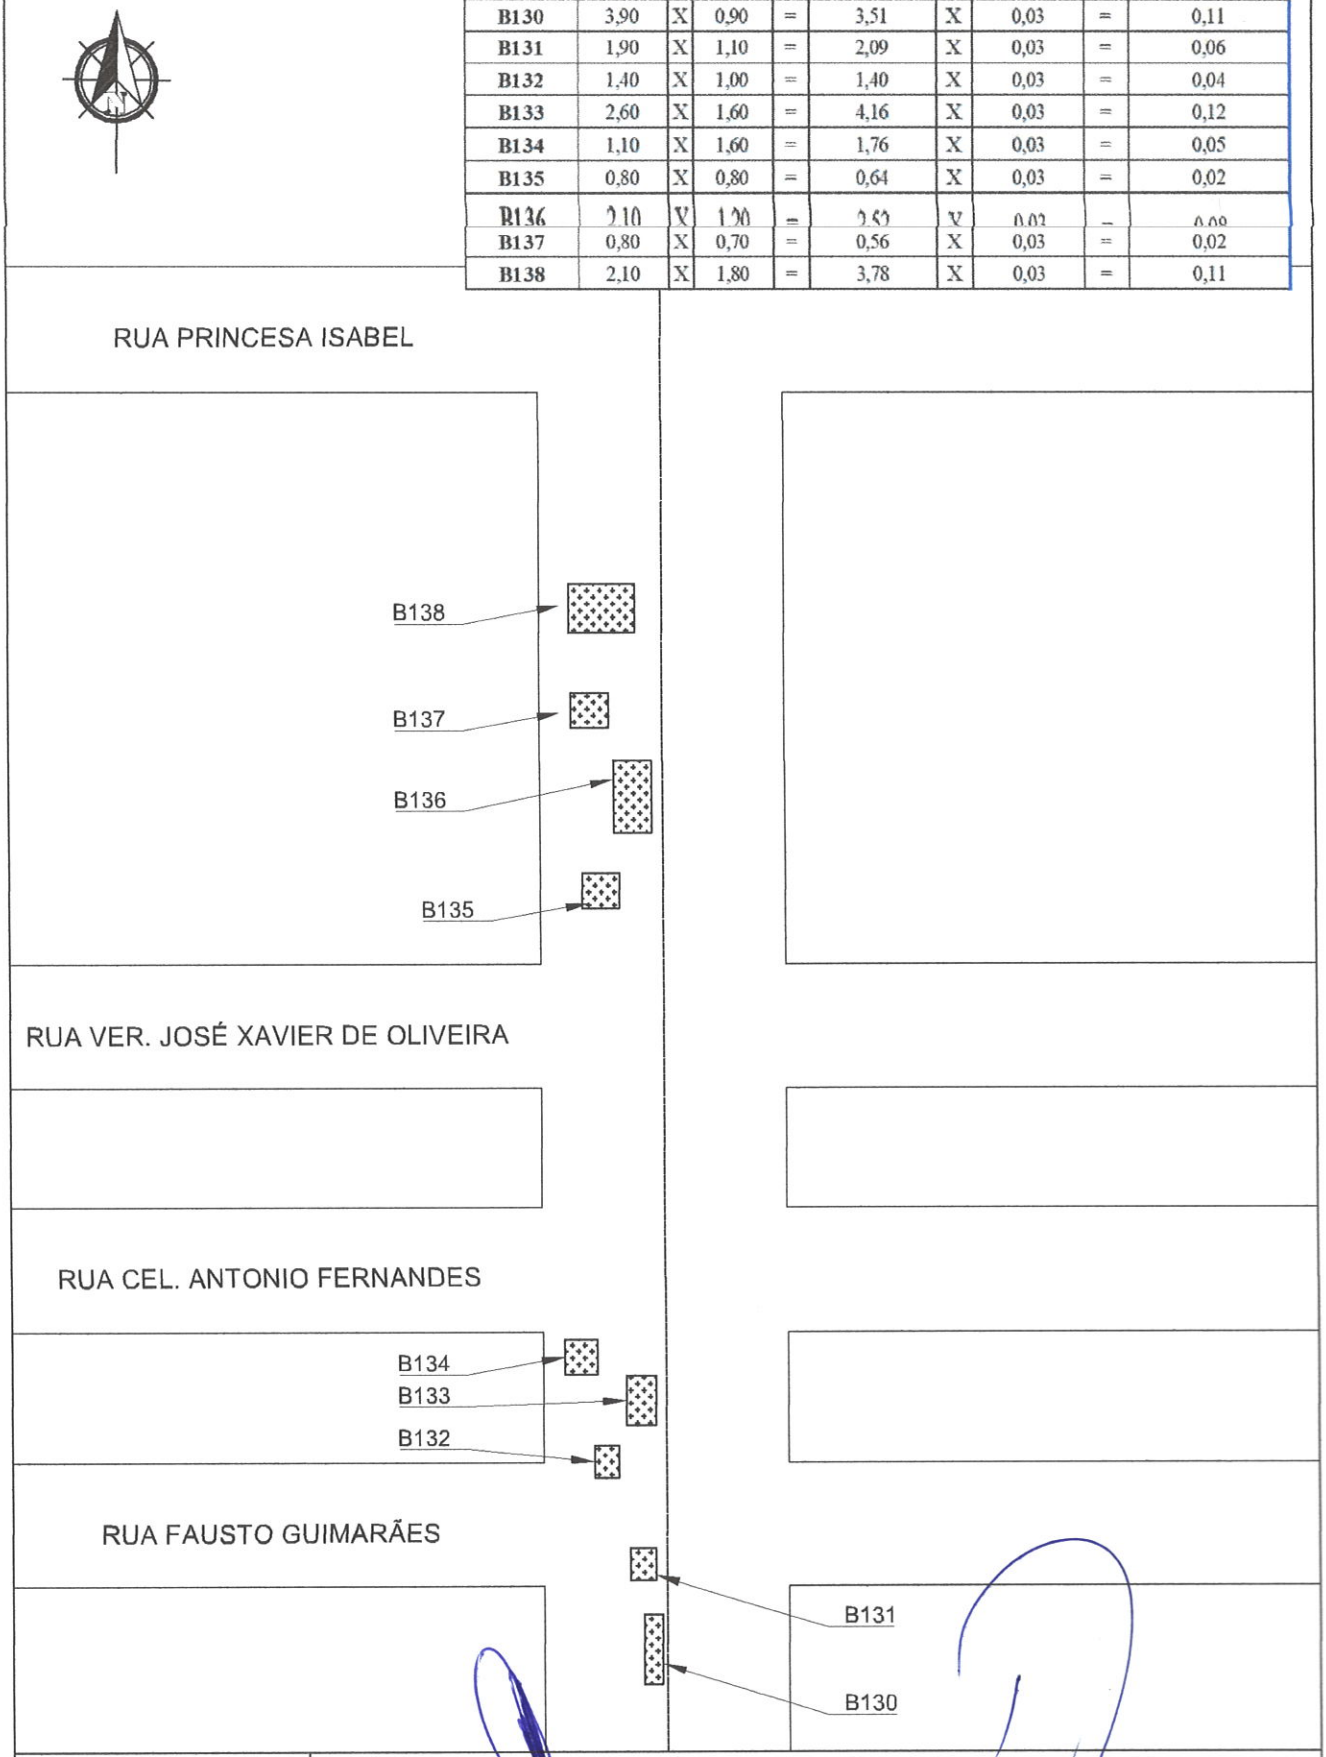

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 05	**LOCALIDADE:** AV. CASTELO BRANCO	**BAIRRO:** PIRAJÁ	**PRANCHA:** 11/15
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465507 **LAT.:** 9201439
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 17/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

B139	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,03	=	0,03
B140	1,90	X	1,60	=	3,04	X	0,03	=	0,09
B141	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,03	=	0,03
B142	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,03	=	0,07
B143	1,80	X	1,70	=	3,06	X	0,03	=	0,09

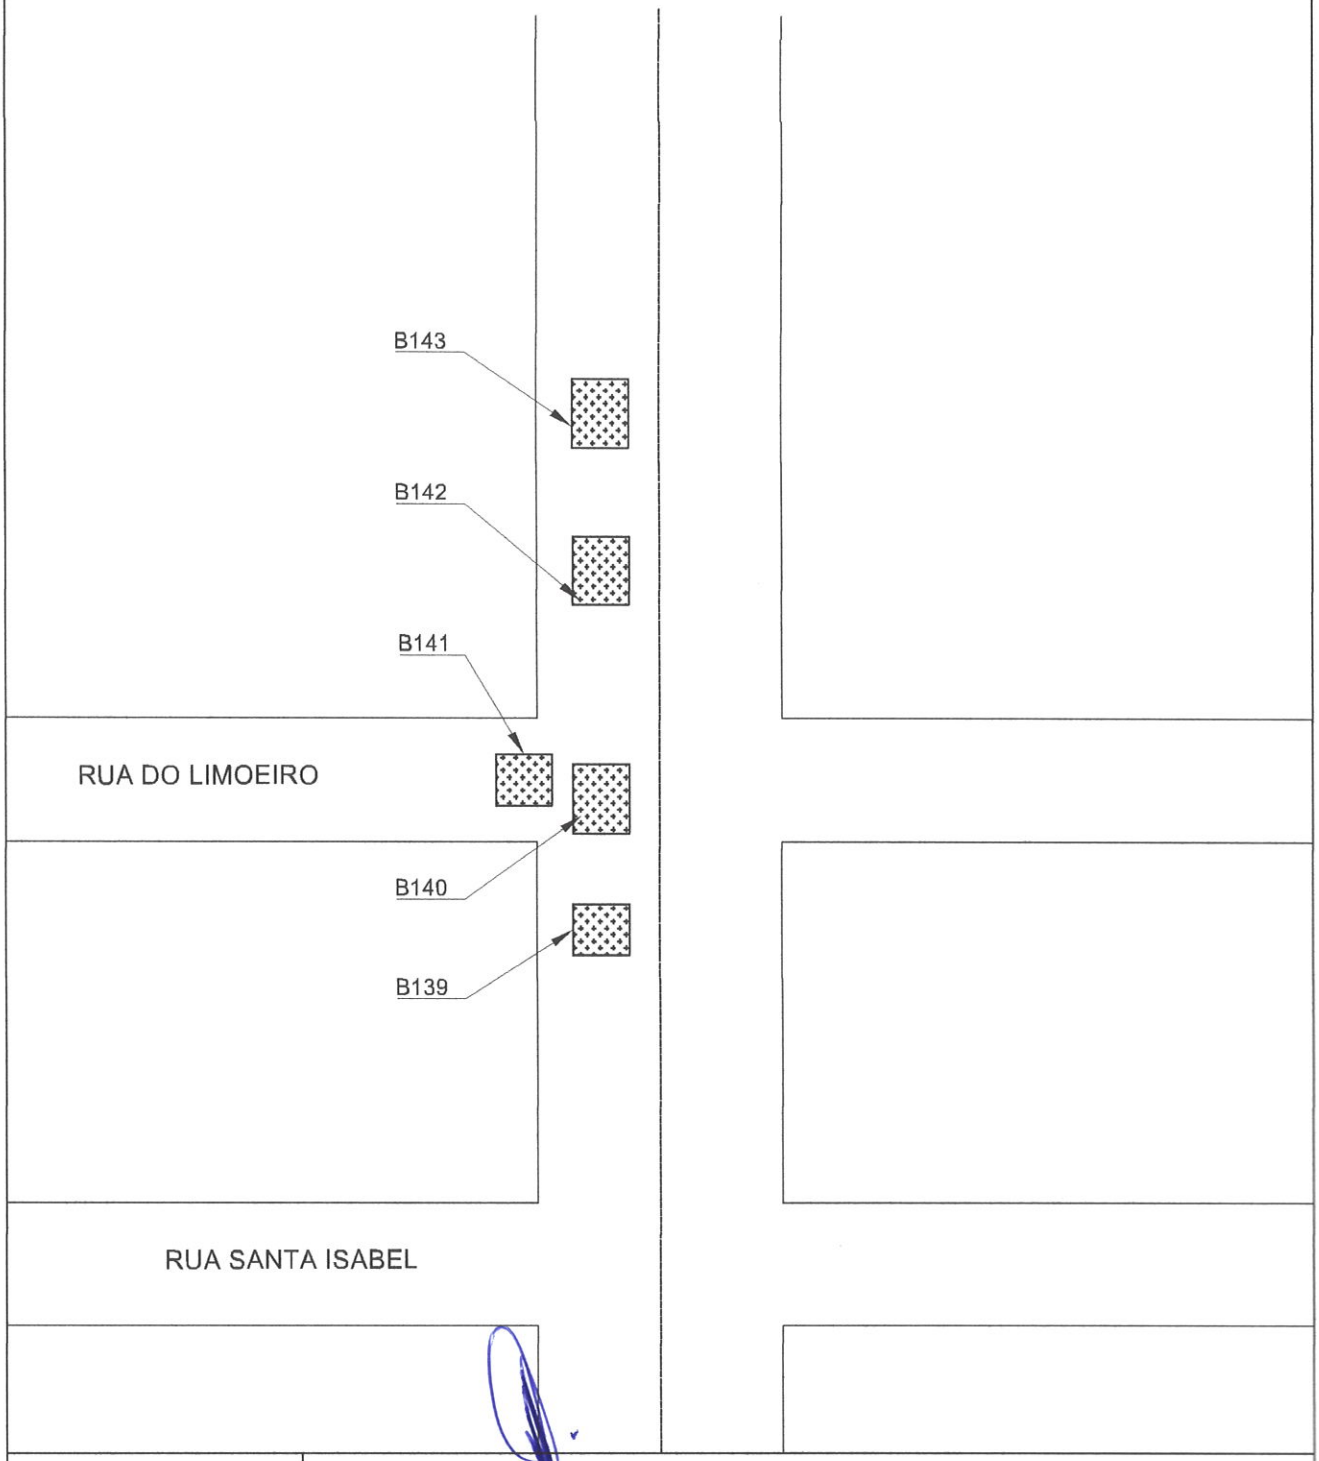

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 05	**LOCALIDADE:** AV. CASTELO BRANCO	**BAIRRO:** PIRAJÁ	**PRANCHA:** 12/15
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** LONG.: 465807 LAT.: 9201349
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 18/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

B144	3,50	X	1,40	=	4,90	X	0,03	=	0,15
B145	3,30	X	0,90	=	2,97	X	0,03	=	0,09
B146	2,60	X	1,60	=	4,16	X	0,03	=	0,12
B147	1,90	X	2,10	=	3,99	X	0,03	=	0,12
B148	0,80	X	0,80	=	0,64	X	0,03	=	0,02
B149	1,10	X	1,20	=	1,32	X	0,03	=	0,04
B150	1,00	X	0,80	=	0,80	X	0,03	=	0,03
B151	4,70	X	2,00	=	9,40	X	0,03	=	0,28

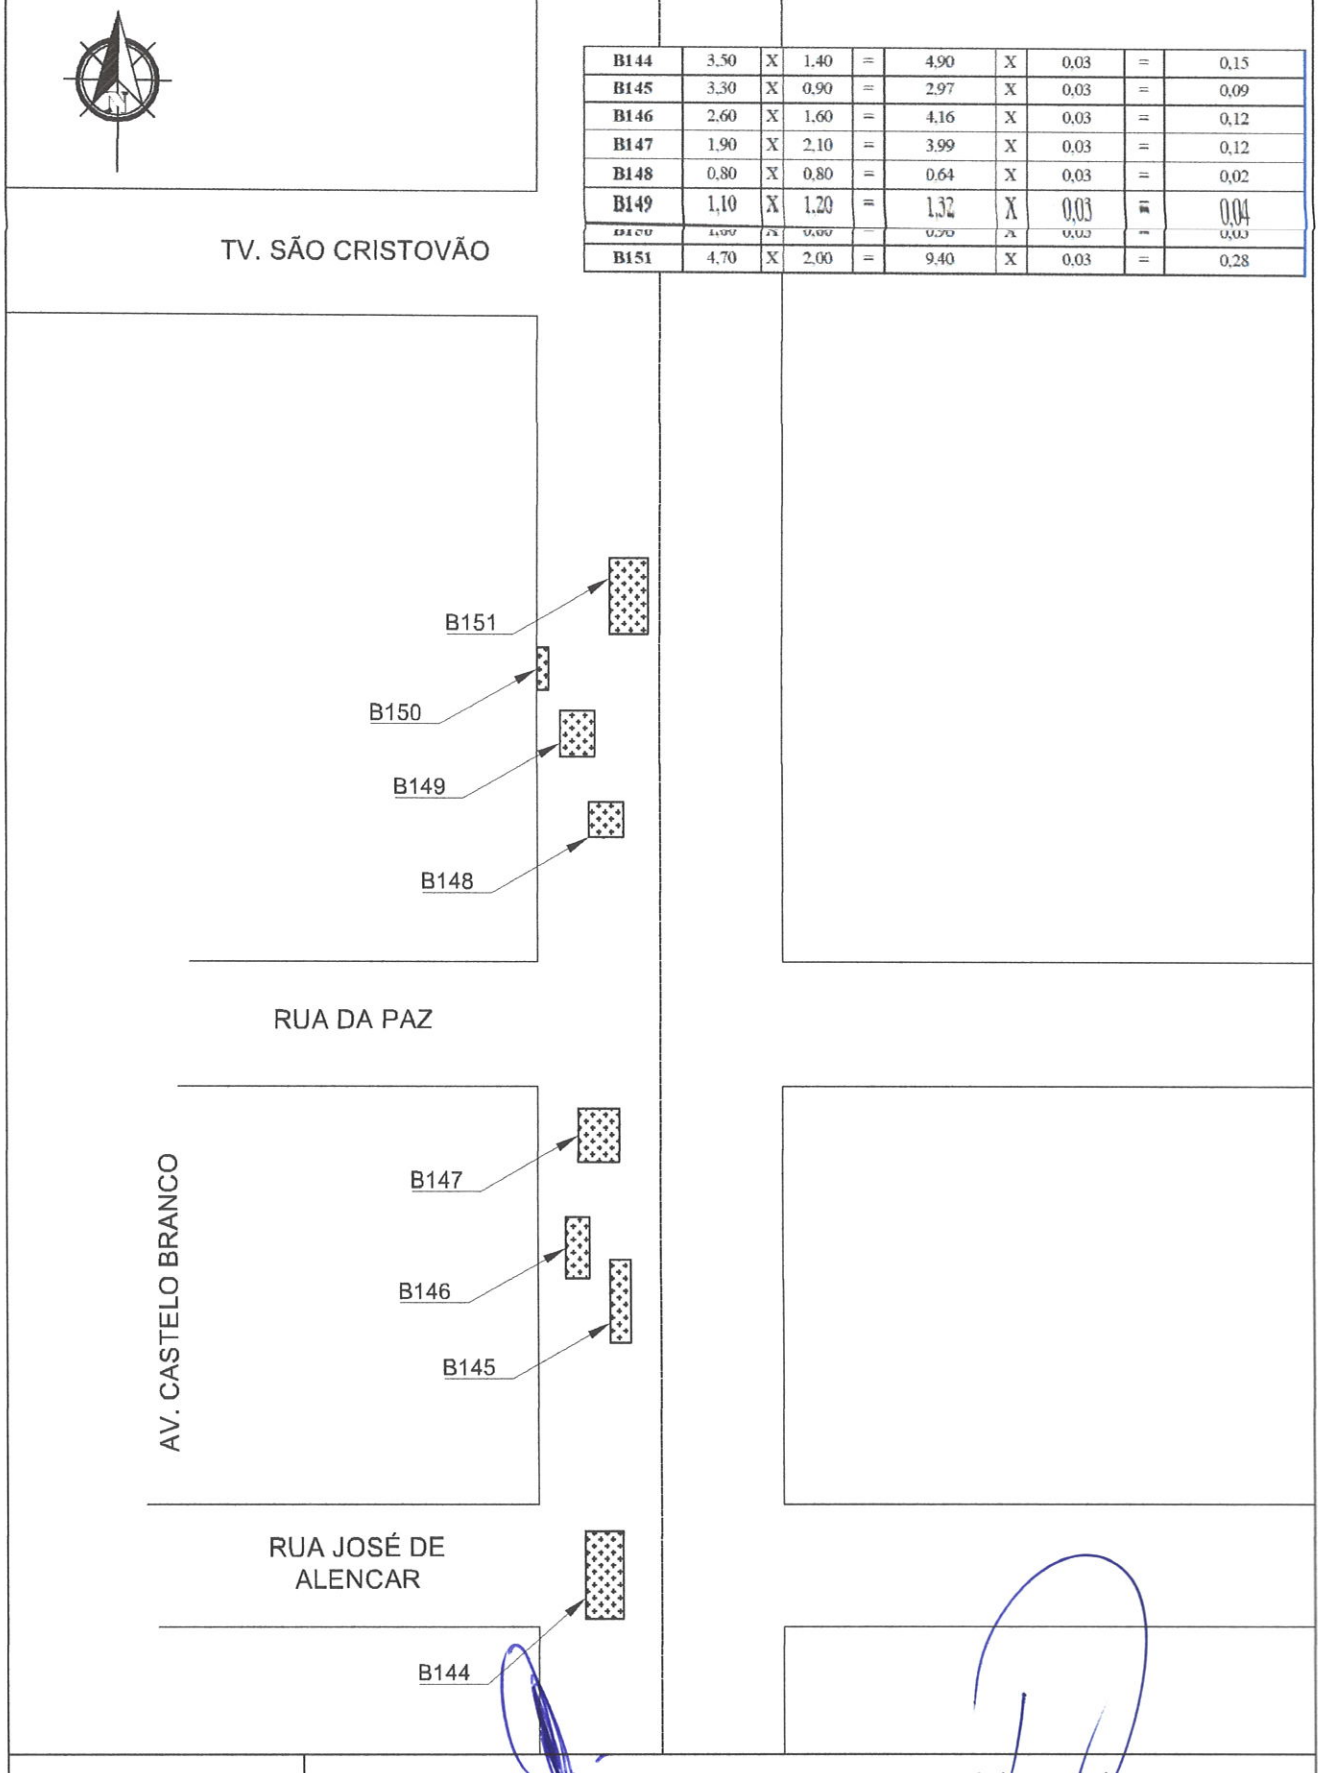

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44879/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 05	**LOCALIDADE:** AV. CASTELO BRANCO	**BAIRRO:** PIRAJÁ	**PRANCHA:** 13/15
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** LONG.: 465215 LAT.: 9201528
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 17/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

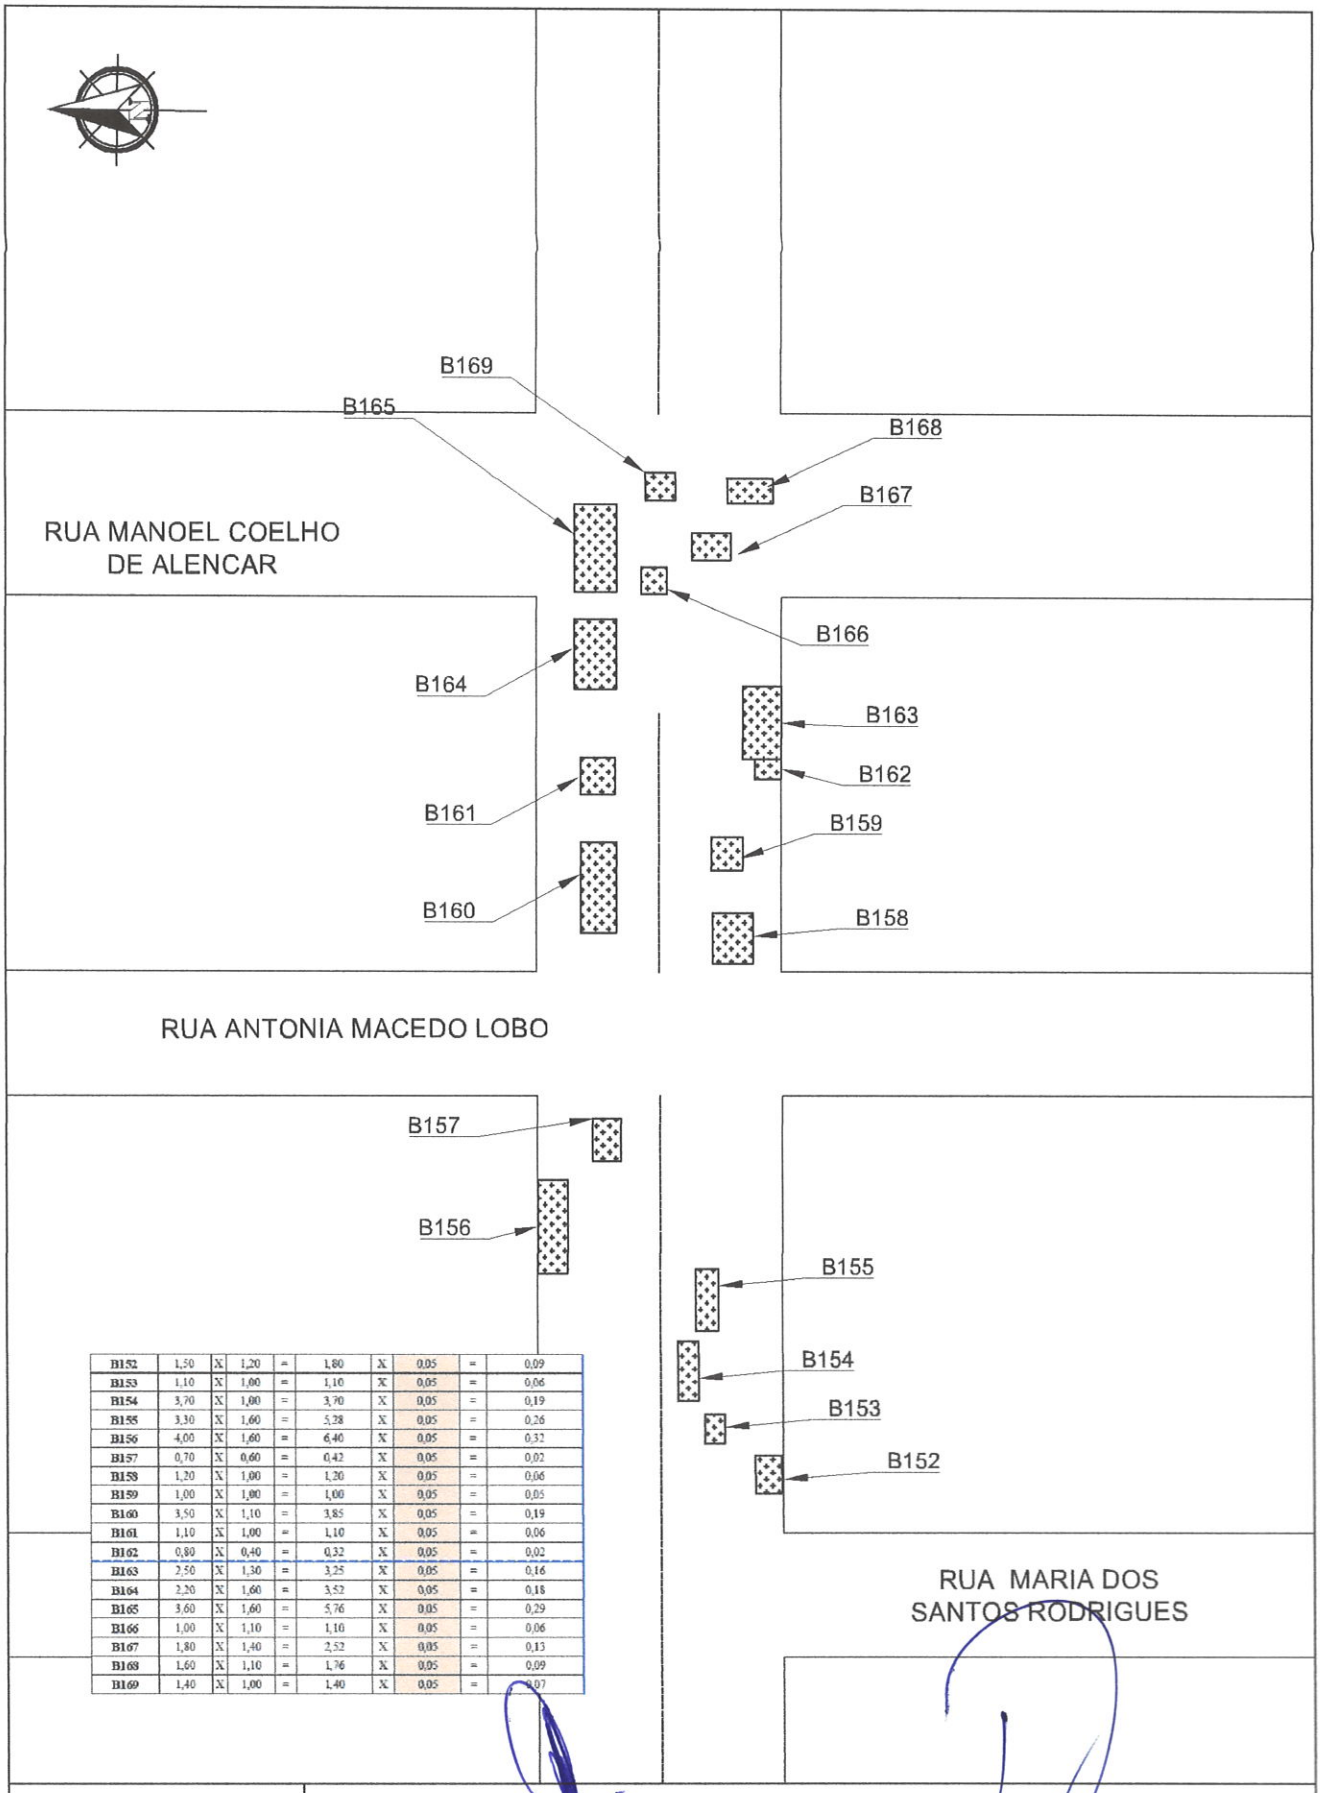

B152	1,50	X	1,20	=	1,80	X	0,05	=	0,09
B153	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06
B154	3,70	X	1,00	=	3,70	X	0,05	=	0,19
B155	3,30	X	1,60	=	5,28	X	0,05	=	0,26
B156	4,00	X	1,60	=	6,40	X	0,05	=	0,32
B157	0,70	X	0,60	=	0,42	X	0,05	=	0,02
B158	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06
B159	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05
B160	3,50	X	1,10	=	3,85	X	0,05	=	0,19
B161	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06
B162	0,80	X	0,40	=	0,32	X	0,05	=	0,02
B163	2,50	X	1,30	=	3,25	X	0,05	=	0,16
B164	2,20	X	1,60	=	3,52	X	0,05	=	0,18
B165	3,60	X	1,60	=	5,76	X	0,05	=	0,29
B166	1,00	X	1,10	=	1,10	X	0,05	=	0,06
B167	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,05	=	0,13
B168	1,60	X	1,10	=	1,76	X	0,05	=	0,09
B169	1,40	X	1,00	=	1,40	X	0,05	=	0,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 14979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 05	**LOCALIDADE:** AV. CASTELO BRANCO	**BAIRRO:** PIRAJÁ	**PRANCHA:** 14/15
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 18/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	**LONG.:** 468837 **LAT.:** 9200684

B170	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06
B171	2,60	X	1,60	=	4,16	X	0,05	=	0,21
B172	3,20	X	1,60	=	5,12	X	0,05	=	0,26
B173	1,80	X	1,50	=	2,70	X	0,05	=	0,14
B174	0,90	X	0,40	=	0,36	X	0,05	=	0,02
B175	5,20	X	3,30	=	17,16	X	0,05	=	0,86
B176	1,80	X	1,50	=	2,70	X	0,05	=	0,14
B177	0,50	X	0,40	=	0,20	X	0,05	=	0,01
B178	2,80	X	2,50	=	7,00	X	0,05	=	0,35
			ÁREA	=	**638,99**		**VOLUME**	=	**29,89**

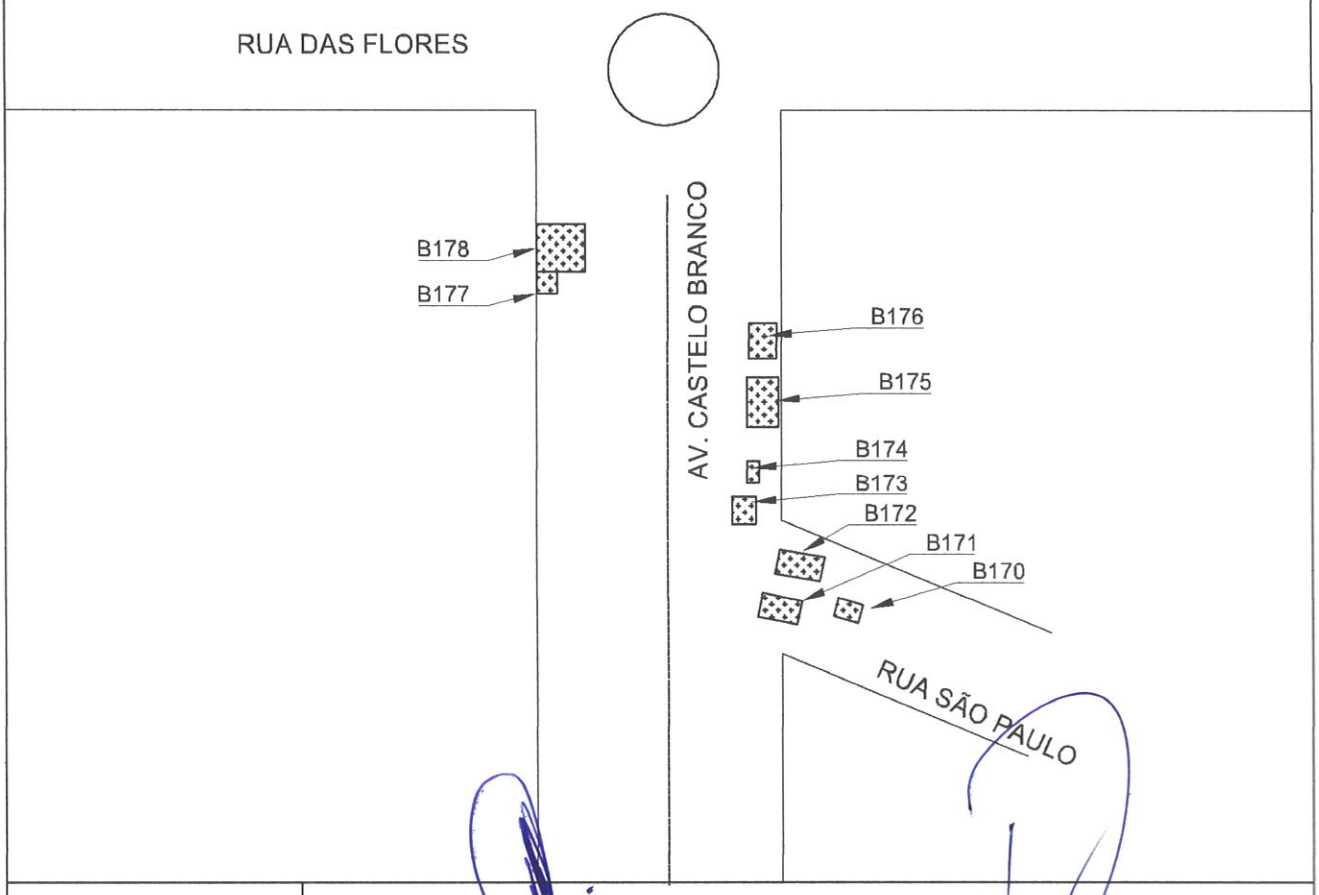

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 05	**LOCALIDADE:** AV. CASTELO BRANCO	**BAIRRO:** SANTA TEREZA	**PRANCHA:** 15/15
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 464918 **LAT.:** 9201587
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 18/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
5	AVENIDA CASTELO BRANCO	DIVERSOS

TRECHO

ENTRE A AV. PADRE CICERO E A AV. MANOEL COELHO DE ALENCAR

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	05/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	5	AVENIDA CASTELO BRANCO						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I		P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	638,99	R$	1,84	R$	1.175,74
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM						
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	29,89	R$	1.696,15	R$	50.702,51
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	638,99	R$	0,33	R$	210,86
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,26	R$	3.062,93	R$	782,88
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	4,58	R$	472,85	R$	2.164,76
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	76,63	R$	30,12	R$	2.307,96
						TOTAL	R$	57.344,71

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

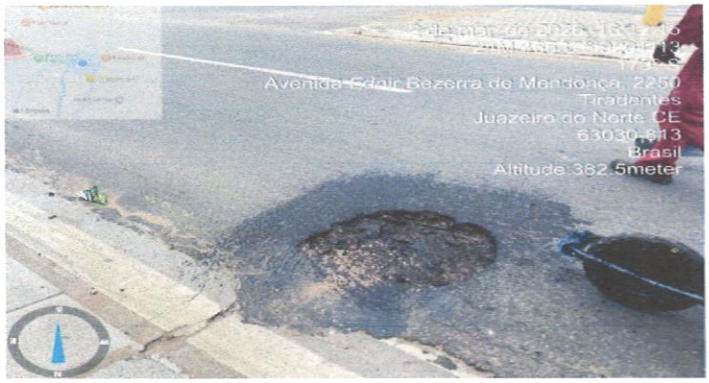

FOTO 06 - ANTES

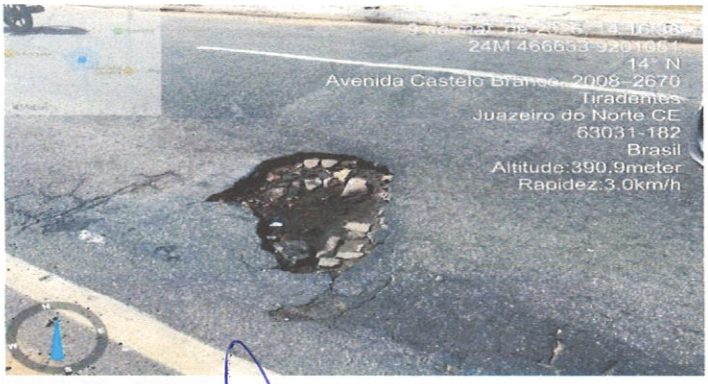

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

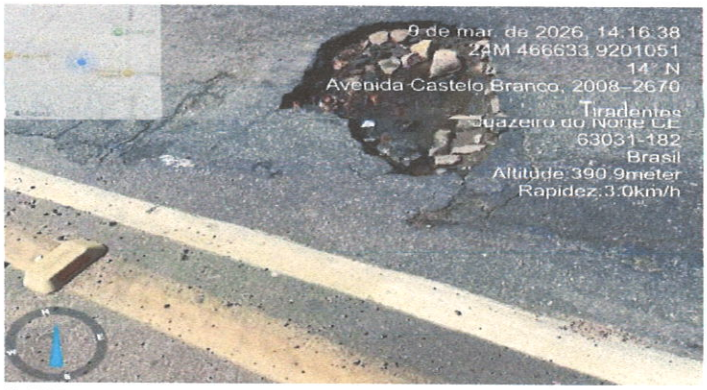

FOTO 09 - ANTES

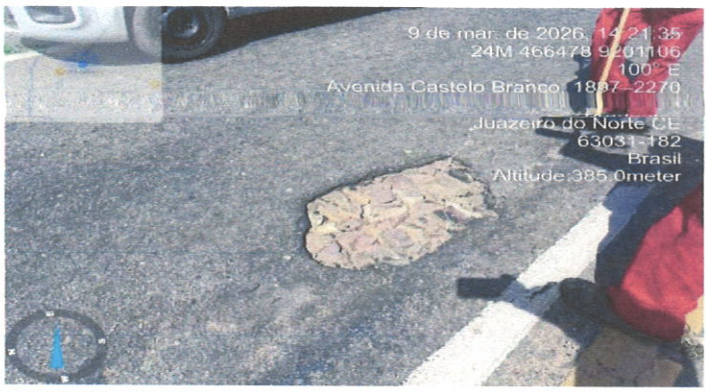

FOTO 10 - ANTES

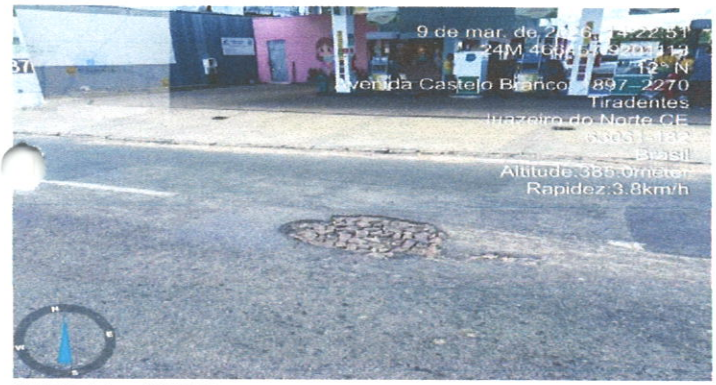

FOTO 11 - ANTES

FOTO 12 - ANTES

FOTO 13 - ANTES

FOTO 14 - ANTES

FOTO 15 - ANTES

FOTO 16 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 17 - ANTES

FOTO 18 - ANTES

FOTO 19 - ANTES

FOTO 20 - ANTES

FOTO 21 - ANTES

FOTO 22 - ANTES

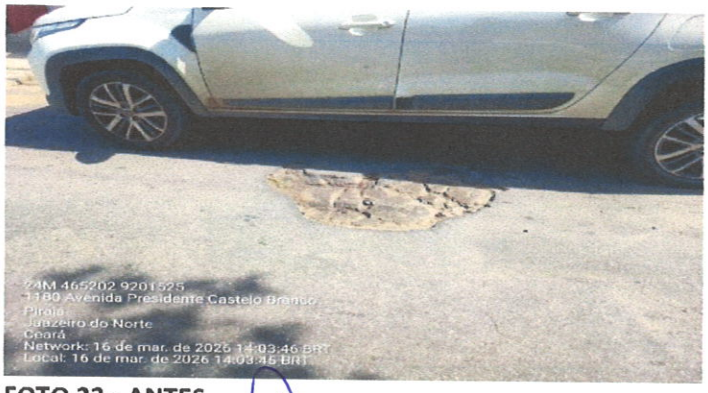

FOTO 23 - ANTES

FOTO 24 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 25 - ANTES

FOTO 26 - ANTES

FOTO 27 - ANTES

FOTO 28 - ANTES

FOTO 29 - ANTES

FOTO 30 - ANTES

FOTO 31 - ANTES

FOTO 32 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 33 - ANTES

FOTO 34 - ANTES

FOTO 35 - ANTES

FOTO 36 - ANTES

FOTO 37 - ANTES

FOTO 38 - ANTES

FOTO 39 - ANTES

FOTO 40 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

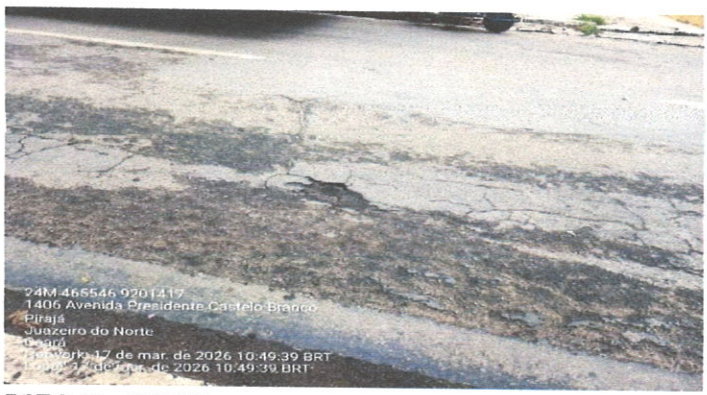

FOTO 41 - ANTES

FOTO 42 - ANTES

FOTO 43 - ANTES

FOTO 44 - ANTES

FOTO 45 - ANTES

FOTO 46 - ANTES

FOTO 47 - ANTES

FOTO 48 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 49 - ANTES

FOTO 50 - ANTES

FOTO 51 - ANTES

FOTO 52 - ANTES

FOTO 53 - ANTES

FOTO 54 - ANTES

FOTO 55 - ANTES

FOTO 56 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 57 - ANTES

FOTO 58 - ANTES

FOTO 59 - ANTES

FOTO 60 - ANTES

FOTO 61 - ANTES

FOTO 62 - ANTES

FOTO 63 - ANTES

FOTO 64 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 65 - ANTES

FOTO 66 - ANTES

FOTO 67 - ANTES

FOTO 68 - ANTES

FOTO 69 - ANTES

FOTO 70 - ANTES

FOTO 71 - ANTES

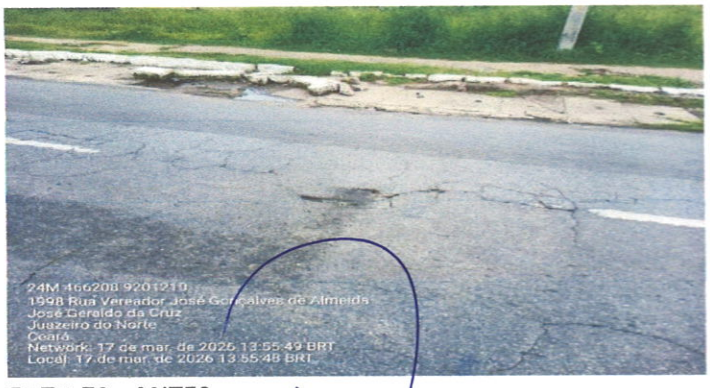

FOTO 72 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 73 - ANTES

FOTO 74 - ANTES

FOTO 75 - ANTES

FOTO 76 - ANTES

FOTO 77 - ANTES

FOTO 78 - ANTES

FOTO 79 - ANTES

FOTO 80 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 81 - ANTES

FOTO 82 - ANTES

FOTO 83 - ANTES

FOTO 84 - ANTES

FOTO 85 - ANTES

FOTO 86 - ANTES

FOTO 87 - ANTES

FOTO 88 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 89 - ANTES

FOTO 90 - ANTES

FOTO 91 - ANTES

FOTO 92 - ANTES

FOTO 93 - ANTES

FOTO 94 - ANTES

FOTO 95 - ANTES

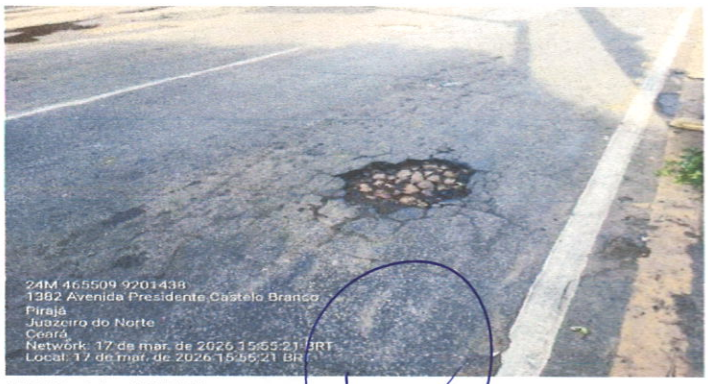

FOTO 96 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 97 - ANTES

FOTO 98 - ANTES

FOTO 99 - ANTES

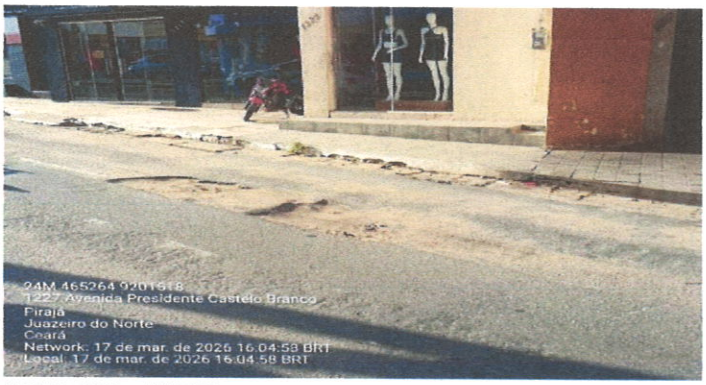

FOTO 100 - ANTES

FOTO 101 - ANTES

FOTO 102 - ANTES

FOTO 103 - ANTES

FOTO 104 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 105 - ANTES

FOTO 106 - ANTES

FOTO 107 - ANTES

FOTO 108 - ANTES

FOTO 109 - ANTES

FOTO 110 - ANTES

FOTO 111 - ANTES

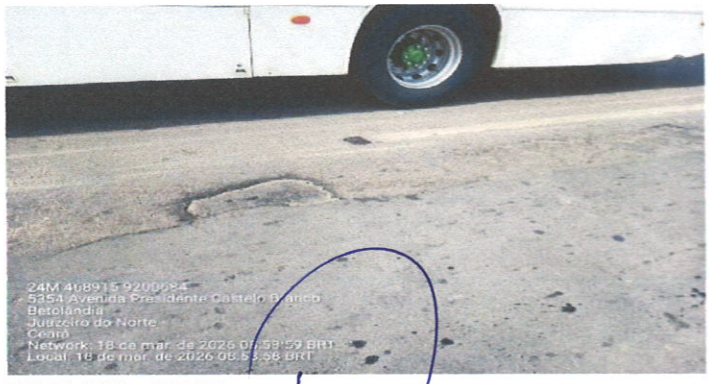

FOTO 112 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 113 - ANTES

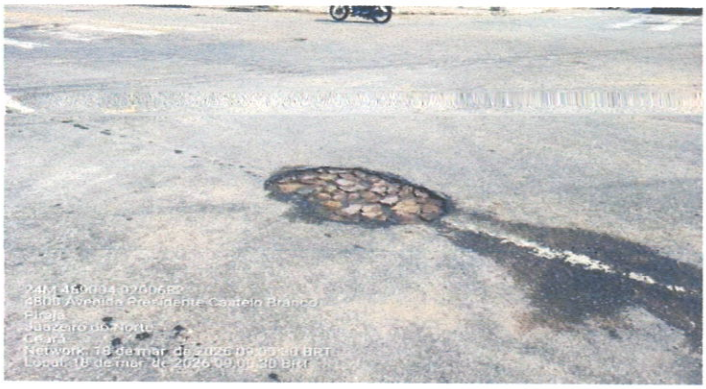

FOTO 114 - ANTES

FOTO 115 - ANTES

FOTO 116 - ANTES

FOTO 117 - ANTES

FOTO 118 - ANTES

FOTO 119 - ANTES

FOTO 120 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 121 - ANTES

FOTO 122 - ANTES

FOTO 123 - ANTES

FOTO 124 - ANTES

FOTO 125 - ANTES

FOTO 126 - ANTES

FOTO 127 - B1 E B3

FOTO 128 - B1A

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 129 - B2

FOTO 130 - B2A E B3A

FOTO 131 - B4

FOTO 132 - B4A E B5A

FOTO 133 - B5

FOTO 134 - B6

FOTO 135 - B7

FOTO 136 - B8

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 137 - B9

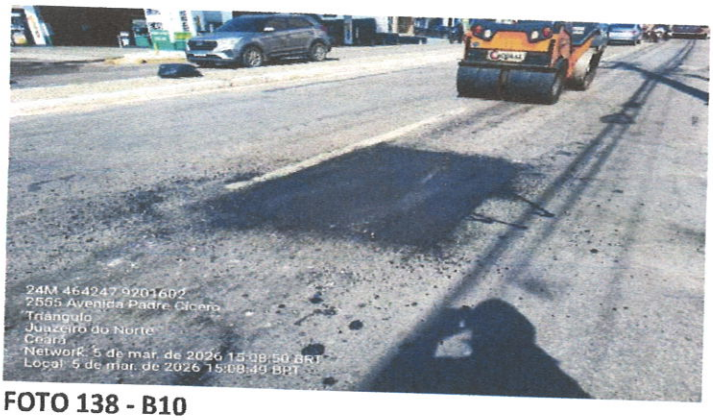

FOTO 138 - B10

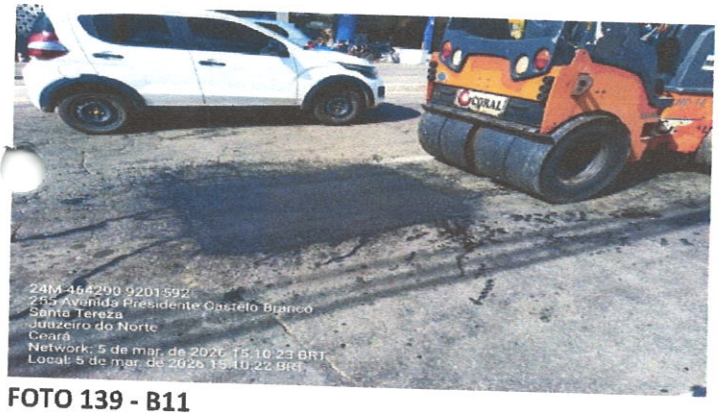

FOTO 139 - B11

FOTO 140 - B12

FOTO 141 - B13 E B14

FOTO 142 - B15 E B16

FOTO 143 - B17

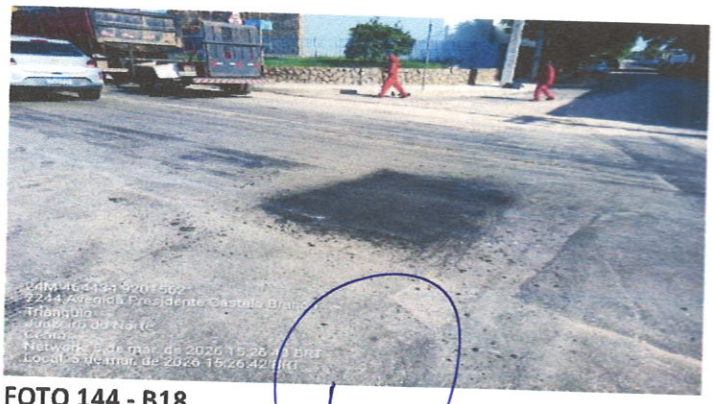

FOTO 144 - B18

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 145 - B19

FOTO 146 - B20

FOTO 147 - B21

FOTO 148 - B22

FOTO 149 - B23

FOTO 150 - B24

FOTO 151 - B25

FOTO 152 - B26

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 153 - B27

FOTO 154 - B28

FOTO 155 - B29

FOTO 156 - B30

FOTO 157 - B31 E B32

FOTO 158 - B33

FOTO 159 - B34 E B35

FOTO 160 - B36

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 161 - B37

FOTO 162 - B38

FOTO 163 - B39

FOTO 164 - B40

FOTO 165 - B41

FOTO 166 - B42

FOTO 167 - B43 E B44

FOTO 168 - B45

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 169 - B46 E B47

FOTO 170 - B48 A B50

FOTO 171 - B51

FOTO 172 - B52 E B53

FOTO 173 - B54 E B55

FOTO 174 - B56

FOTO 175 - B57

FOTO 176 - B58

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 177 - B59

FOTO 178 - B60

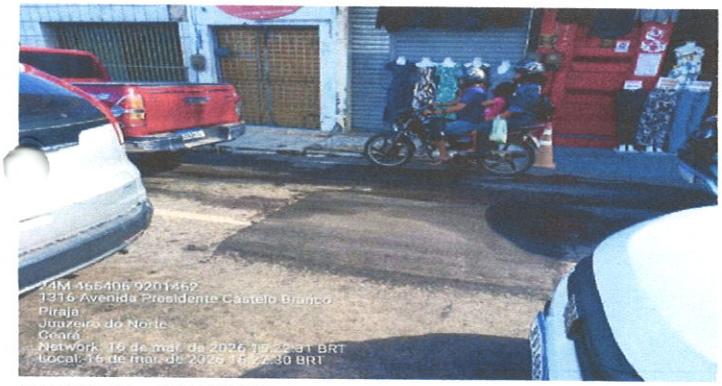

FOTO 179 - B61 E B62

FOTO 180 - B63

FOTO 181 - B64

FOTO 182 - B65

FOTO 183 - B66 E B67

FOTO 184 - B68 E B69

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 185 - B70

FOTO 186 - B71

FOTO 187 - B72

FOTO 188 - B73

FOTO 189 - B74

FOTO 190 - B75

FOTO 191 - B76

FOTO 192 - B77

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

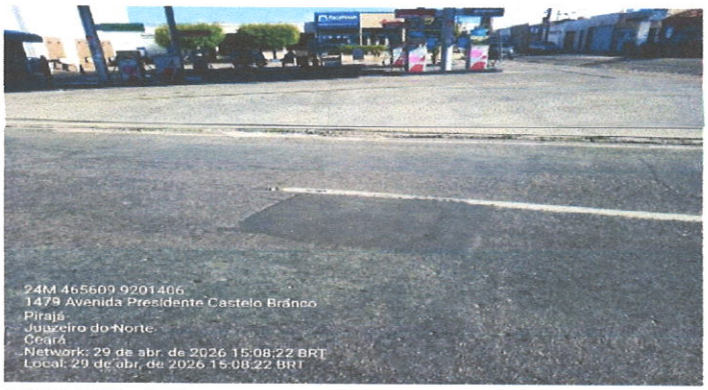

FOTO 193 - B78

FOTO 194 - B79

FOTO 195 - B80

FOTO 196 - B81

FOTO 197 - B82

FOTO 198 - B83

FOTO 199 - B84

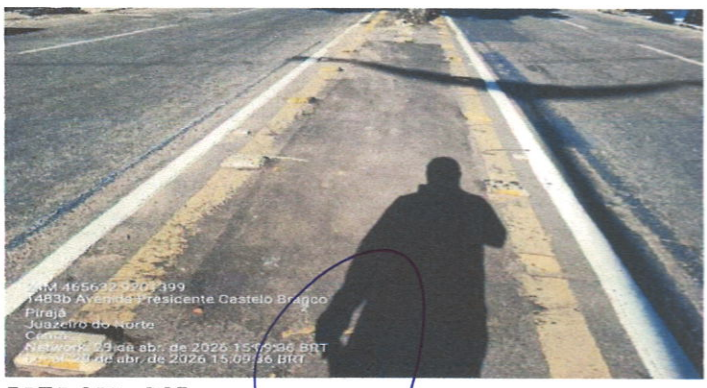

FOTO 200 - B85

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 201 - B86, B87 E B88

FOTO 202 - B89

FOTO 203 - B90

FOTO 204 - B91

FOTO 205 - B92

FOTO 206 - B93

FOTO 207 - B94

FOTO 208 - B95

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 209 - B96

FOTO 210 - B97

FOTO 211 - B98

FOTO 212 - B99

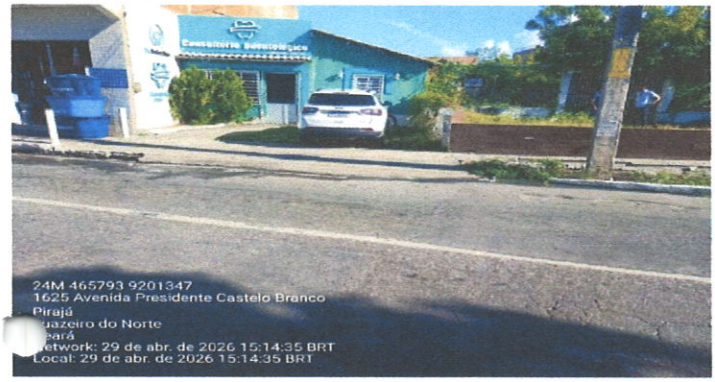

FOTO 213 - B100

FOTO 214 - B101

FOTO 215 - B102

FOTO 216 - B103

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 217 - B104

FOTO 218 - B105

FOTO 219 - B106

FOTO 220 - B107

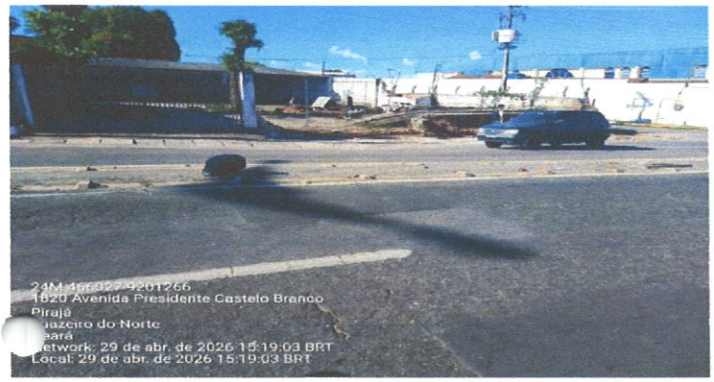

FOTO 221 - B108

FOTO 222 - B109

FOTO 223 - B110

FOTO 224 - B111

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 225 - B112

FOTO 226 - B113 E B114

FOTO 227 - B115 E B116

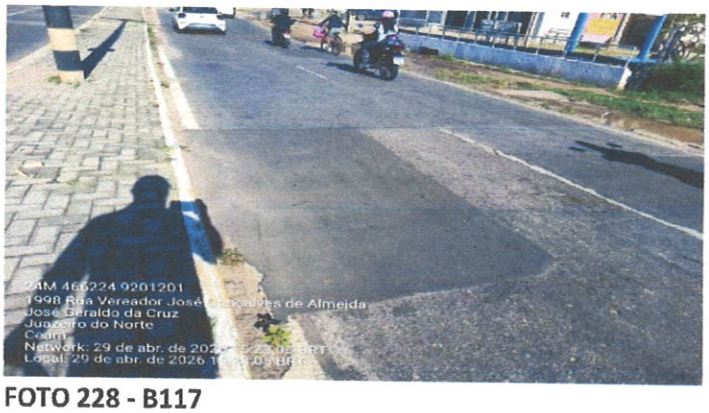

FOTO 228 - B117

FOTO 229 - B118

FOTO 230 - B119

FOTO 231 - B120

FOTO 232 - B121 E B122

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 233 - B123

FOTO 234 - B124 E B125

FOTO 235 - B126

FOTO 236 - B127

FOTO 237 - B128

FOTO 238 - B129

FOTO 239 - B130

FOTO 240 - B131

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 241 - B132

FOTO 242 - B133

FOTO 243 - B134

FOTO 244 - B135

FOTO 245 - B136

FOTO 246 - B137

FOTO 247 - B138

FOTO 248 - B139

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 249 - B140

FOTO 250 - B141

FOTO 251 - B142

FOTO 252 - B143

FOTO 253 - B144

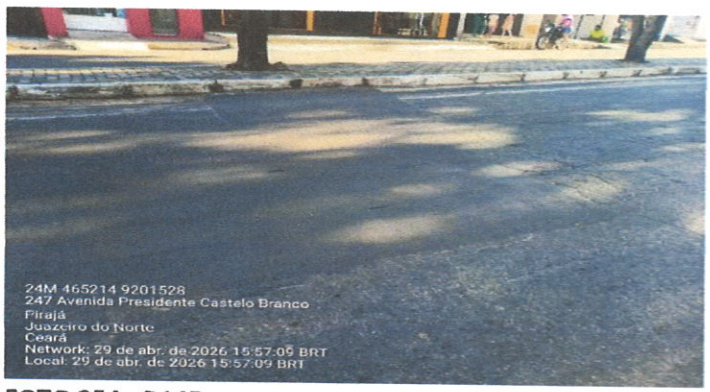

FOTO 254 - B145

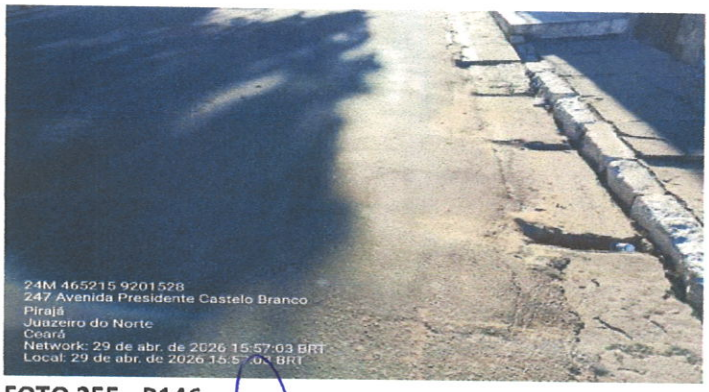

FOTO 255 - B146

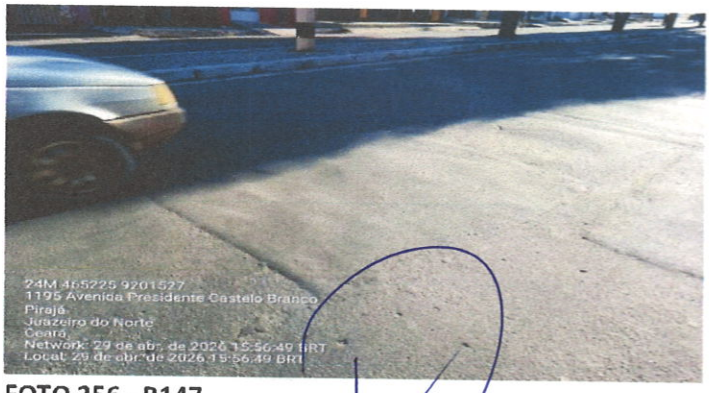

FOTO 256 - B147

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 257 - B148

FOTO 258 - B149

FOTO 259 - B150

FOTO 260 - B151

FOTO 261 - B152

FOTO 262 - B153

FOTO 263 - B154 E B155

FOTO 264 - B156

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 265 - B157, B160, B161 E B164

FOTO 266 - B158 E B159

FOTO 267 - B162 E B163

FOTO 268 - B165

FOTO 269 - B166, B167, B168 E B169

FOTO 270 - B170 A B173

FOTO 271 - B174

FOTO 272 - B175 E B176

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 273 - B177 E 178

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 04.03.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA FREI DAMIÃO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 4 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

RUA AILTON GOMES

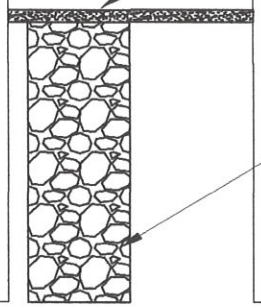

MEIO FIO
12m
ESCAVAÇÃO
12m x 0,07m x 0,3m
CARGA E TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
29,80m x 5,20m
ATERRO COM COMPACTAÇÃO
28,80m x 5,00m x 0,25m
LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE

RUA POSSIDÔNIO BEM

RUA FREI DAMIÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 06	**LOCALIDADE:** RUA FREI DAMIÃO	**BAIRRO:** LAGOA SECA	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	**DATA:** 31/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	**LONG.:** 465184 **LAT.:** 9199485

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
6	RUA FREI DAMIÃO	LAGOA SECA

TRECHO

ENTRE A RUA POSSIDONIO BEM E AV. AILTON GOMES

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
HEITOR BORGES	31/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	6	RUA FREI DAMIÃO					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	154,96	R$ 1,84	R$	285,13
1.7	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,25	R$ 64,82	R$	16,33
1.12	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	36,00	R$ 99,45	R$	3.580,20
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	10,40	R$ 4,99	R$	51,90
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	10,40	R$ 41,23	R$	428,79
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM					
2.9	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	154,96	R$ 78,14	R$	12.108,57
2.13	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/ REJUNTAMENTO	M	12,00	R$ 31,98	R$	383,76
					TOTAL	R$	16.854,68

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

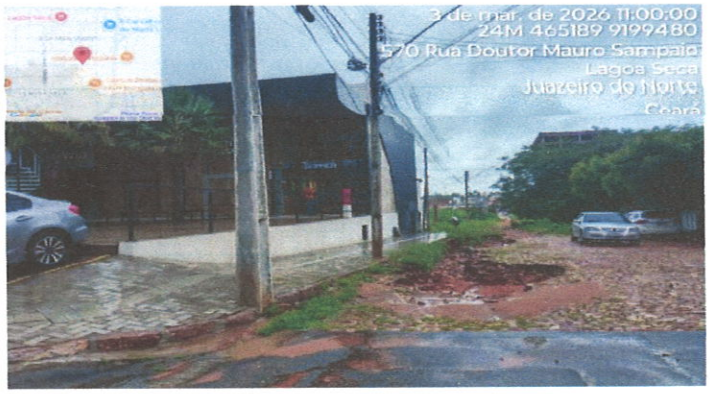

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - EM EXECUÇÃO (1)

FOTO 03 - EM EXECUÇÃO (2)

FOTO 04 - EXECUTADO (1)

FOTO 05 - EXECUTADO (2)

FOTO 06 - EXECUTADO (3)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 04.03.2026-02	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA JOÃO DIAS DE OLIVEIRA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 4 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

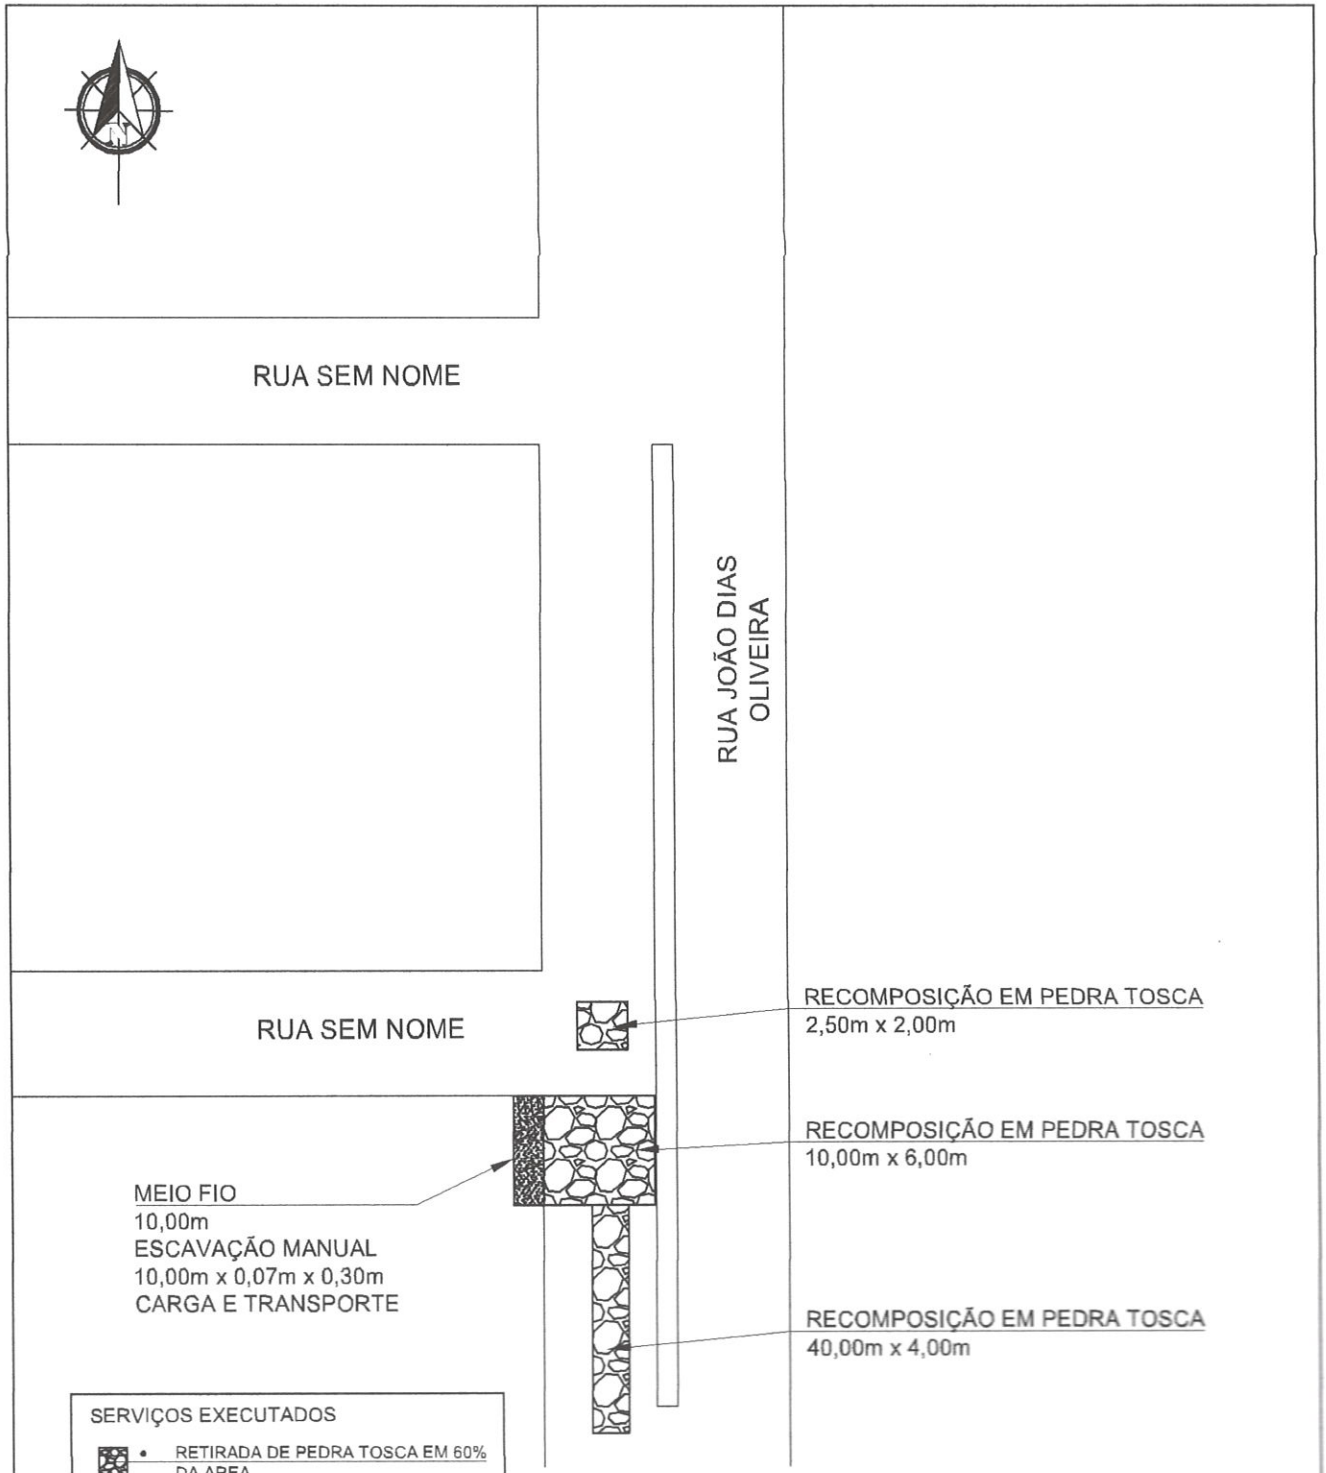

SERVIÇOS EXECUTADOS

- RETIRADA DE PEDRA TOSCA EM 60% DA AREA
- RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA PROPORÇÃO DE 60% COM APROVEITAMENTO DA PEDRA E 40% COM PEDRA NOVA
- COMPACTAÇÃO MECÂNICA
- MEIO FIO
- ESCAVAÇÃO
- LIMPEZA CARGA E TRANSPORTE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 07	**LOCALIDADE:** RUA JOÃO DIAS OLIVEIRA	**BAIRRO:** AEROPORTO	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 468933 **LAT.:** 9203061
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	**DATA:** 31/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
7	RUA JOÃO DIAS DE OLIVEIRA	AEROPORTO

TRECHO

ENTRE A RUA VALERIANO LOBO DE MENEZES E A RUA SEM NOME

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO

HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

31/03/2026

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	7	RUA JOÃO DIAS DE OLIVEIRA						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I		P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	225,00	R$	1,84	R$	414,00
1.4	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	135,00	R$	14,68	R$	1.981,80
1.13	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	135,00	R$	1,35	R$	182,25
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	14,63	R$	4,99	R$	72,98
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	14,63	R$	41,23	R$	602,99
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM						
2.9	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	90,00	R$	78,14	R$	7.032,60
2.11	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	135,00	R$	37,98	R$	5.127,30
					TOTAL		R$	15.413,92

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - DEPOIS 1

FOTO 04 - DEPOIS 2

FOTO 05 - DEPOIS 3

FOTO 06 - DEPOIS 4

FOTO 07 - DEPOIS 5

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 05.03.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA PIO X.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 5 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

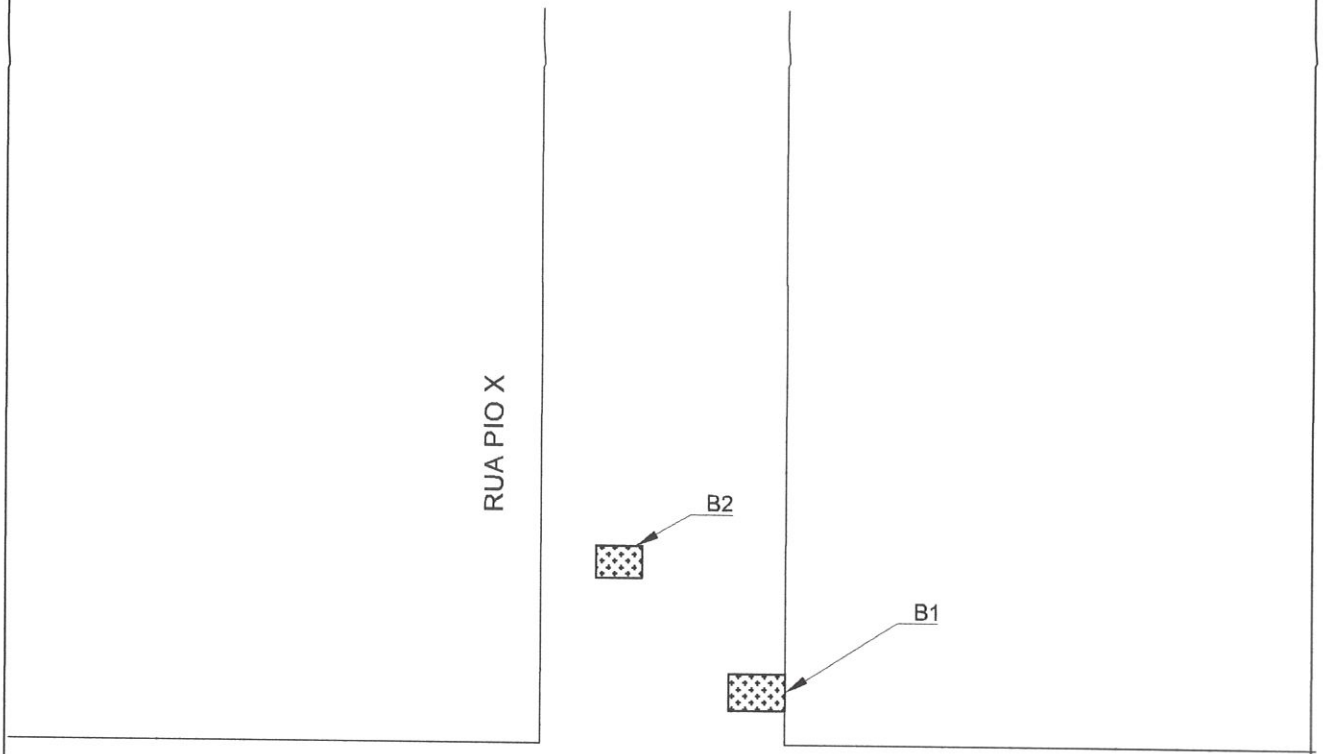

B1	3,80	X	0,80	=	3,04	X	0,08	=	0,24
B2	2,50	X	2,30	=	5,75	X	0,08	=	0,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 08	**LOCALIDADE:** RUA PIO X		**BAIRRO:** SALESIANO	**PRANCHA:** 1/3
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO				**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465683 **LAT.:** 9209379
RESP. MEDIÇÃO: PHELIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 05/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON		

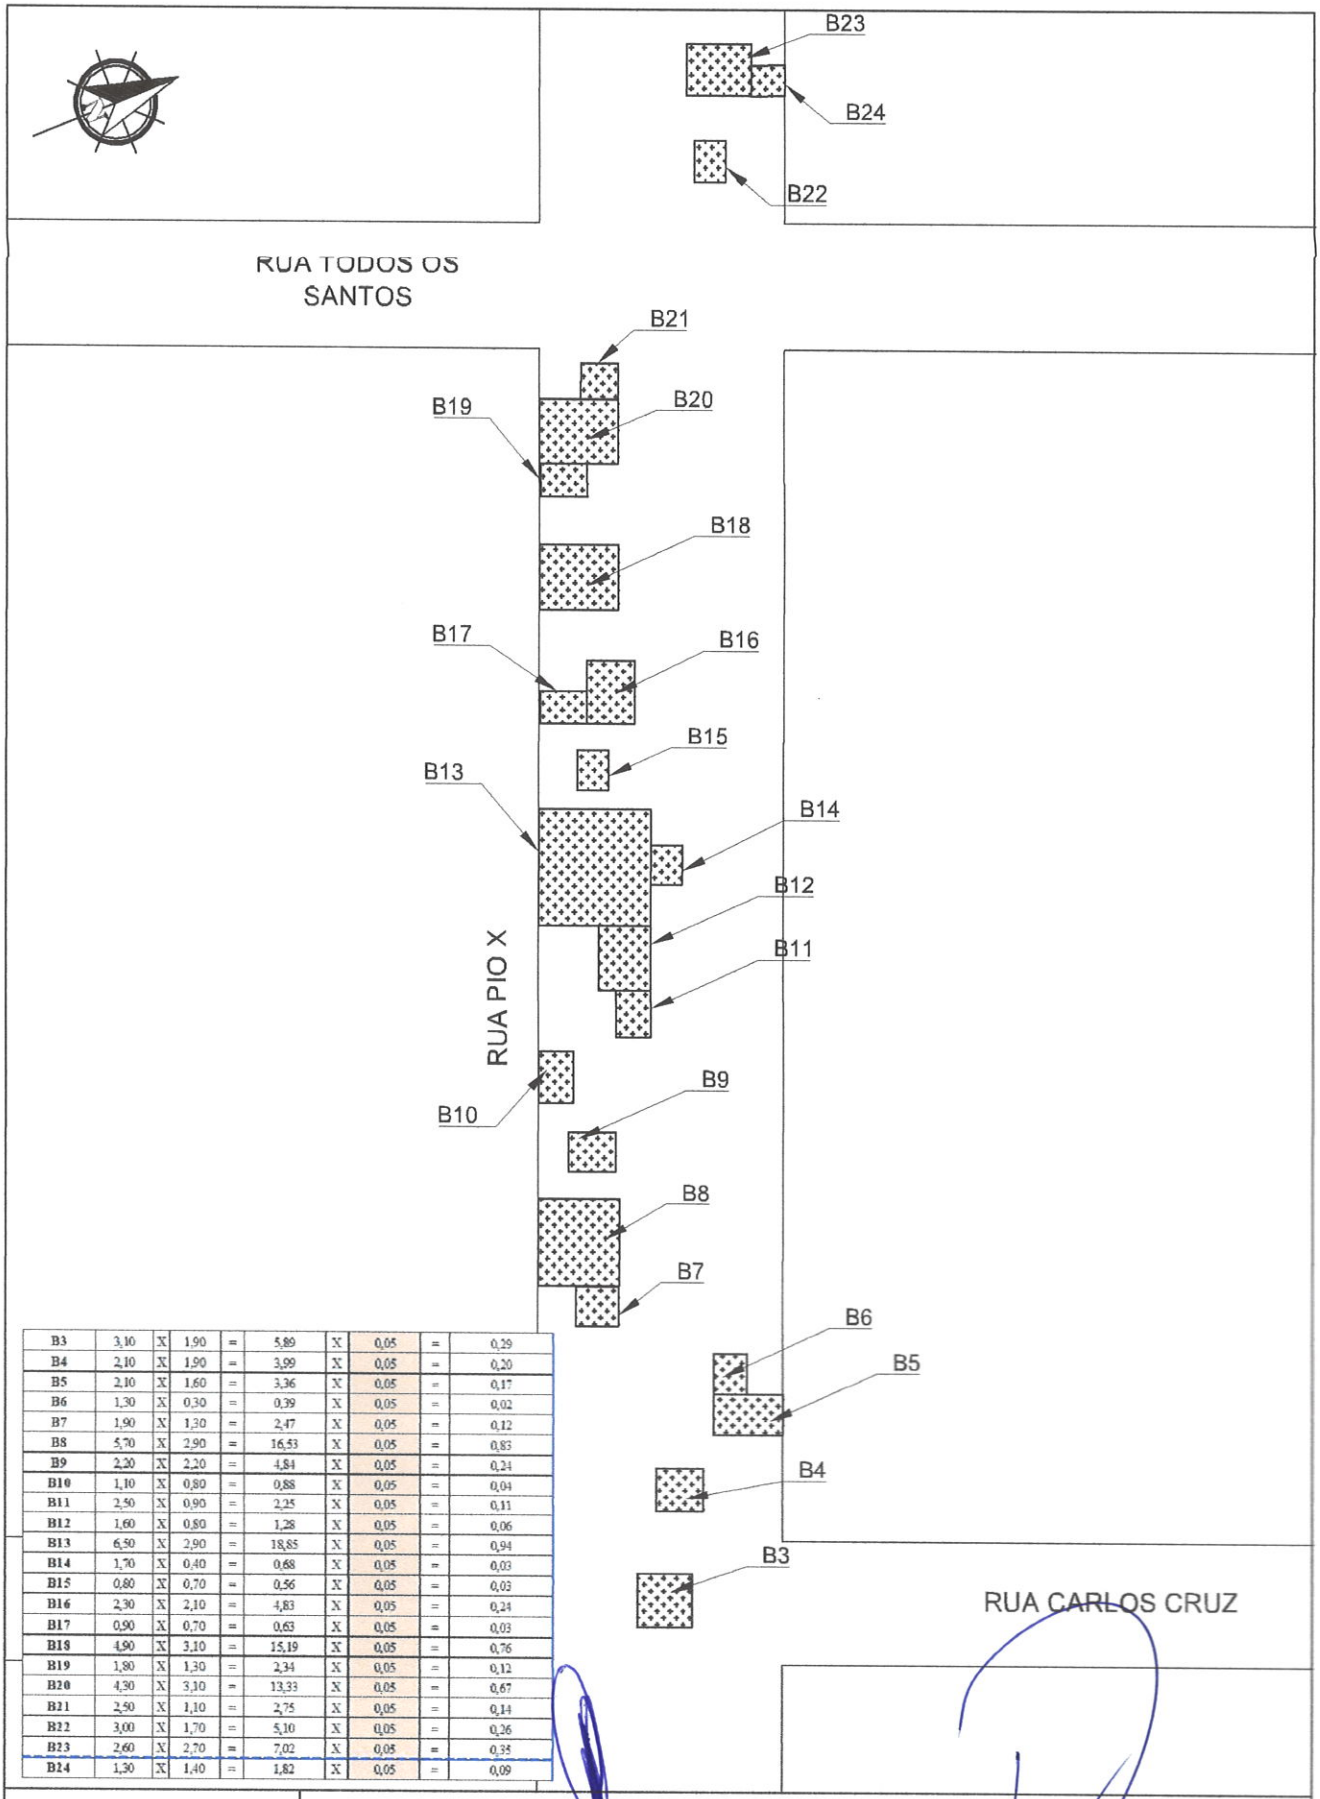

B3	3,10	X	1,90	=	5,89	X	0,05	=	0,29
B4	2,10	X	1,90	=	3,99	X	0,05	=	0,20
B5	2,10	X	1,60	=	3,36	X	0,05	=	0,17
B6	1,30	X	0,30	=	0,39	X	0,05	=	0,02
B7	1,90	X	1,30	=	2,47	X	0,05	=	0,12
B8	5,70	X	2,90	=	16,53	X	0,05	=	0,83
B9	2,20	X	2,20	=	4,84	X	0,05	=	0,24
B10	1,10	X	0,80	=	0,88	X	0,05	=	0,04
B11	2,50	X	0,90	=	2,25	X	0,05	=	0,11
B12	1,60	X	0,80	=	1,28	X	0,05	=	0,06
B13	6,50	X	2,90	=	18,85	X	0,05	=	0,94
B14	1,70	X	0,40	=	0,68	X	0,05	=	0,03
B15	0,80	X	0,70	=	0,56	X	0,05	=	0,03
B16	2,30	X	2,10	=	4,83	X	0,05	=	0,24
B17	0,90	X	0,70	=	0,63	X	0,05	=	0,03
B18	4,90	X	3,10	=	15,19	X	0,05	=	0,76
B19	1,80	X	1,30	=	2,34	X	0,05	=	0,12
B20	4,30	X	3,10	=	13,33	X	0,05	=	0,67
B21	2,50	X	1,10	=	2,75	X	0,05	=	0,14
B22	3,00	X	1,70	=	5,10	X	0,05	=	0,26
B23	2,60	X	2,70	=	7,02	X	0,05	=	0,35
B24	1,30	X	1,40	=	1,82	X	0,05	=	0,09

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 08	**LOCALIDADE:** RUA PIO X	**BAIRRO:** FRANCISCANO	**PRANCHA:** 2/3
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465164 **LAT.:** 9202796
RESP. MEDIÇÃO: PHELIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 19/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	

B25	4,10	X	2,00	=	8,20	X	0,05	=	0,41
B26	2,10	X	1,30	=	2,73	X	0,05	=	0,14
B27	4,50	X	2,00	=	9,00	X	0,05	=	0,45
B28	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,05	=	0,07
B29	3,10	X	1,70	=	5,27	X	0,05	=	0,26
			ÁREA	=	**150,29**		**VOLUME**	=	**7,78**

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 08	**LOCALIDADE:** RUA PIO X	**BAIRRO:** SALESIANO	**PRANCHA:** 3/3
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465032 **LAT.:** 9202793
RESP. MEDIÇÃO: PHELIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 19/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID: 8

ENDEREÇO: RUA PIO X

BAIRRO: SALESIANOS

TRECHO: ENTRE A AV. CARLOS CRUZ E A RUA JOSE MARROCOS

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM

DATA MEDIÇÃO: 05/03/2026

EMPRESA EXECUTORA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO: N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	8	RUA PIO X						
ITEM	**COD**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID**	**QTDE**	**P. UNIT. C/ B.D.I**		**P. TOTAL C/ B.D.I**	
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	150,29	R$	1,84	R$	276,53
2.0		**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM**						
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	7,78	R$	1.696,15	R$	13.192,99
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	150,29	R$	0,33	R$	49,60
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,06	R$	3.062,93	R$	184,13
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	1,18	R$	472,85	R$	560,25
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	19,93	R$	30,12	R$	600,35
						TOTAL	R$	14.863,85

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - ANTES

FOTO 10 - ANTES

FOTO 11 - ANTES

FOTO 12 - ANTES

FOTO 13 - ANTES

FOTO 14 - ANTES

FOTO 15 - ANTES

FOTO 16 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 17 - ANTES

FOTO 18 - B1

FOTO 19 - B2

FOTO 20 - B3

FOTO 21 - B4

FOTO 22 - B5 E B6

FOTO 23 - B7 E B8

FOTO 24 - B9 E B10

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng" Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 25 - B11 A B14

FOTO 26 - B15 A B17

FOTO 27 - B18

FOTO 28 - B19 A B21

FOTO 29 - B22

FOTO 30 - B23 E B24

FOTO 31 - B25 E B26

FOTO 32 - B27 E B28

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 33 - B29

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 05.03.2026-02	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 5 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

B1	1,50	X	1,30	=	1,95	X	0,05	=	0,10
B2	1,50	X	1,30	=	1,95	X	0,05	=	0,10
B3	2,40	X	0,90	=	2,16	X	0,05	=	0,11
B4	2,00	X	1,70	=	3,40	X	0,08	=	0,27
B5	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,08	=	0,08
B6	1,60	X	2,00	=	3,20	X	0,08	=	0,26
B7	1,50	X	1,40	=	2,10	X	0,05	=	0,11
B8	6,40	X	1,40	=	8,96	X	0,08	=	0,72
			ÁREA	=	**24,72**		**VOLUME**	=	**1,73**

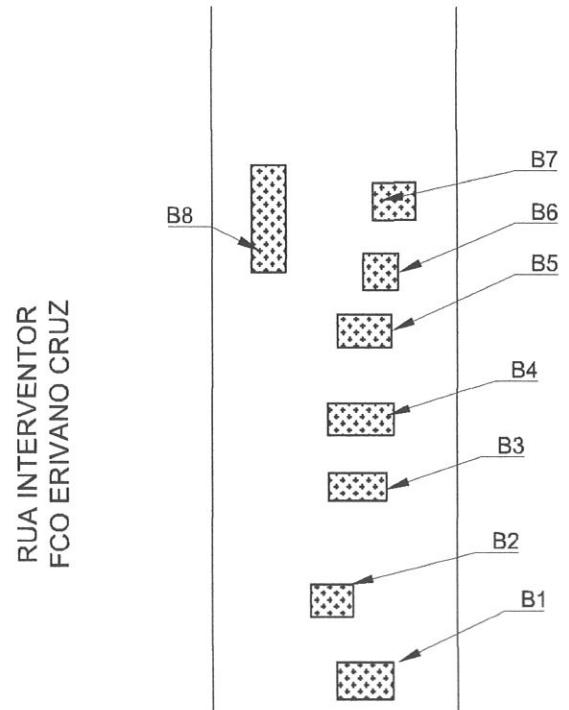

RUA INTERVENTOR FCO ERIVANO CRUZ

RUA SÃO PEDRO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 09	**LOCALIDADE:** RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANIO	**BAIRRO:** CENTRO	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHELIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 05/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	**LONG.:** 465271 **LAT.:** 9204852

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
9	RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ	CENTRO

TRECHO

ENTRE A AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA E A RUA SINHA RIBEIRO

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	05/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	9	RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	24,72	R$ 1,84	R$ 45,48
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	1,73	R$ 1.696,15	R$ 2.939,09
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	24,72	R$ 0,33	R$ 8,16
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,01	R$ 3.062,93	R$ 30,29
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,26	R$ 472,85	R$ 123,16
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	4,44	R$ 30,12	R$ 133,64
					TOTAL	R$ 3.279,82

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

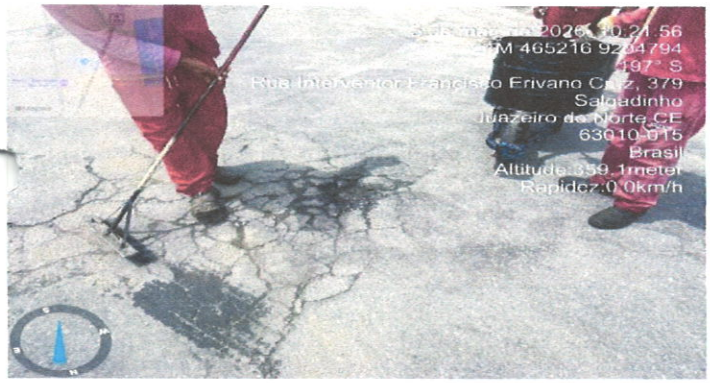

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

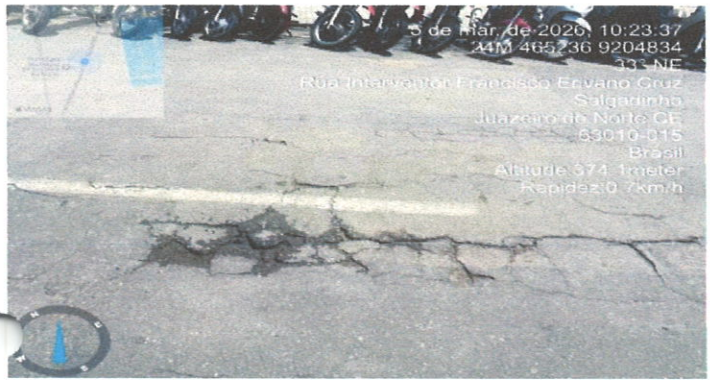

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - B1

FOTO 10 - B2

FOTO 11 - B3

FOTO 12 - B4

FOTO 13 - B5

FOTO 14 - B6

FOTO 15 - B7

FOTO 16 - B8

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 05.03.2026-03	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA SÃO PEDRO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 5 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

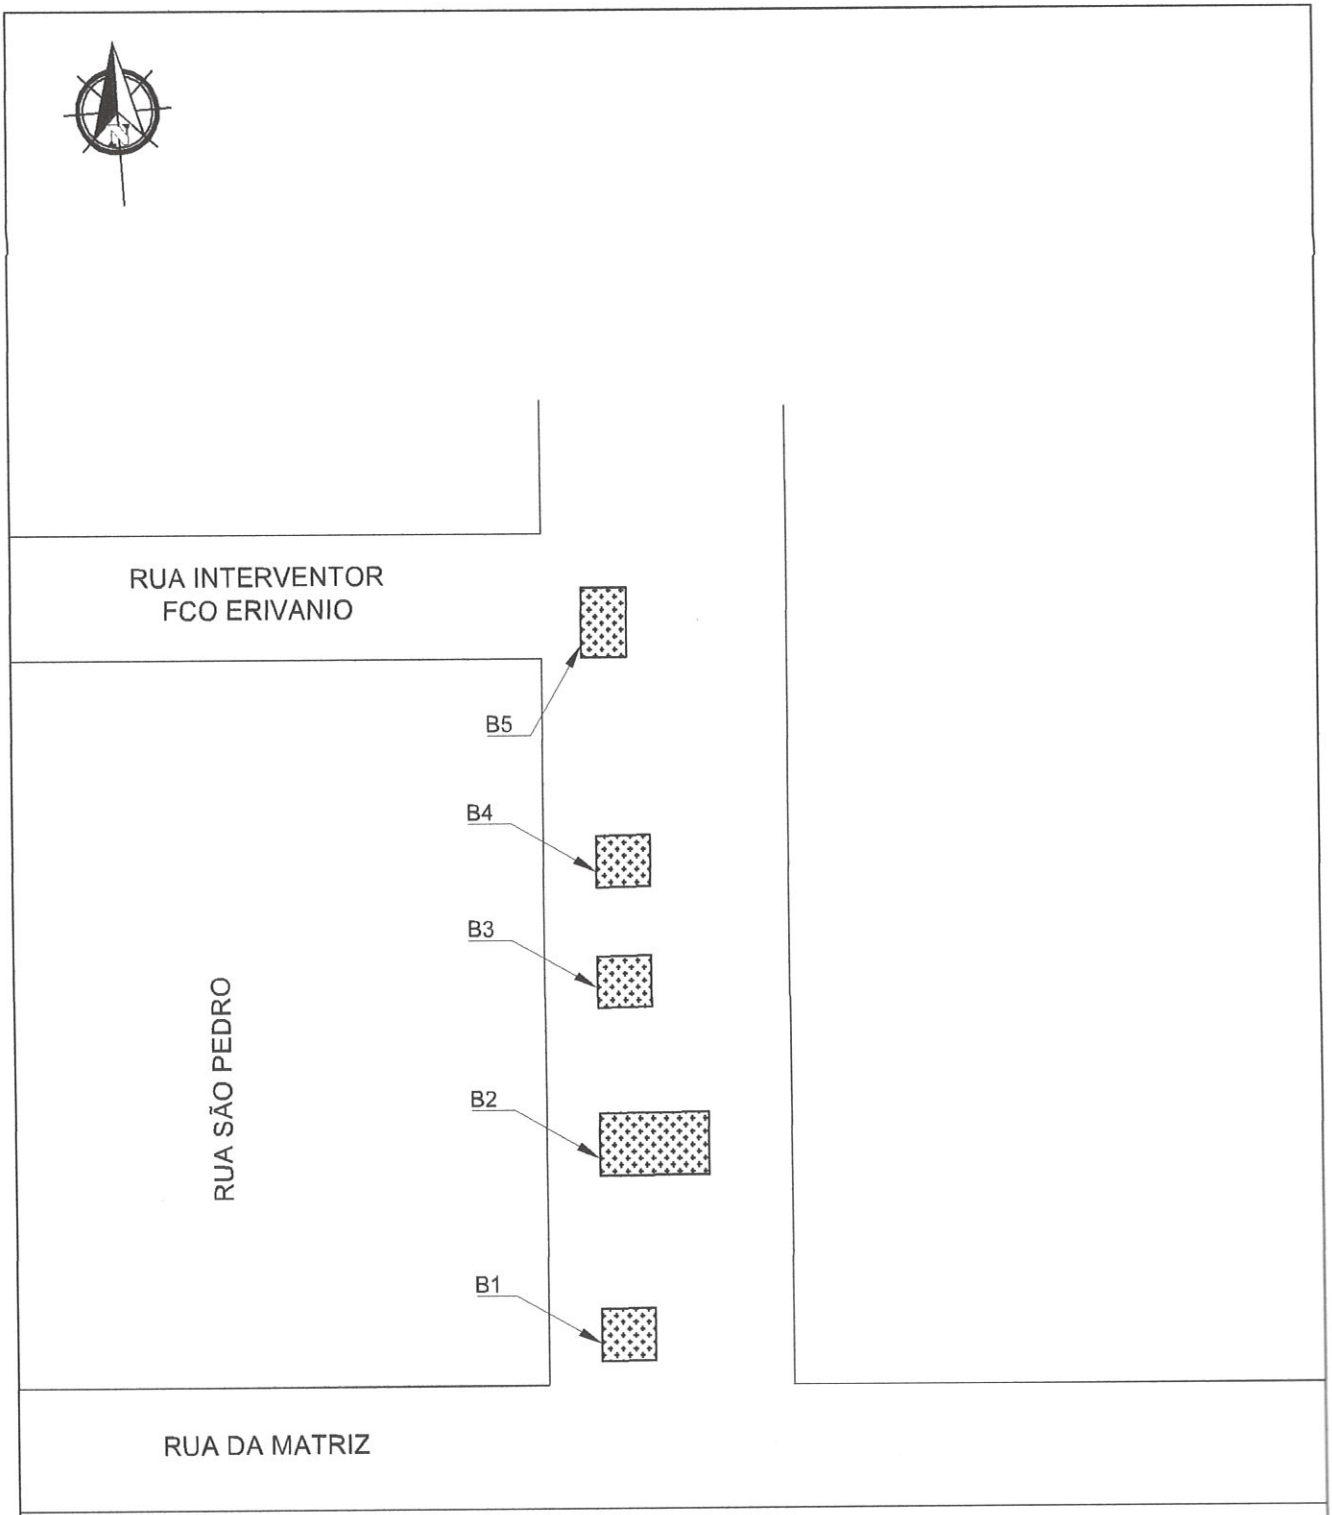

B1	1,90	X	1,50	=	2,85	X	0,08	=	0,23
B2	3,10	X	2,40	=	7,44	X	0,08	=	0,60
B3	1,90	X	1,90	=	3,61	X	0,08	=	0,29
B4	1,80	X	1,80	=	3,24	X	0,08	=	0,26
B5	2,20	X	1,70	=	3,74	X	0,08	=	0,30
			ÁREA	=	**20,88**		**VOLUME**	=	**1,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 10	**LOCALIDADE:** RUA SÃO PEDRO	**BAIRRO:** CENTRO	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465120 **LAT.:** 9204264
RESP. MEDIÇÃO: PHELIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 05/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
10	RUA SÃO PEDRO	CENTRO

TRECHO

ENTRE A RUA DA MATRIZ E A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	05/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	10	RUA SÃO PEDRO				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	20,88	R$ 1,84	R$ 38,42
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	1,67	R$ 1.696,15	R$ 2.833,25
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	20,88	R$ 0,33	R$ 6,89
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,01	R$ 3.062,93	R$ 25,58
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,25	R$ 472,85	R$ 118,16
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	4,28	R$ 30,12	R$ 128,79
					TOTAL	R$ 3.151,09

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

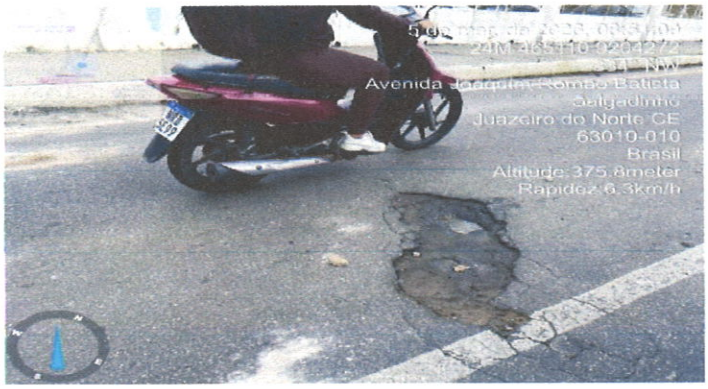

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

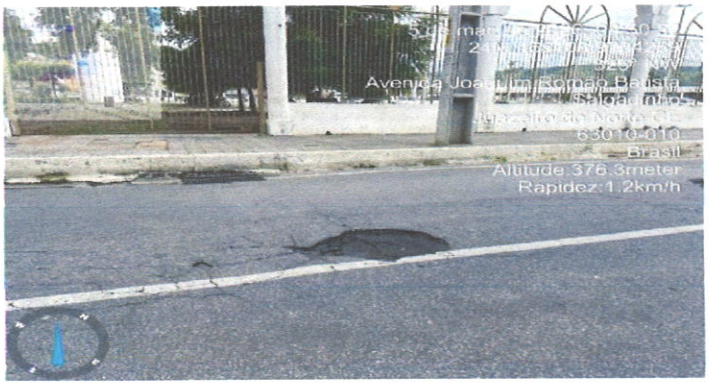

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - B1 E B2

FOTO 06 - B3

FOTO 07 - B4

FOTO 08 - B5

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 06.03.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA DUCA BRINGEL.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 6 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

B1	1,80	X	1,10	=	1,98	X	0,08	=	0,16
B2	3,50	X	1,30	=	4,55	X	0,08	=	0,36
B3	1,50	X	1,30	=	1,95	X	0,08	=	0,16
B4	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,08	=	0,17
B5	2,20	X	1,20	=	2,64	X	0,08	=	0,21
B6	2,10	X	1,10	=	2,31	X	0,08	=	0,18
B7	3,30	X	1,60	=	5,28	X	0,08	=	0,42
B8	5,20	X	2,50	=	13,00	X	0,08	=	1,04
B9	3,20	X	2,30	=	7,36	X	0,08	=	0,59
B10	5,50	X	3,10	=	17,05	X	0,08	=	1,36
			ÁREA	=	**58,20**		**VOLUME**	=	**4,66**

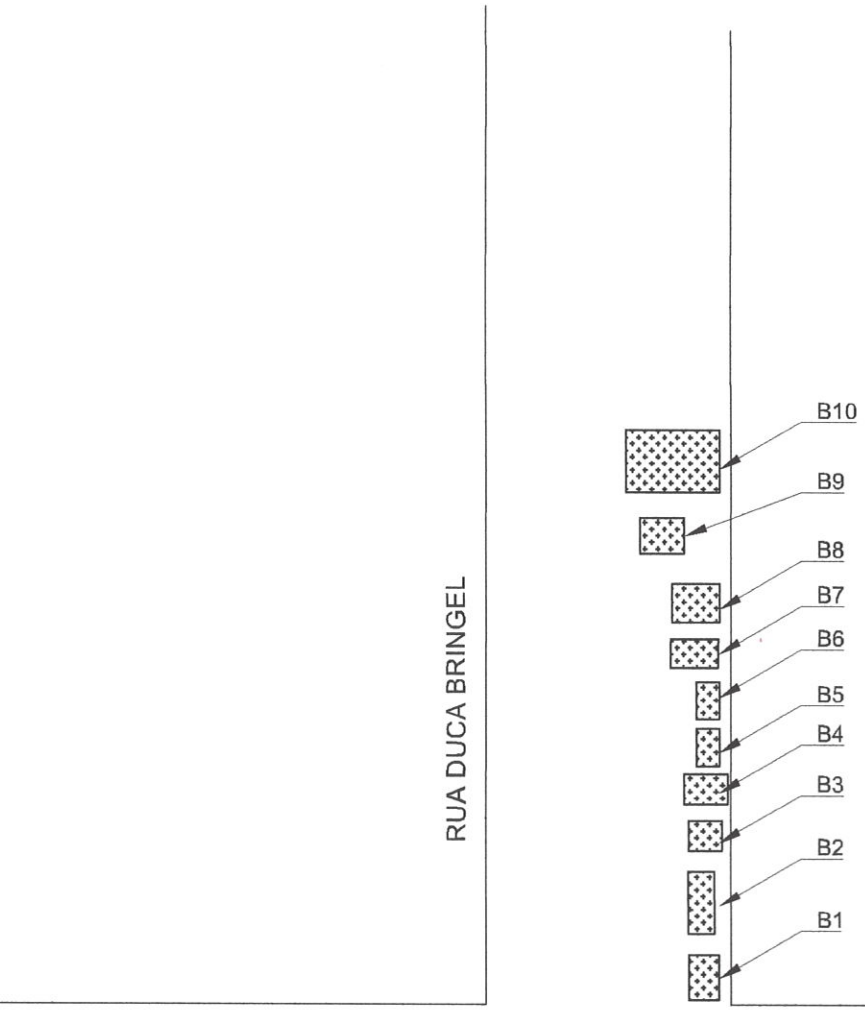

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 11	**LOCALIDADE:** RUA DUCA BRNGEL	**BAIRRO:** LAGOA SECA	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHELIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 09/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	**LONG.:** 464461 **LAT.:** 9197443

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
11	RUA DUCA BRINGEL	LAGOA SECA

TRECHO

ENCONTRO COM A AV. LEÃO SAMPAIO

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	09/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	11	RUA DUCA BRINGEL					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	58,20	R$ 1,84	R$	107,09
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM					
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	4,66	R$ 1.696,15	R$	7.897,27
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/ TRANSP)	M2	58,20	R$ 0,33	R$	19,21
2.4	INS	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,02	R$ 3.062,93	R$	71,31
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,70	R$ 472,85	R$	329,36
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	11,92	R$ 30,12	R$	358,98
					TOTAL	R$	8.783,22

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - B1 E B2

FOTO 07 - B3

FOTO 08 - B4 E B5

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - B6 E 7

FOTO 10 - B8

FOTO 11 - B9

FOTO 12 - B10

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 06.03.2026-02	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA SÃO PAULO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 6 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

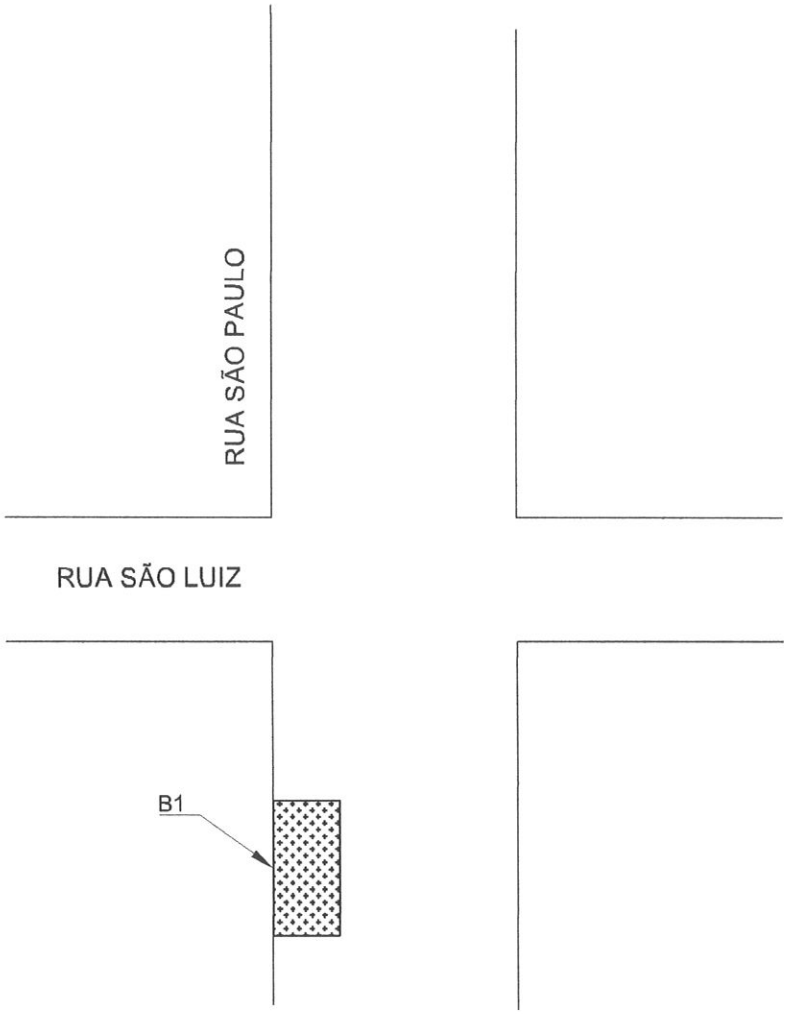

B1	6,40	X	1,50	=	9,60	X	0,08	=	0,77
			ÁREA	=	**9,60**		**VOLUME**	=	**0,77**

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 12	**LOCALIDADE:** RUA SÃO PAULO	**BAIRRO:** CENTRO	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 464997 **LAT.:** 9203389
RESP. MEDIÇÃO: PHELIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 09/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
12	RUA SÃO PAULO	CENTRO

TRECHO

ENCONTRO COM A RUA SÃO LUIZ

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	09/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	12	RUA SÃO PAULO				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	9,60	R$ 1,84	R$ 17,66
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	0,77	R$ 1.696,15	R$ 1.302,64
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	9,60	R$ 0,33	R$ 3,17
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,00	R$ 3.062,93	R$ 11,76
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,11	R$ 472,85	R$ 54,33
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	1,97	R$ 30,12	R$ 59,21
					TOTAL	R$ 1.448,77

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - B1

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 06.03.2026-03	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) AV. LEANDRO BEZERRA (PRAÇA DO MEMORIAL PADRE CICERO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 6 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

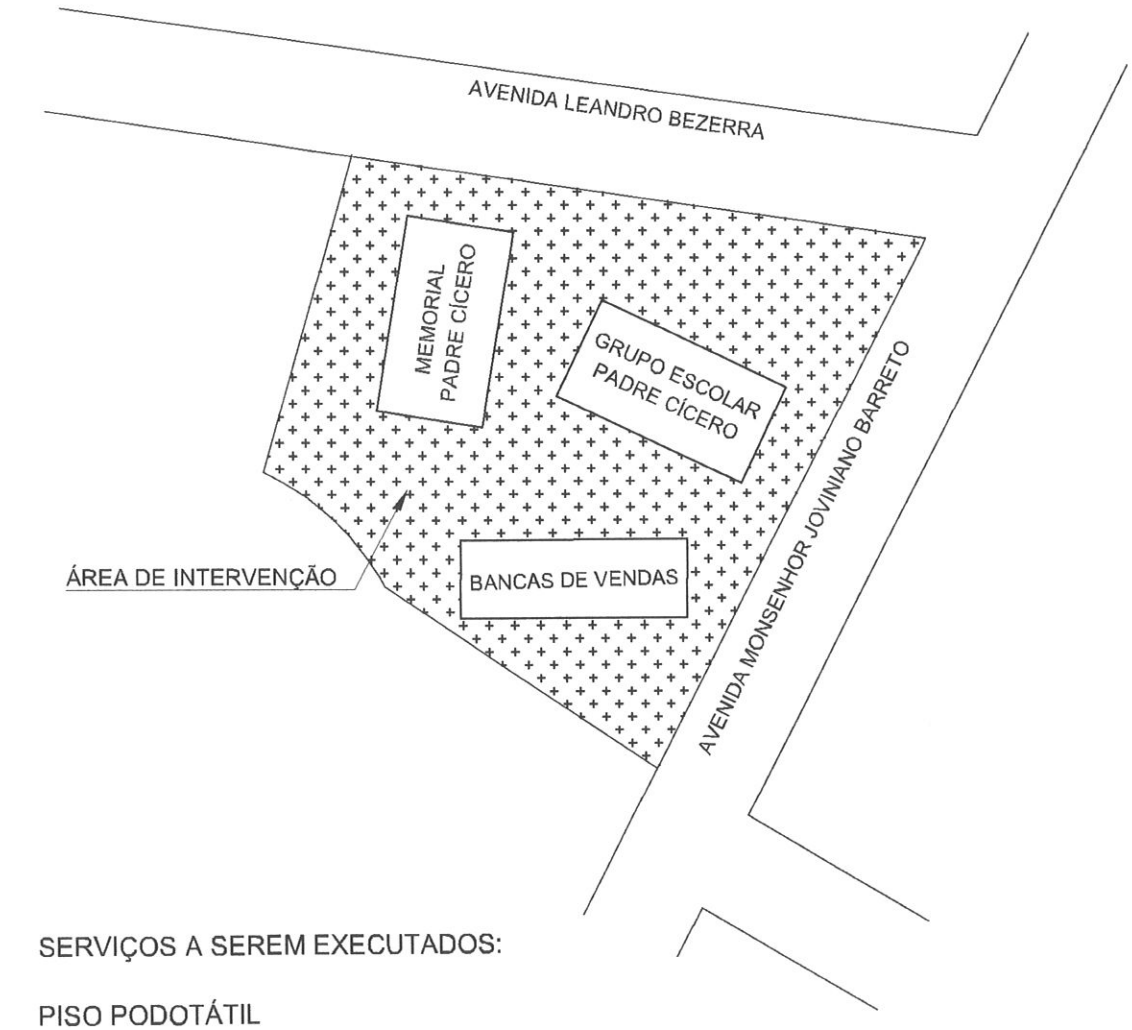

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

PISO PODOTÁTIL
0,30m x 0,30m x 55un = 4,95m²

FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA
143 x 0,1 + 3,00 x 1,00 + 2,00 x 1,5 + 819
x 0,3 + 24 x 1,39 + 64,06 x 2,54 + 40 x 0,4
x 2,54 + 29 x 0,6 x 2,54 = 546,91M²

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 16	**LOCALIDADE:** AVENIDA LEANDRO BEZERRA (PRAÇA DO MEMORIAL PADRE CÍCERO)	**BAIRRO:** SOCORRO	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: SINALIZAÇÃO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 464871 **LAT.:** 9203730
RESP. MEDIÇÃO: JOSÉ CARLOS	**DATA:** 30/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
13	AV. LEANDRO BEZERRA (PRAÇA DO MEMORIAL PADRE CICERO	SOCORRO

TRECHO

ENTORNO DO MEMORIAL PADRE CICERO

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
JOSE CARLOS	30/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	13	AV. LEANDRO BEZERRA (PRAÇA DO MEMORIAL PADRE CICERO				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
4.0		CALÇADAS E PASSEIOS				
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	4,95	R$ 165,85	R$ 820,96
7.0		SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL				
7.11	C3219	FAIXA HORIZONTAL/ TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	546,91	R$ 13,82	R$ 7.558,27
					TOTAL	R$ 8.379,23

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - EM EXECUÇÃO (1)

FOTO 02 - EM EXECUÇÃO (2)

FOTO 03 - EM EXECUÇÃO (3)

FOTO 04 - EM EXECUÇÃO (4)

FOTO 05 - EM EXECUÇÃO (5)

FOTO 06 - EM EXECUÇÃO (6)

FOTO 07 - EM EXECUÇÃO (7)

FOTO 08 - EM EXECUÇÃO (8)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - EM EXECUÇÃO (9)

FOTO 10 - EM EXECUÇÃO (10)

FOTO 11 - EM EXECUÇÃO (11)

FOTO 12 - EM EXECUÇÃO (12)

FOTO 13 - EM EXECUÇÃO (13)

FOTO 14 - EM EXECUÇÃO (14)

FOTO 15 - EM EXECUÇÃO (15)

FOTO 16 - EM EXECUÇÃO (16)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 17 - EM EXECUÇÃO (17)

FOTO 18 - EM EXECUÇÃO (18)

FOTO 19 - EM EXECUÇÃO (19)

FOTO 20 - EM EXECUÇÃO (20)

FOTO 21 - EM EXECUÇÃO (21)

FOTO 22 - EM EXECUÇÃO (22)

FOTO 23 - EM EXECUÇÃO (23)

FOTO 24 - EM EXECUÇÃO (24)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 25 - EM EXECUÇÃO (25)

FOTO 26 - EM EXECUÇÃO (26)

FOTO 27 - EM EXECUÇÃO (27)

FOTO 28 - EM EXECUÇÃO (28)

FOTO 29 - EM EXECUÇÃO (29)

FOTO 30 - EM EXECUÇÃO (30)

FOTO 31 - EM EXECUÇÃO (31)

FOTO 32 - EM EXECUÇÃO (32)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 33 - EM EXECUÇÃO (33)

FOTO 34 - EM EXECUÇÃO (34)

FOTO 35 - EM EXECUÇÃO (35)

FOTO 36 - EM EXECUÇÃO (36)

FOTO 37 - EM EXECUÇÃO (37)

FOTO 38 - EM EXECUÇÃO (38)

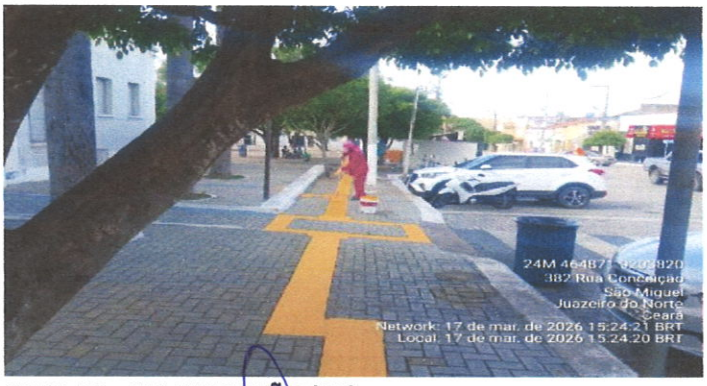

FOTO 39 - EM EXECUÇÃO (39)

FOTO 40 - EM EXECUÇÃO (40)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 41 - EM EXECUÇÃO (41)

FOTO 42 - EM EXECUÇÃO (42)

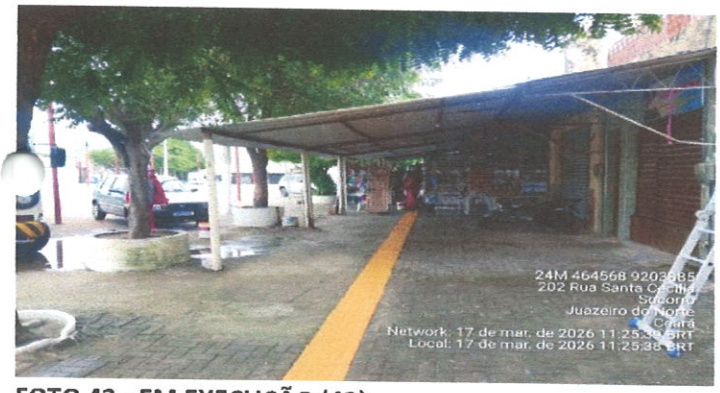

FOTO 43 - EM EXECUÇÃO (43)

FOTO 44 - EM EXECUÇÃO (44)

FOTO 45 - EM EXECUÇÃO (45)

FOTO 46 - EM EXECUÇÃO (46)

FOTO 47 - EM EXECUÇÃO (47)

FOTO 48 - EM EXECUÇÃO (48)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 49 - EM EXECUÇÃO (49)

FOTO 50 - EM EXECUÇÃO (50)

FOTO 51 - EM EXECUÇÃO (51)

FOTO 52 - EM EXECUÇÃO (52)

FOTO 53 - EM EXECUÇÃO (53)

FOTO 54 - EM EXECUÇÃO (54)

FOTO 55 - EM EXECUÇÃO (55)

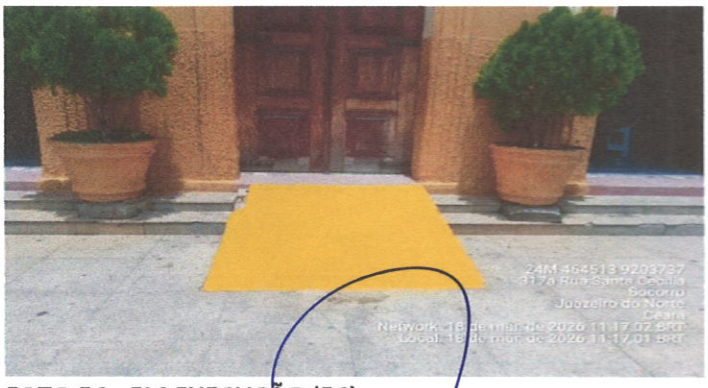

FOTO 56 - EM EXECUÇÃO (56)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 57 - EM EXECUÇÃO (57)

FOTO 58 - EM EXECUÇÃO (58)

FOTO 59 - EM EXECUÇÃO (59)

FOTO 60 - EM EXECUÇÃO (60)

FOTO 61 - EM EXECUÇÃO (61)

FOTO 62 - EXECUTADO (1)

FOTO 63 - EXECUTADO (2)

FOTO 64 - EXECUTADO (3)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 65 - EXECUTADO (4)

FOTO 66 - EXECUTADO (5)

FOTO 67 - EXECUTADO (6)

FOTO 68 - EXECUTADO (7)

FOTO 69 - EXECUTADO (8)

FOTO 70 - EXECUTADO (9)

FOTO 71 - EXECUTADO (10)

FOTO 72 - EXECUTADO (11)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodrigo Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

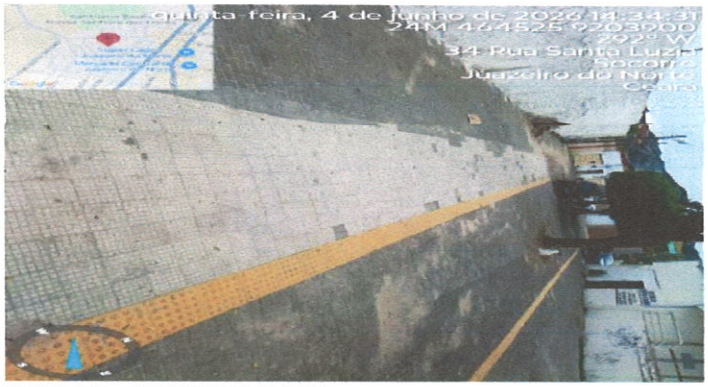

FOTO 73 - EXECUTADO (12)

FOTO 74 - EXECUTADO (13)

FOTO 75 - EXECUTADO (14)

FOTO 76 - EXECUTADO (15)

FOTO 77 - EXECUTADO (16)

FOTO 78 - EXECUTADO (17)

FOTO 79 - EXECUTADO (18)

FOTO 80 - EXECUTADO (19)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 81 - EXECUTADO (20)

FOTO 82 - EXECUTADO (21)

FOTO 83 - EXECUTADO (22)

FOTO 84 - EXECUTADO (23)

FOTO 85 - EXECUTADO (24)

FOTO 86 - EXECUTADO (25)

FOTO 87 - EXECUTADO (26)

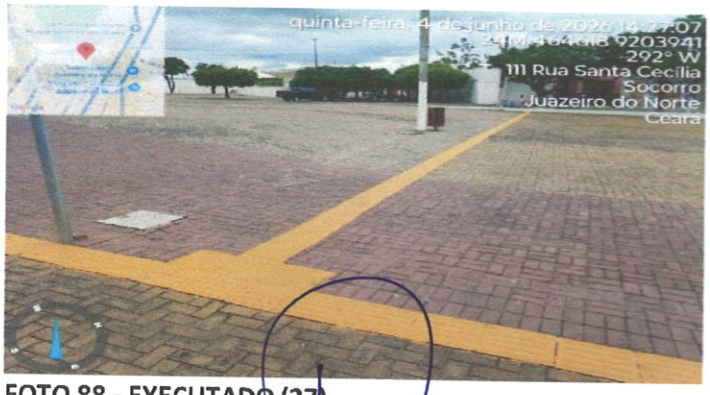

FOTO 88 - EXECUTADO (27)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 89 - EXECUTADO (28)

FOTO 90 - EXECUTADO (29)

FOTO 91 - EXECUTADO (30)

FOTO 92 - EXECUTADO (31)

FOTO 93 - EXECUTADO (32)

FOTO 94 - EXECUTADO (33)

FOTO 95 - EXECUTADO (34)

FOTO 96 - EXECUTADO (35)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 97 - EXECUTADO (36)

FOTO 98 - EXECUTADO (37)

FOTO 99 - EXECUTADO (38)

FOTO 100 - EXECUTADO (39)

FOTO 101 - EXECUTADO (40)

FOTO 102 - EXECUTADO (41)

FOTO 103 - EXECUTADO (42)

FOTO 104 - EXECUTADO (43)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 105 - EXECUTADO (44)

FOTO 106 - EXECUTADO (45)

FOTO 107 - EXECUTADO (46)

FOTO 108 - EXECUTADO (47)

FOTO 109 - EXECUTADO (48)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 09.03.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) AVENIDA PADRE CÍCERO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 9 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

B1	2,00	X	2,40	=	4,80	X	0,05	=	0,24
B2	6,30	X	2,10	=	13,23	X	0,05	=	0,66
B3	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,05	=	0,11
B4	1,30	X	1,40	=	1,82	X	0,05	=	0,09
B5	1,50	X	1,70	=	2,55	X	0,05	=	0,13
B6	1,60	X	1,70	=	2,72	X	0,05	=	0,14
B7	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06
B8	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09
		X		=		X		=	
B10	3,80	X	1,70	=	6,46	X	0,05	=	0,32
B11	1,80	X	1,30	=	2,34	X	0,05	=	0,12
B12	1,70	X	1,20	=	2,04	X	0,05	=	0,10
B13	2,70	X	2,80	=	7,56	X	0,05	=	0,38
B14	1,20	X	1,40	=	1,68	X	0,05	=	0,08
B15	2,60	X	1,50	=	3,90	X	0,05	=	0,20

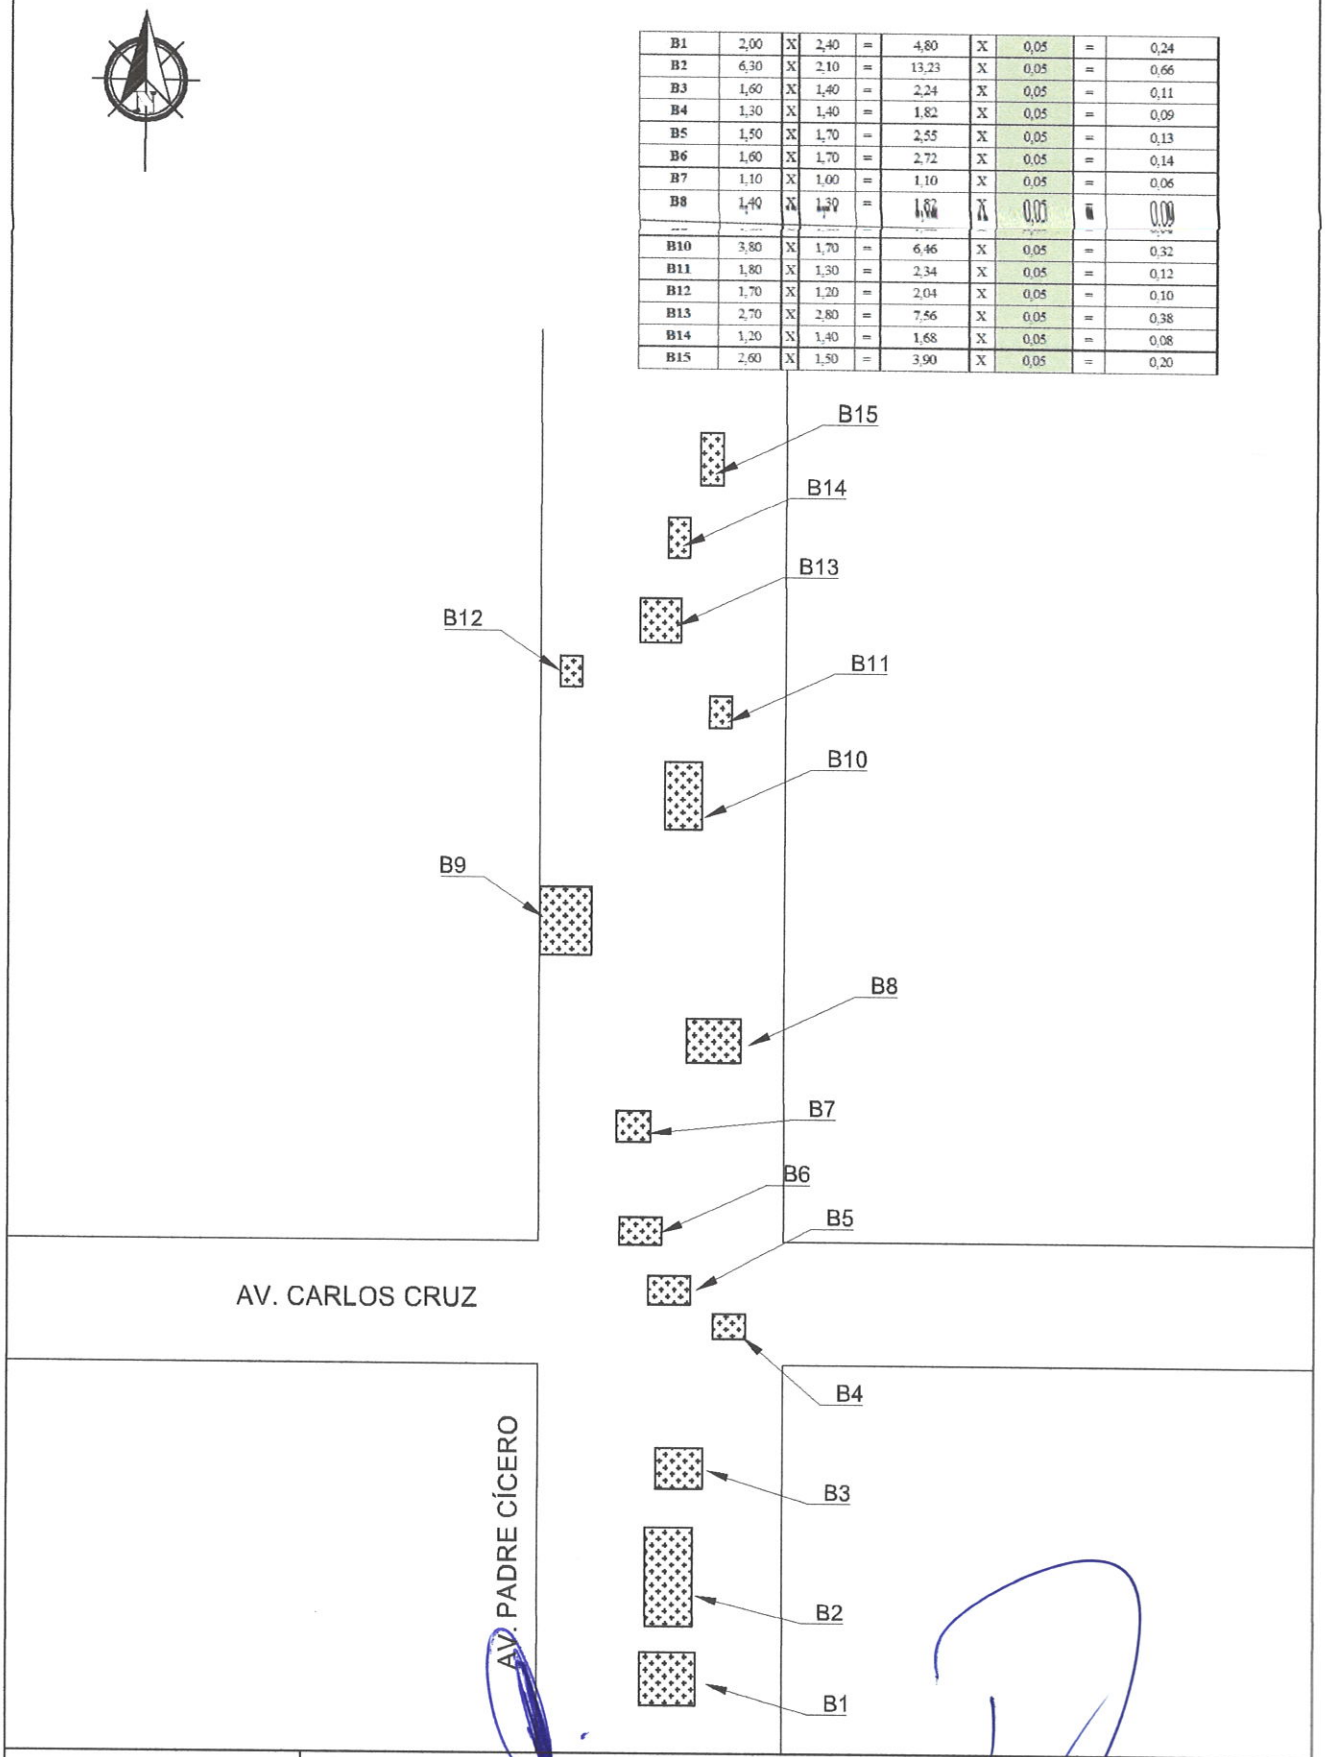

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 14	**LOCALIDADE:** AV. PADRE CÍCERO	**BAIRRO:** SANTA TEREZA	**PRANCHA:** 1/5
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 09/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	**LONG.:** 464229 **LAT.:** 9202402

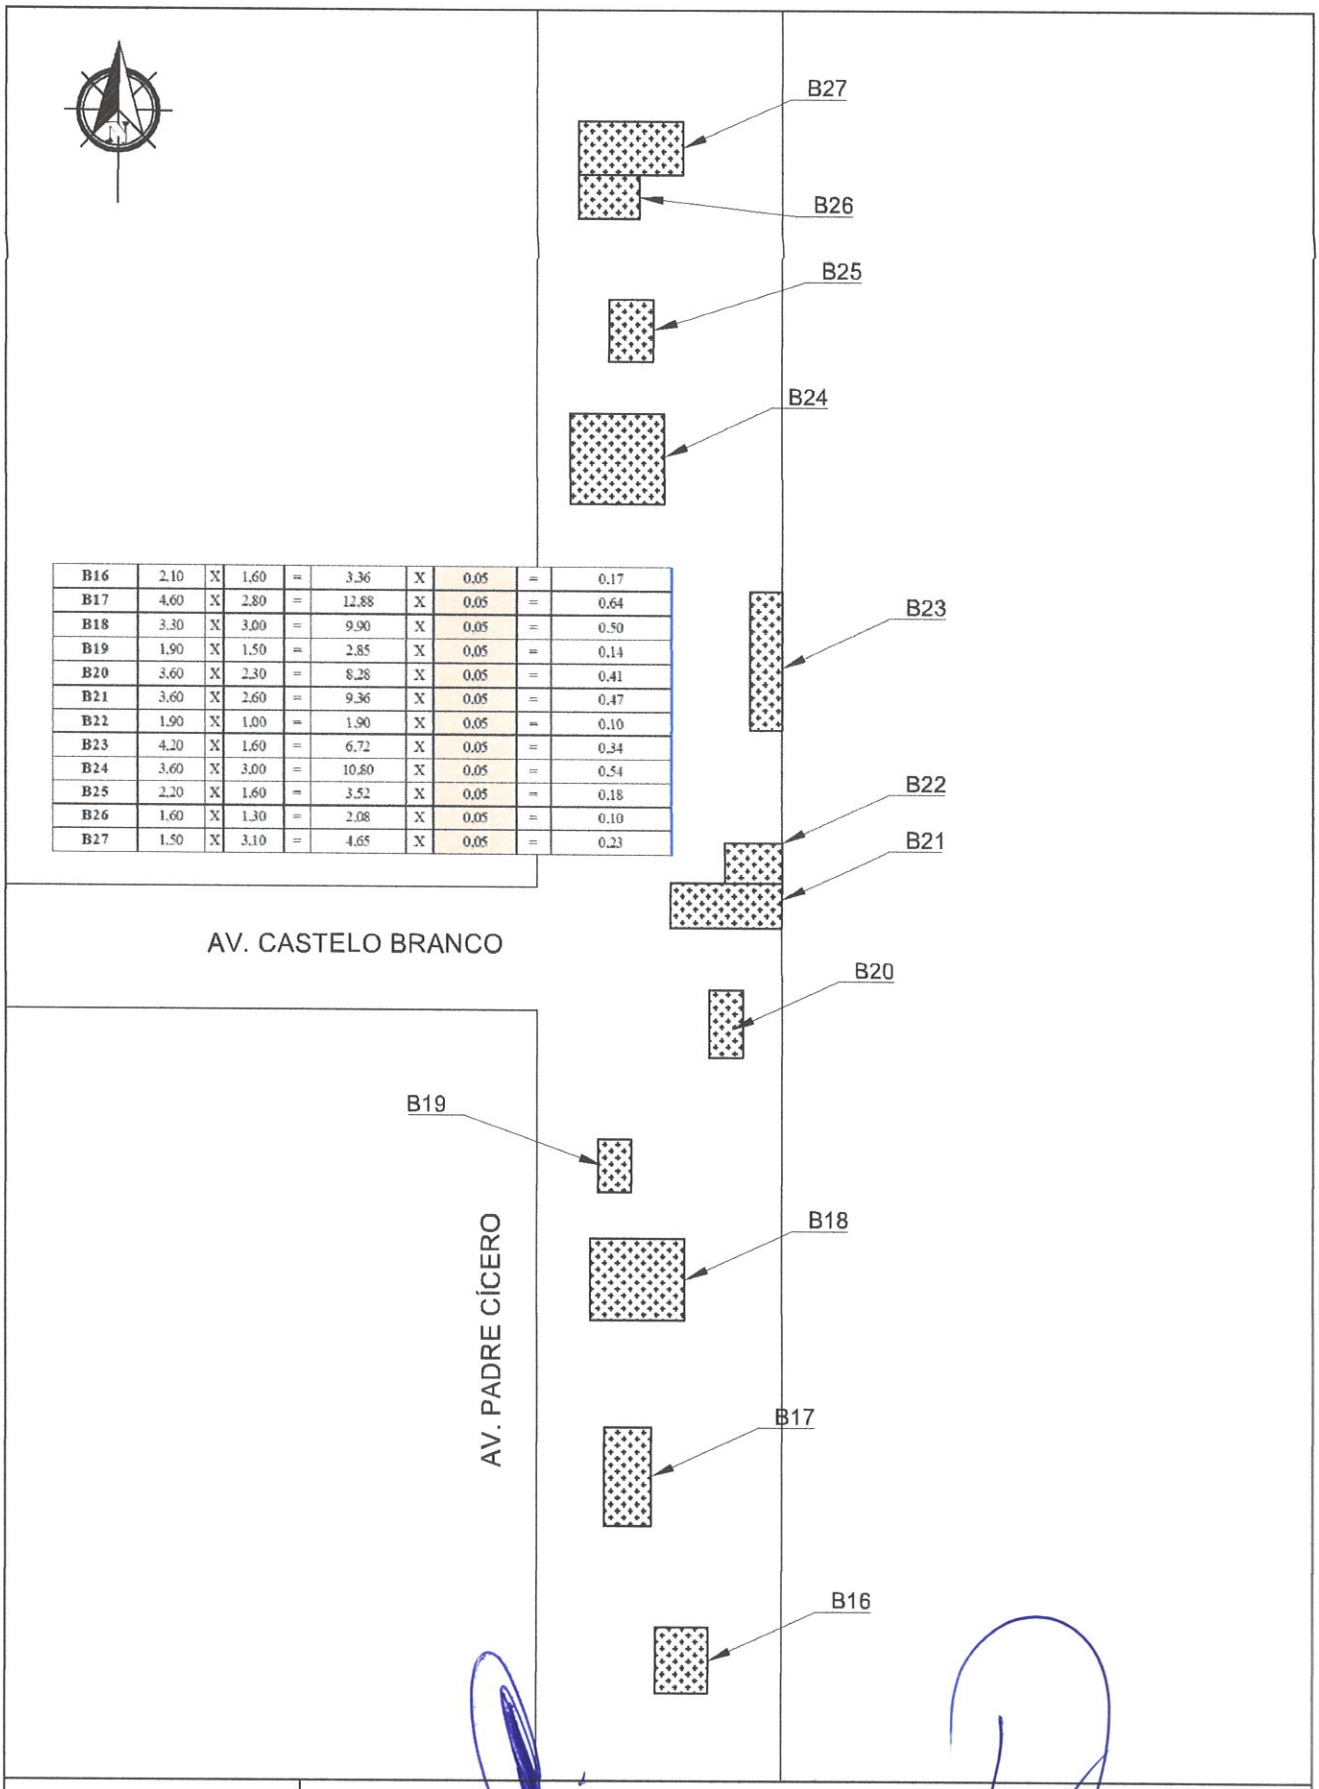

B16	2.10	X	1.60	=	3.36	X	0.05	=	0.17
B17	4.60	X	2.80	=	12.88	X	0.05	=	0.64
B18	3.30	X	3.00	=	9.90	X	0.05	=	0.50
B19	1.90	X	1.50	=	2.85	X	0.05	=	0.14
B20	3.60	X	2.30	=	8.28	X	0.05	=	0.41
B21	3.60	X	2.60	=	9.36	X	0.05	=	0.47
B22	1.90	X	1.00	=	1.90	X	0.05	=	0.10
B23	4.20	X	1.60	=	6.72	X	0.05	=	0.34
B24	3.60	X	3.00	=	10.80	X	0.05	=	0.54
B25	2.20	X	1.60	=	3.52	X	0.05	=	0.18
B26	1.60	X	1.30	=	2.08	X	0.05	=	0.10
B27	1.50	X	3.10	=	4.65	X	0.05	=	0.23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adrianoide Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 14	**LOCALIDADE:** AV. PADRE CÍCERO	**BAIRRO:** TRIÂNGULO	**PRANCHA:** 2/5
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 464077 **LAT.:** 9201828
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 09/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

B28	1,50	X	1,30	=	1,95	X	0,05	=	0,10
B29	1,70	X	1,20	=	2,04	X	0,05	=	0,10
B30	1,40	X	1,00	=	1,40	X	0,05	=	0,07

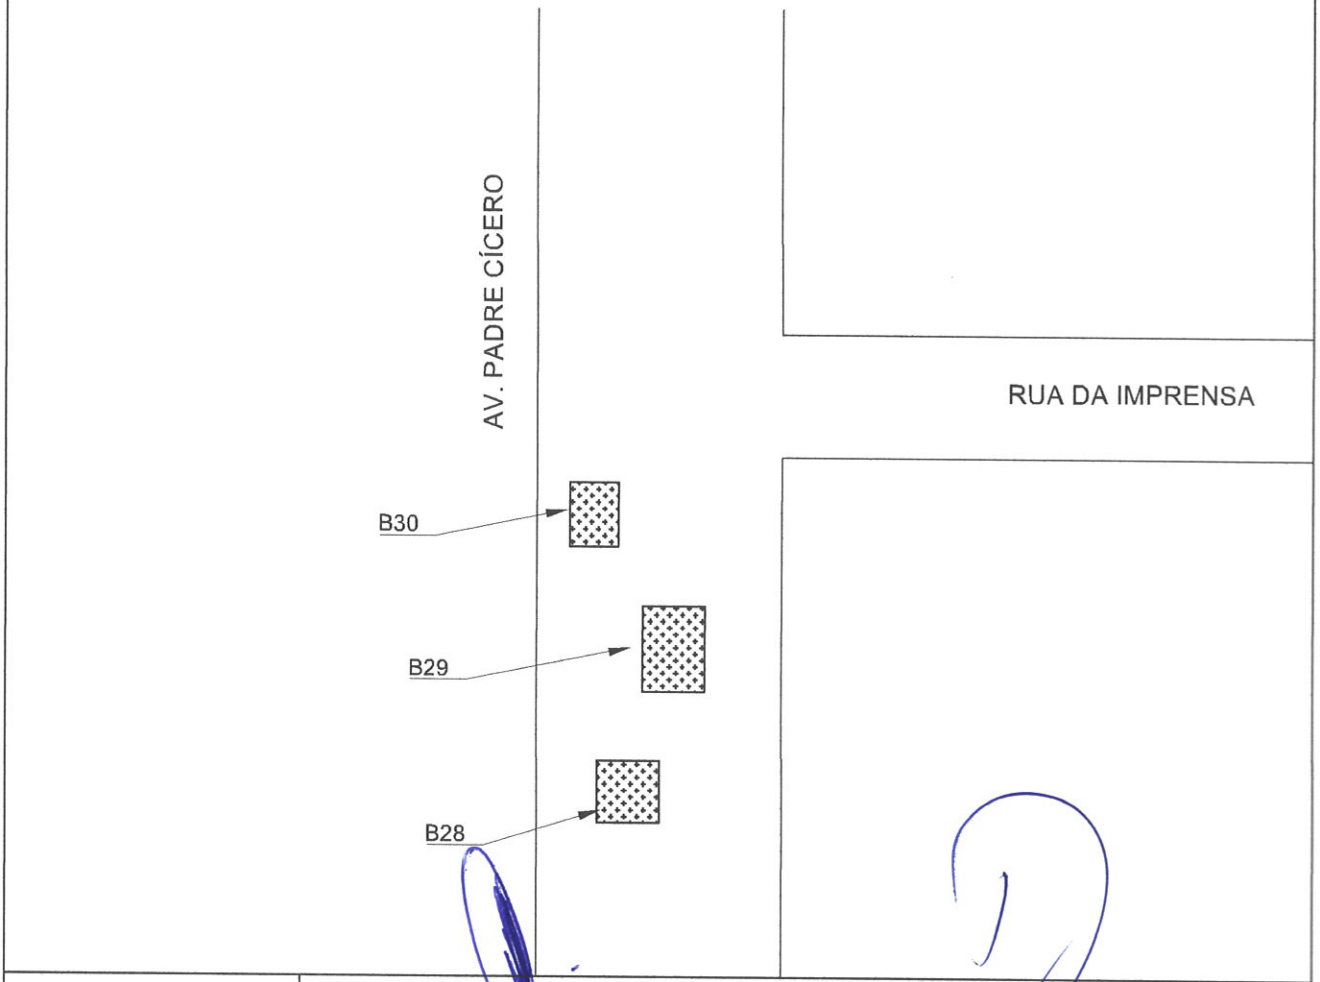

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 14	**LOCALIDADE:** AV. PADRE CÍCERO	**BAIRRO:** TRIÂNGULO	**PRANCHA:** 3/5
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 463941 **LAT.:** 9201411
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 09/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

B31	2,60	X	1,30	=	3,38	X	0,05	=	0,17
B32	1,40	X	1,10	=	1,54	X	0,05	=	0,08
B33	3,50	X	1,10	=	3,85	X	0,05	=	0,19
B34	0,50	X	0,50	=	0,25	X	0,05	=	0,01
B35	0,80	X	0,60	=	0,48	X	0,05	=	0,02
B36	1,10	X	0,90	=	0,99	X	0,05	=	0,05
B37	0,50	X	0,50	=	0,25	X	0,05	=	0,01
B38	1,40	X	1,80	=	2,52	X	0,05	=	0,13
B39	1,60	X	1,10	=	1,76	X	0,05	=	0,09
B40	0,80	X	0,80	=	0,64	X	0,05	=	0,03
B41	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06
B42	1,40	X	1,60	=	2,24	X	0,05	=	0,11
B43	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,05	=	0,07
B44	1,50	X	1,10	=	1,65	X	0,05	=	0,08

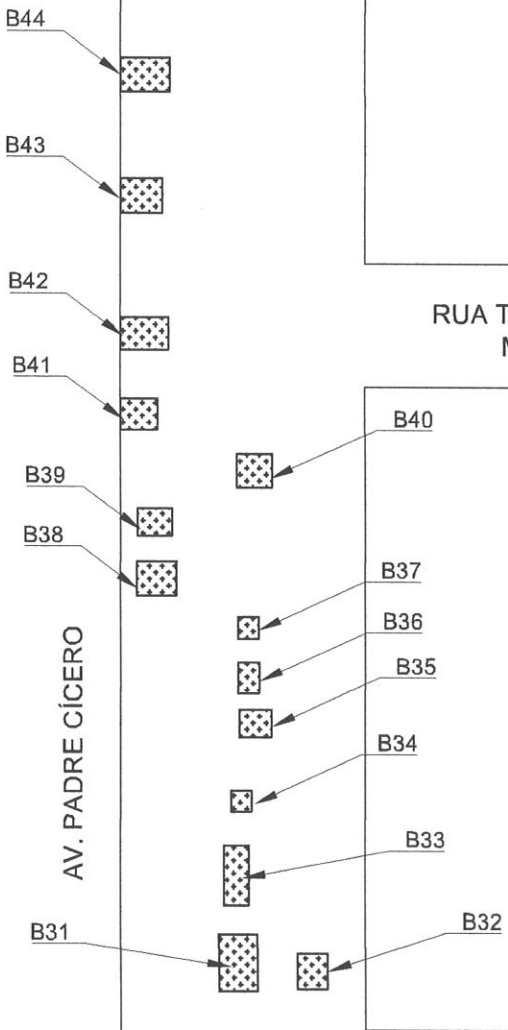

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 14	**LOCALIDADE:** AV. PADRE CÍCERO	**BAIRRO:** SANTA TEREZA	**PRANCHA:** 4/5
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 12/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	**LONG.:** 464049 **LAT.:** 9201700

B45	1,00	X	0,80	=	0,80	X	0,05	=	0,04
B46	1,60	X	0,80	=	1,28	X	0,05	=	0,06
B47	1,30	X	1,10	=	1,43	X	0,05	=	0,07
B48	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,05	=	0,06
B49	2,30	X	1,30	=	2,99	X	0,05	=	0,15
B50	1,90	X	1,20	=	2,28	X	0,05	=	0,11
B51	0,80	X	0,40	=	0,32	X	0,05	=	0,02
B52	0,70	X	0,50	=	0,35	X	0,05	=	0,02
B53	2,40	X	1,90	=	4,56	X	0,05	=	0,23
B54	6,40	X	3,20	=	20,48	X	0,05	=	1,02
B55	3,00	X	1,80	=	5,40	X	0,05	=	0,27
			ÁREA	=	**200,58**		**VOLUME**	=	**10,03**

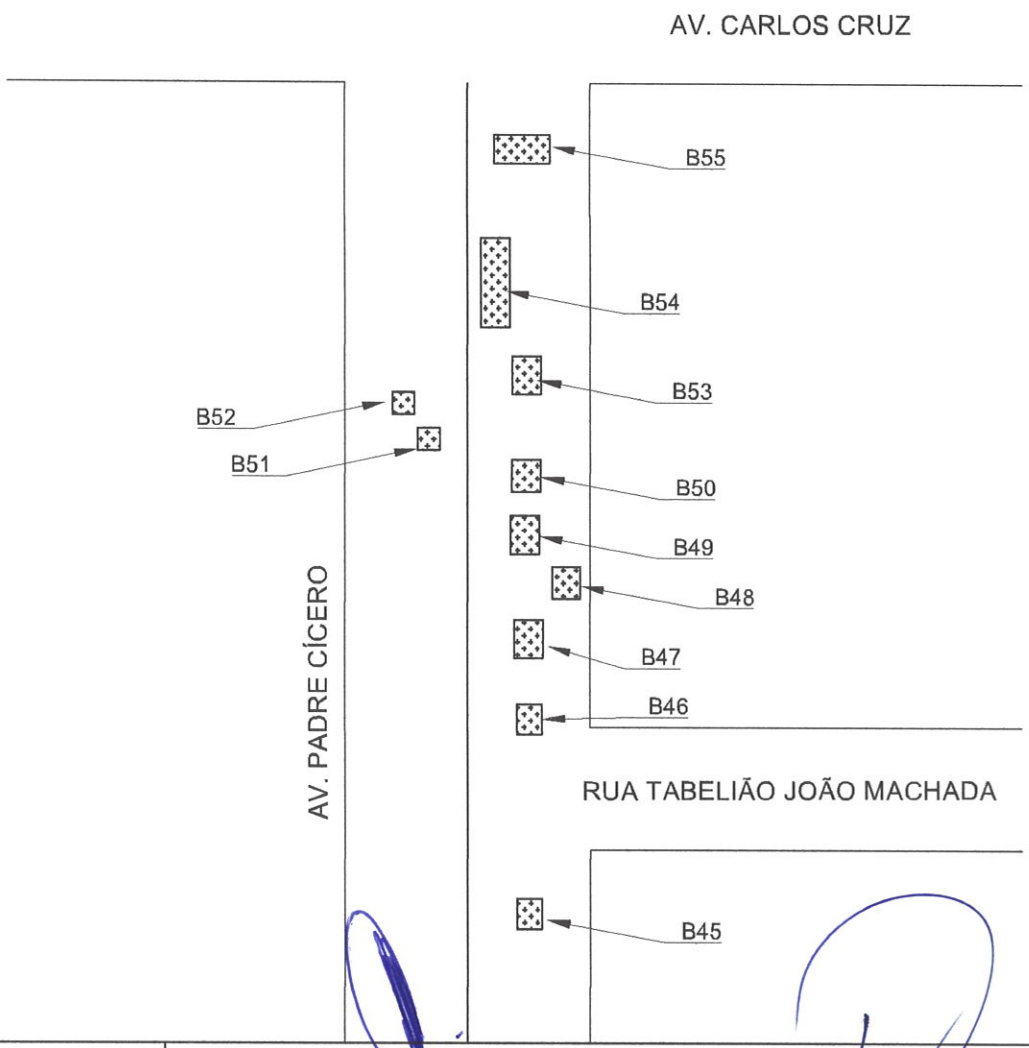

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 14	**LOCALIDADE:** AV. PADRE CÍCERO	**BAIRRO:** SANTA TEREZA	**PRANCHA:** 5/5
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO		**COORDENADAS UTM**	
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 18/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	**LONG.:** 464111 **LAT.:** 9201929

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
14	AVENIDA PADRE CÍCERO	DIVERSOS

TRECHO

ENTRE A RUA FISCAL JOSÉ SOARES E A RUA DA IMPRENSA

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	09/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	14	AVENIDA PADRE CÍCERO					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	200,58	R$ 1,84	R$	369,07
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM					
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	10,03	R$ 1.696,15	R$	17.010,69
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/ TRANSP)	M2	200,58	R$ 0,33	R$	66,19
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,08	R$ 3.062,93	R$	245,74
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	1,53	R$ 472,85	R$	723,67
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	25,70	R$ 30,12	R$	774,15
					TOTAL	R$	19.189,51

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

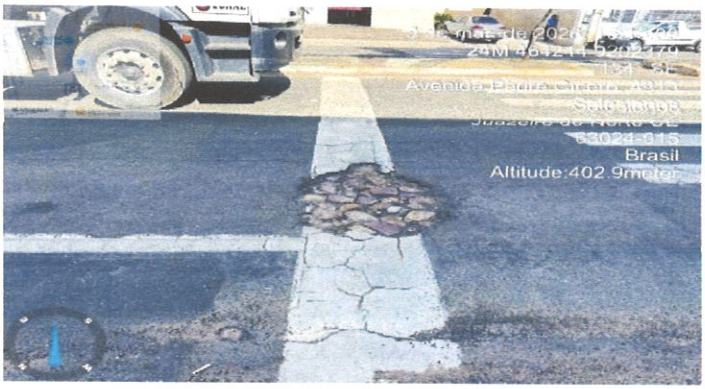

FOTO 01 - ANTES

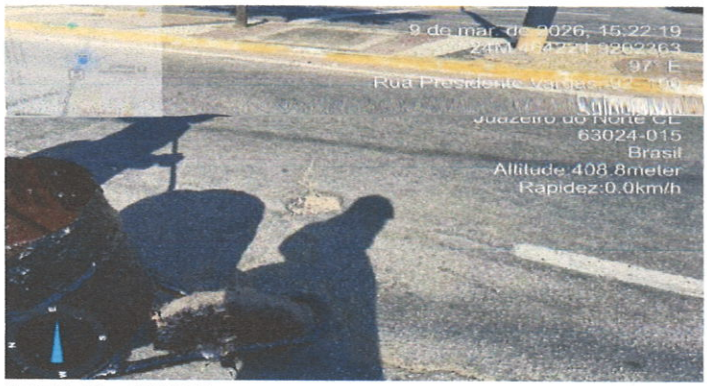

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

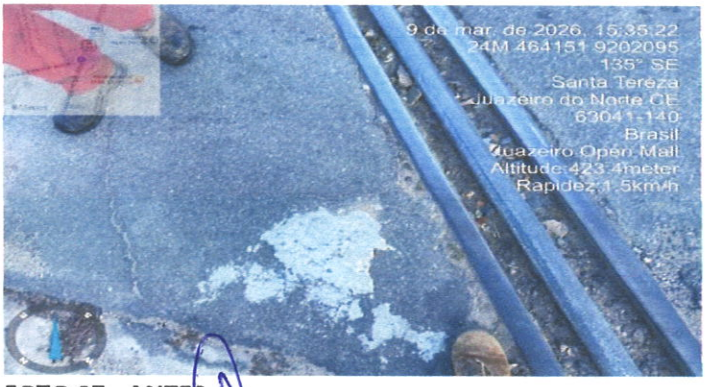

FOTO 07 - ANTES

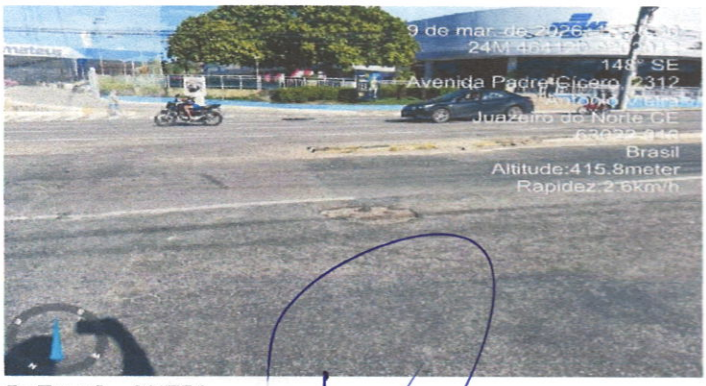

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - ANTES

FOTO 10 - ANTES

FOTO 11 - ANTES

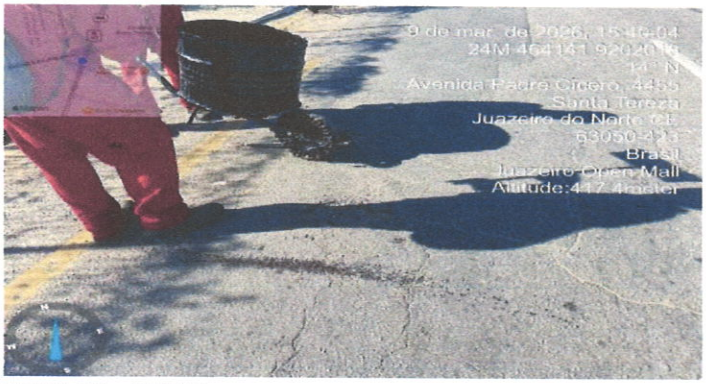

FOTO 12 - ANTES

FOTO 13 - ANTES

FOTO 14 - ANTES

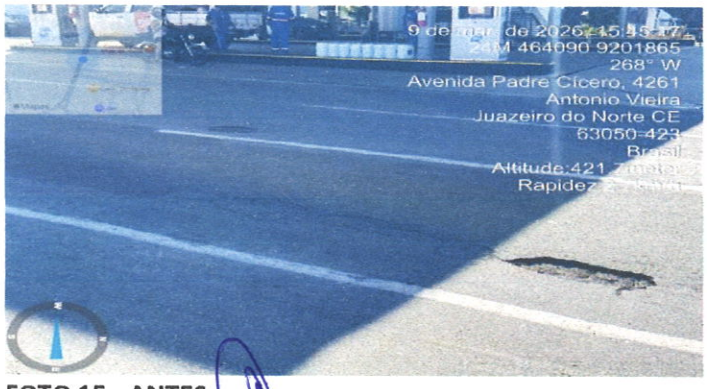

FOTO 15 - ANTES

FOTO 16 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

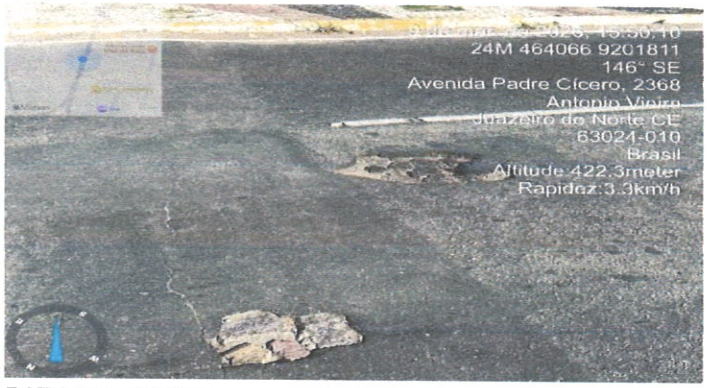

FOTO 17 - ANTES

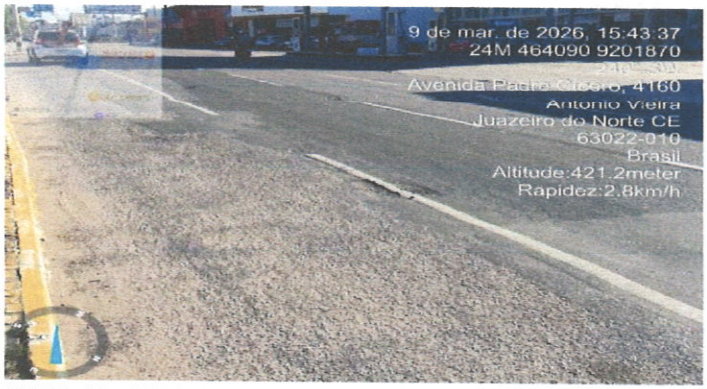

FOTO 18 - ANTES

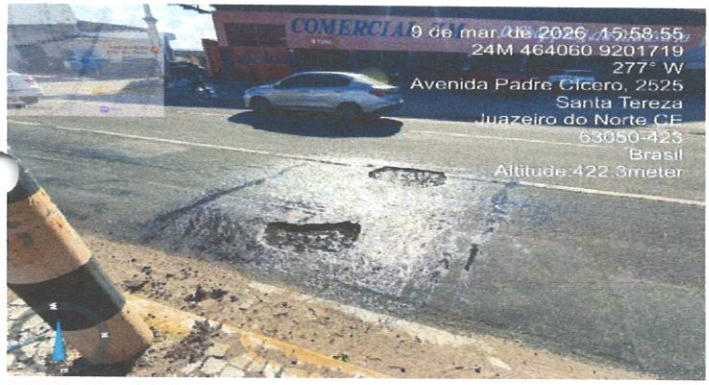

FOTO 19 - ANTES

FOTO 20 - ANTES

FOTO 21 - ANTES

FOTO 22 - ANTES

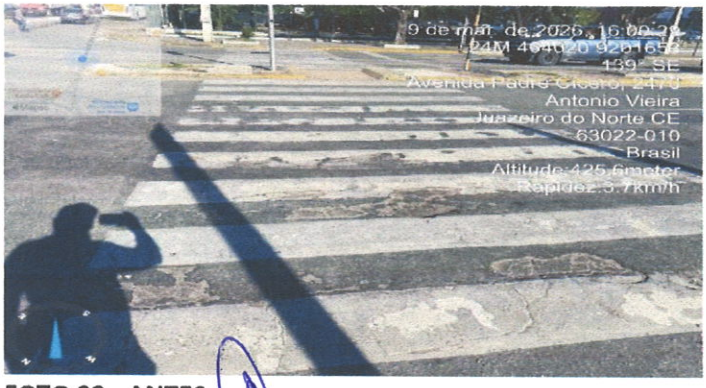

FOTO 23 - ANTES

FOTO 24 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

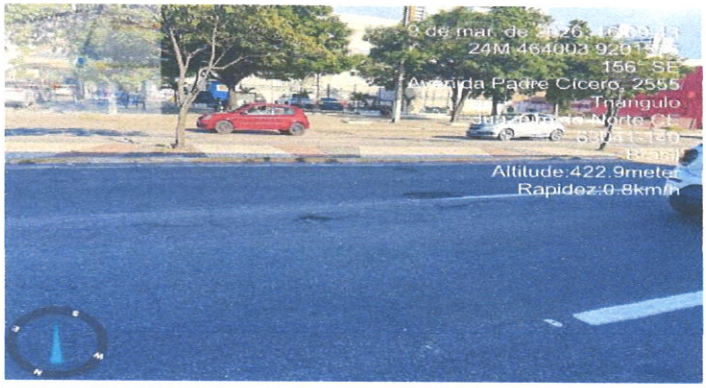

FOTO 25 - ANTES

FOTO 26 - ANTES

FOTO 27 - ANTES

FOTO 28 - ANTES

FOTO 29 - ANTES

FOTO 30 - ANTES

FOTO 31 - ANTES

FOTO 32 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 33 - ANTES

FOTO 34 - ANTES

FOTO 35 - ANTES

FOTO 36 - ANTES

FOTO 37 - ANTES

FOTO 38 - ANTES

FOTO 39 - B1

FOTO 40 - B2

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 41 - B3

FOTO 42 - B4

FOTO 43 - B5 E B6

FOTO 44 - B7

FOTO 45 - B8

FOTO 46 - B9

FOTO 47 - B10

FOTO 48 - B11 E B12

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng° Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 49 - B13

FOTO 50 - B14 E B15

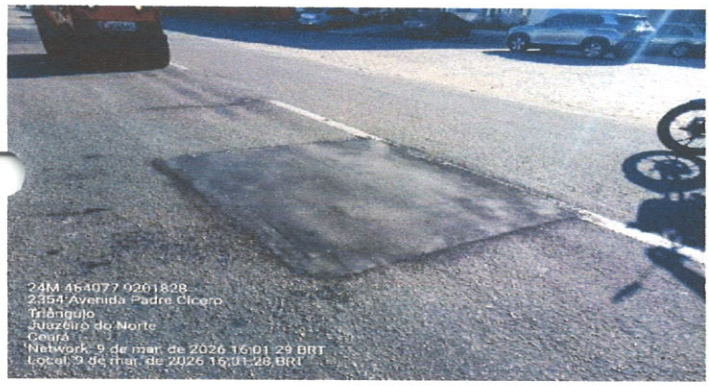

FOTO 51 - B16

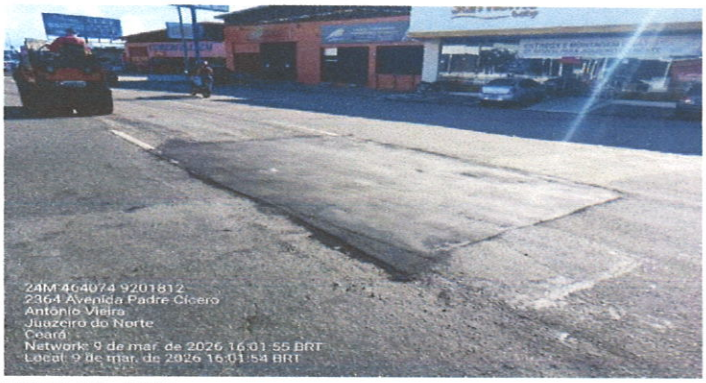

FOTO 52 - B17

FOTO 53 - B18

FOTO 54 - B19

FOTO 55 - B20

FOTO 56 - B21 E B22

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

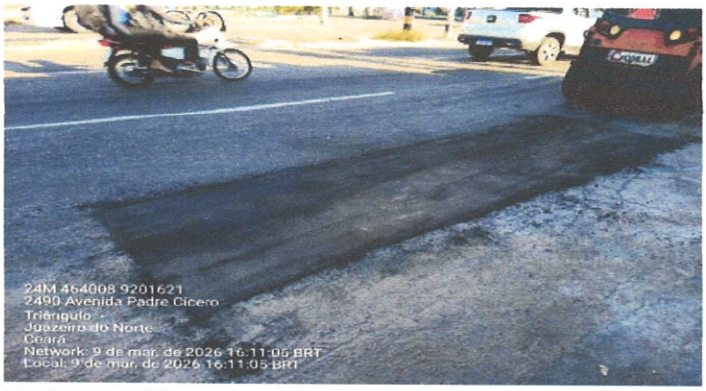

FOTO 57 - B23

FOTO 58 - B24

FOTO 59 - B25

FOTO 60 - B26 E B27

FOTO 61 - B28

FOTO 62 - B29

FOTO 63 - B30

FOTO 64 - B31 E B32

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 65 - B33

FOTO 66 - B34 E B35

FOTO 67 - B36 E B37

FOTO 68 - B38 E B39

FOTO 69 - B40

FOTO 70 - B41 E B42

FOTO 71 - B43

FOTO 72 - B44

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 73 - B45

FOTO 74 - B46

FOTO 75 - B47

FOTO 76 - B48

FOTO 77 - B49

FOTO 78 - B50 E B53

FOTO 79 - B51 E B52

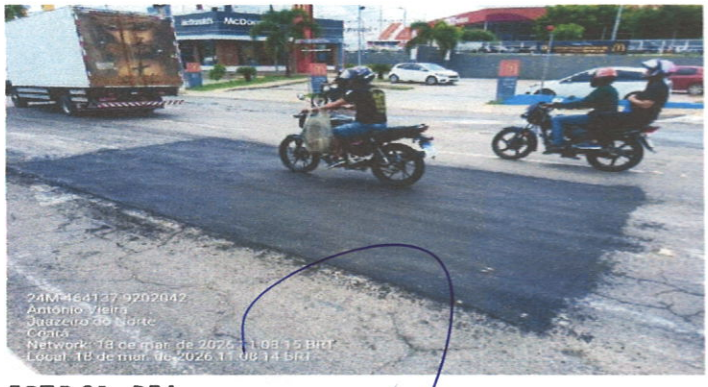

FOTO 80 - B54

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 81 - B55

FOTO 82 - B56 A B59

FOTO 83 - B60 A B63

FOTO 84 - B64 A B67

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 09.03.2026-02	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 9 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

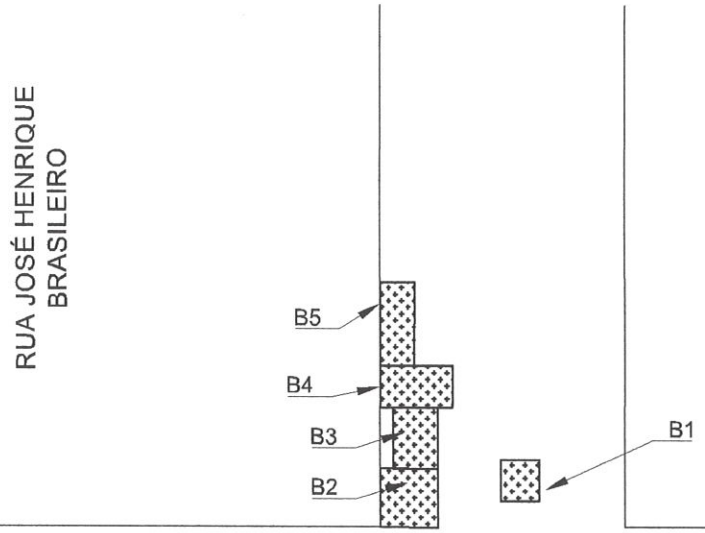

B1	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09
B2	2,00	X	2,00	=	4,00	X	0,08	=	0,32
B3	1,90	X	2,70	=	5,13	X	0,08	=	0,41
B4	2,70	X	3,70	=	9,99	X	0,08	=	0,80
B5	1,50	X	3,10	=	4,65	X	0,08	=	0,37

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 15	**LOCALIDADE:** RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO	**BAIRRO:** TIRADENTES	**PRANCHA:** 1/2
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO		**COORDENADAS UTM**	
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 09/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	**LONG.:** 466959 **LAT.:** 9200931

AV. CASTELO BRANCO

RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO



B6	1,80	X	1,60	=	2,88	X	0,08	=	0,23
B7	4,40	X	1,80	=	7,92	X	0,08	=	0,63
B8	2,20	X	0,80	=	1,76	X	0,08	=	0,14
B9	2,40	X	0,60	=	1,44	X	0,08	=	0,12
			ÁREA	=	**39,59**		**VOLUME**	=	**3,11**

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 15	**LOCALIDADE:** RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO	**BAIRRO:** TIRADENTES	**PRANCHA:** 2/2
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 466956 **LAT.:** 9200919
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 11/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID: 15

ENDEREÇO: RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO

BAIRRO: TIRADENTES

TRECHO: ENCONTRO COM A AV. CASTELO BRANCO

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM

DATA MEDIÇÃO: 09/03/2026

EMPRESA EXECUTORA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO: N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	15	RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO						
ITEM	**COD**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID**	**QTDE**	**P. UNIT. C/ B.D.I**		**P. TOTAL C/ B.D.I**	
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	39,59	R$	1,84	R$	72,85
2.0		**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM**						
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	3,11	R$	1.696,15	R$	5.279,44
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	39,59	R$	0,33	R$	13,06
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,02	R$	3.062,93	R$	48,50
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,47	R$	472,85	R$	220,31
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	7,97	R$	30,12	R$	239,99
						TOTAL	R$	5.874,15

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - B1 A B5

FOTO 04 - B6 A B9

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 09.03.2026-03	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) AVENIDA ANA SARAIVA DE MENEZES.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 9 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

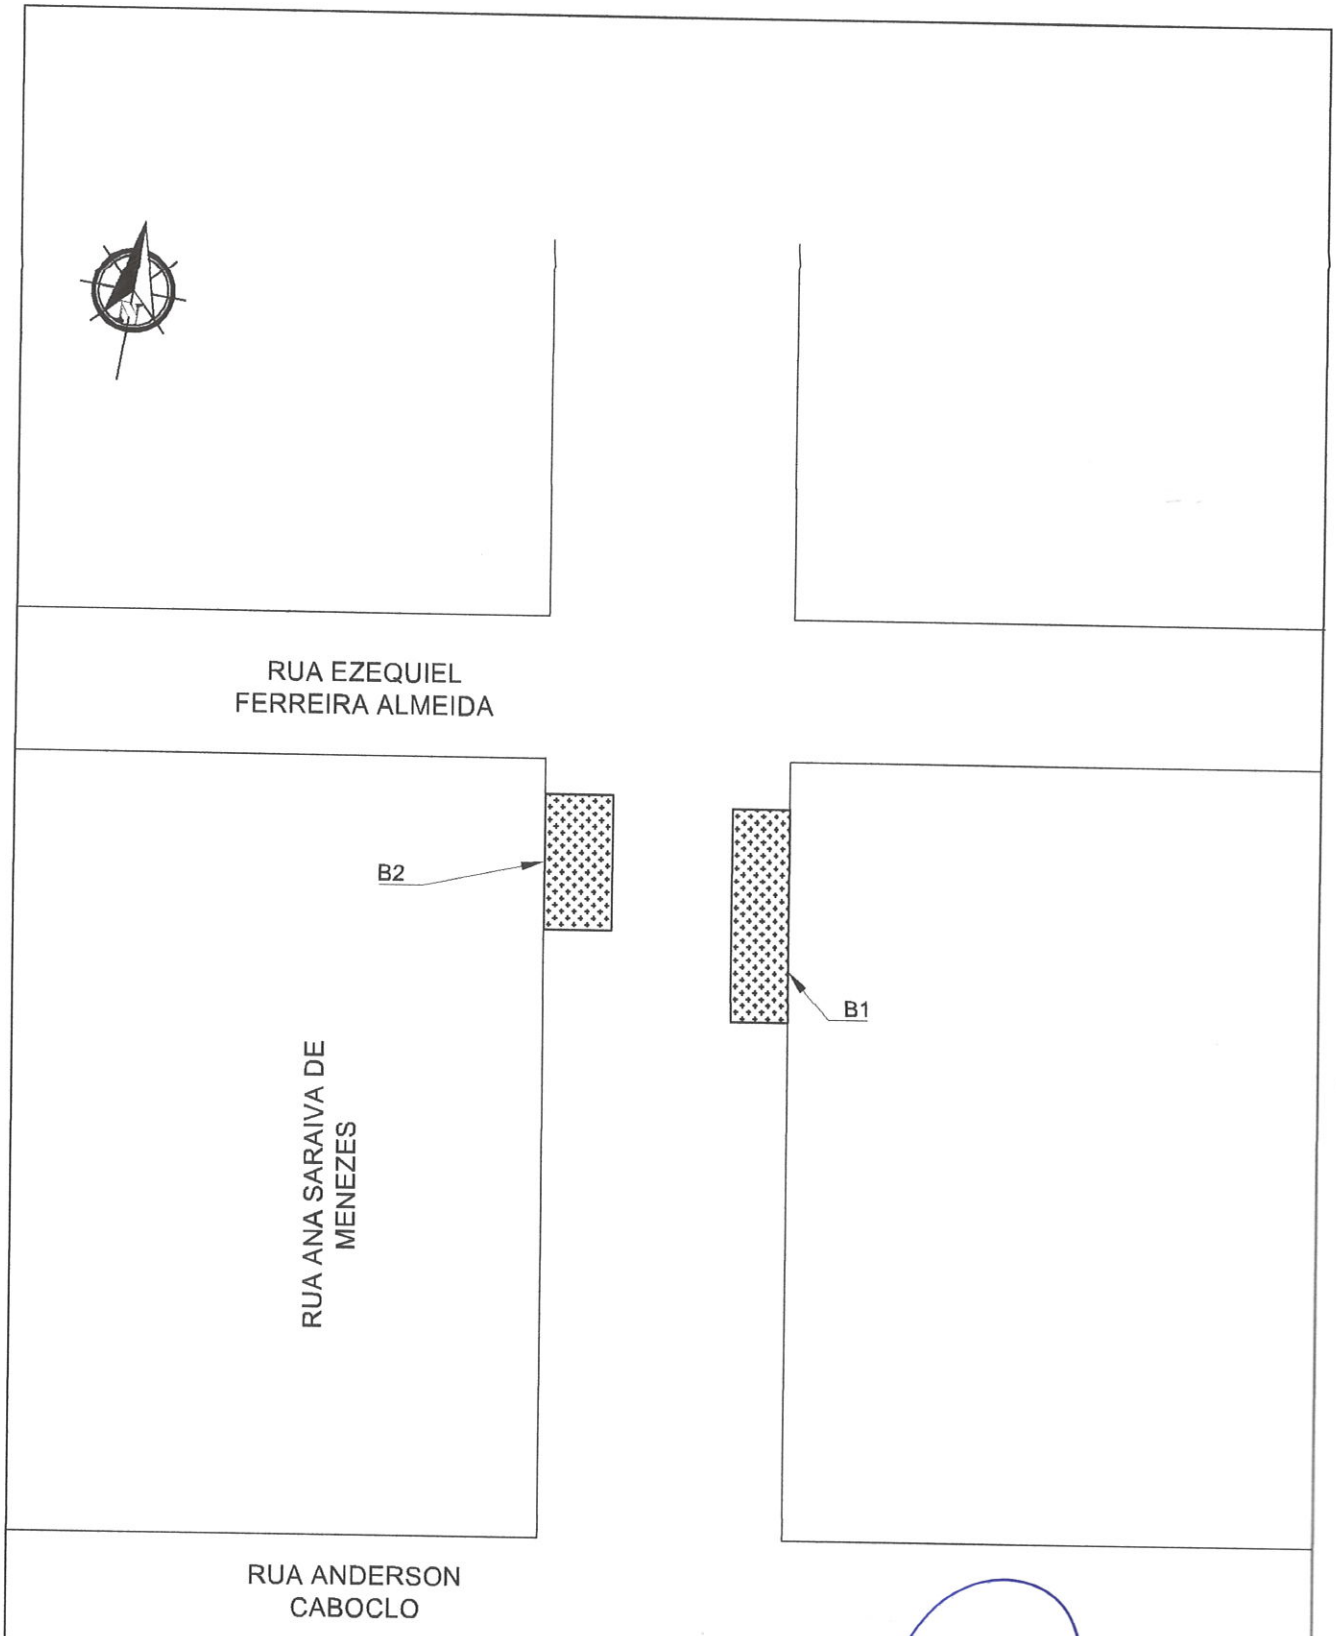

B1	5,00	X	2,80	=	14,00	X	0,08	=	1,12
B2	8,80	X	2,70	=	23,76	X	0,08	=	1,90
			ÁREA	=	**37,76**		**VOLUME**	=	**3,02**

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 16	**LOCALIDADE:** AV. ANA SARAIVA DE MENEZES	**BAIRRO:** FREI DAMIÃO	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 09/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	**LONG.:** 462979 **LAT.:** 9199192

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
16	AVENIDA ANA SARAIVA DE MENEZES	JARDIM GONZAGA

TRECHO

ENTRE A RUA ANDERSON CABOCLO E A RUA JOSE SALVIANO DE SOUZA

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	09/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	16	AVENIDA ANA SARAIVA DE MENEZES				
ITEM	**COD**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID**	**QTDE**	**P. UNIT. C/ B.D.I**	**P. TOTAL C/ B.D.I**
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	37,76	R$ 1,84	R$ 69,48
2.0		**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM**				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	3,02	R$ 1.696,15	R$ 5.123,73
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	37,76	R$ 0,33	R$ 12,46
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,02	R$ 3.062,93	R$ 46,26
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,45	R$ 472,85	R$ 213,69
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	7,73	R$ 30,12	R$ 232,91
					TOTAL	R$ 5.698,53

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

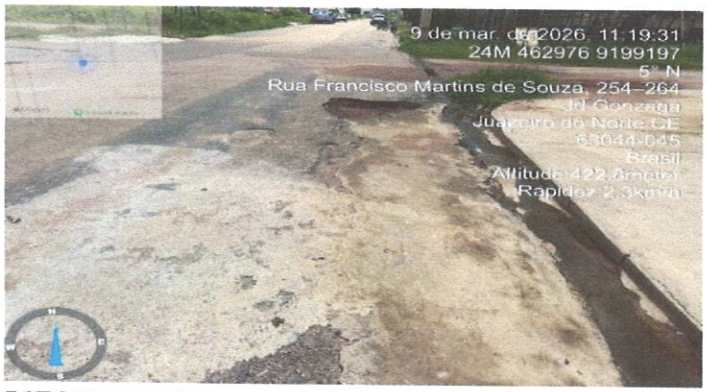

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - B1

FOTO 04 - B2

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 09.03.2026-04	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA ANITA NEVES.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 9 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

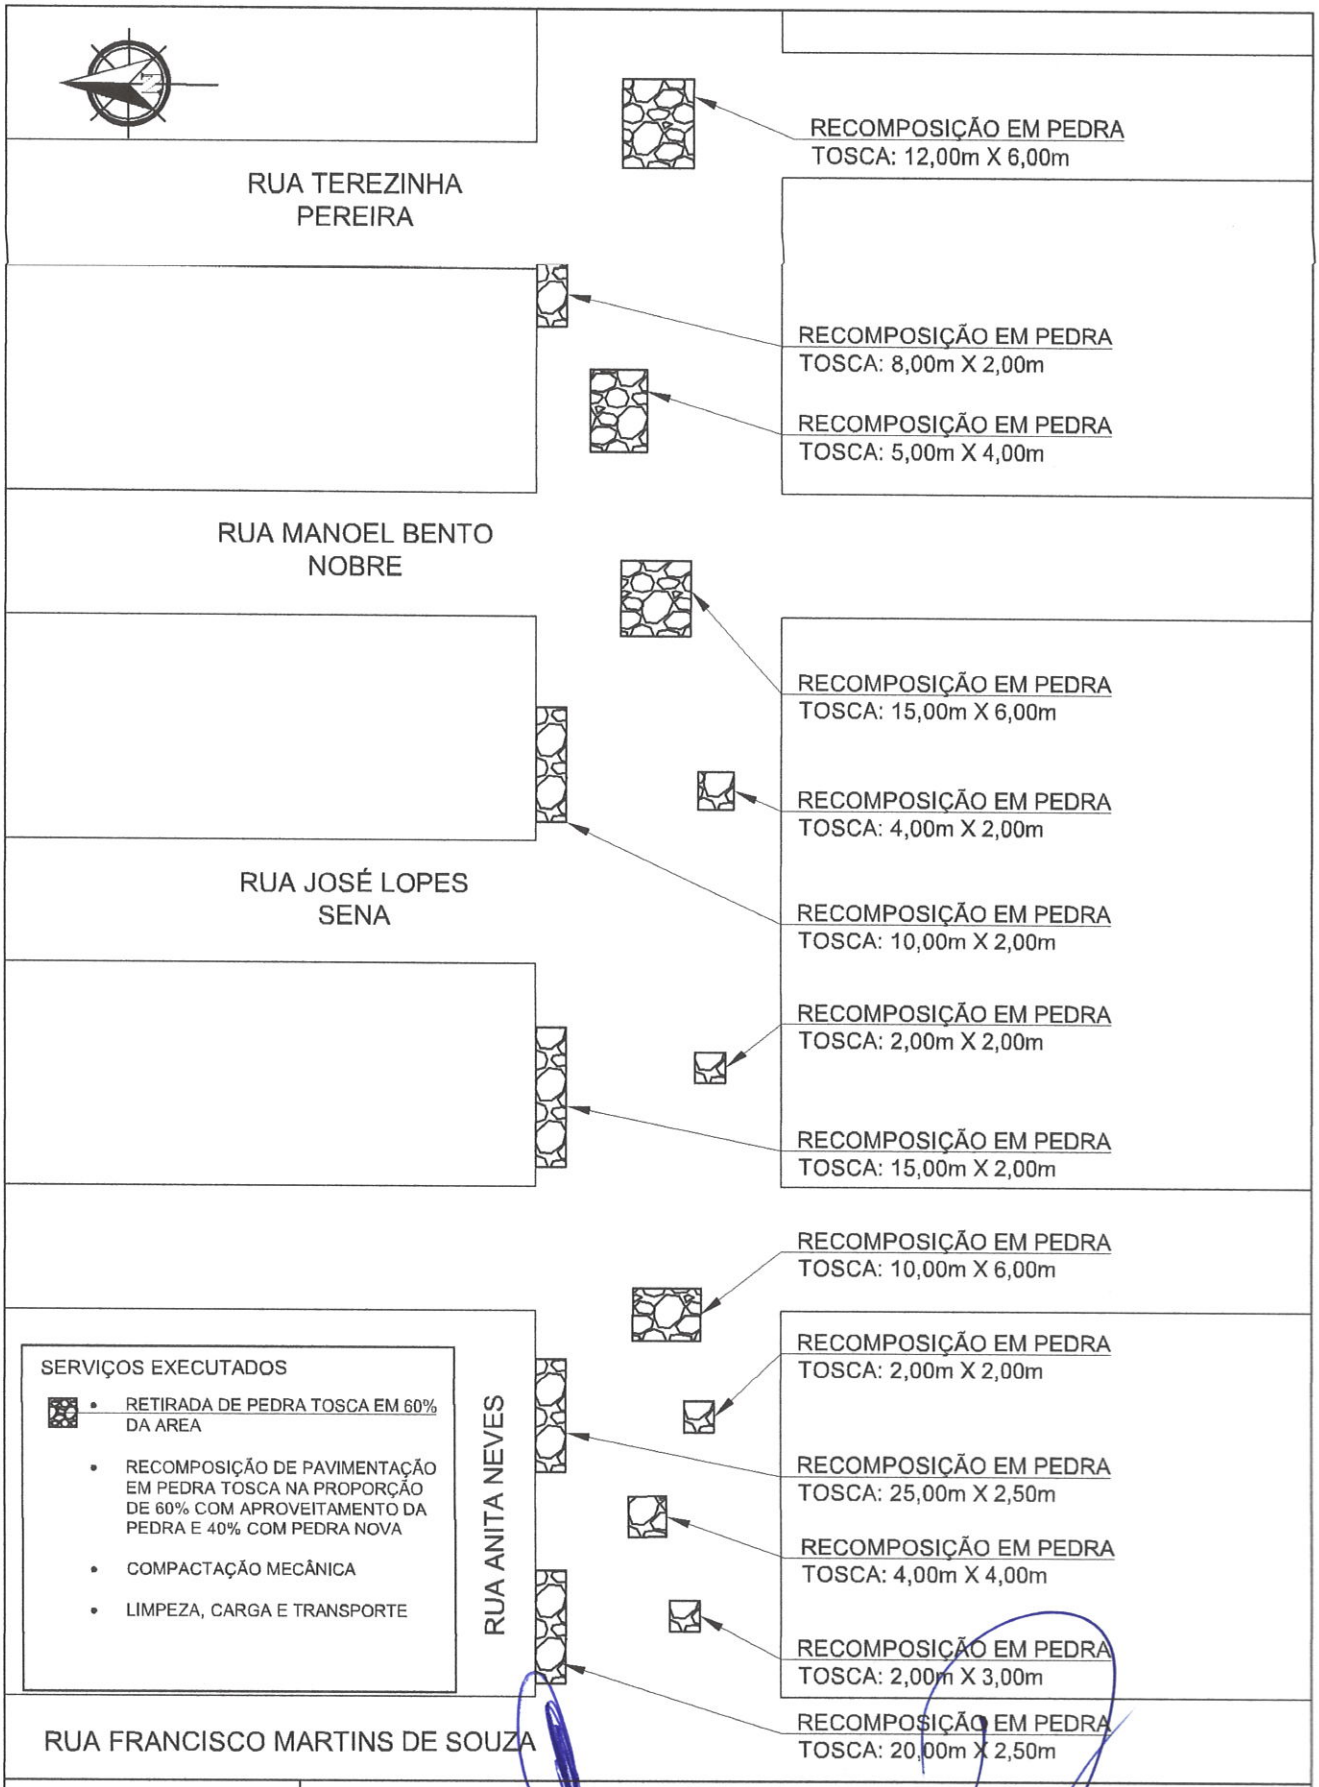

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 17	**LOCALIDADE:** RUA ANITA NEVES	**BAIRRO:** JARDIM GONZAGA	**PRANCHA:** 1/2
SERVIÇO EXECUTADO: RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 463422 **LAT.:** 9197414
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	**DATA:** 31/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	

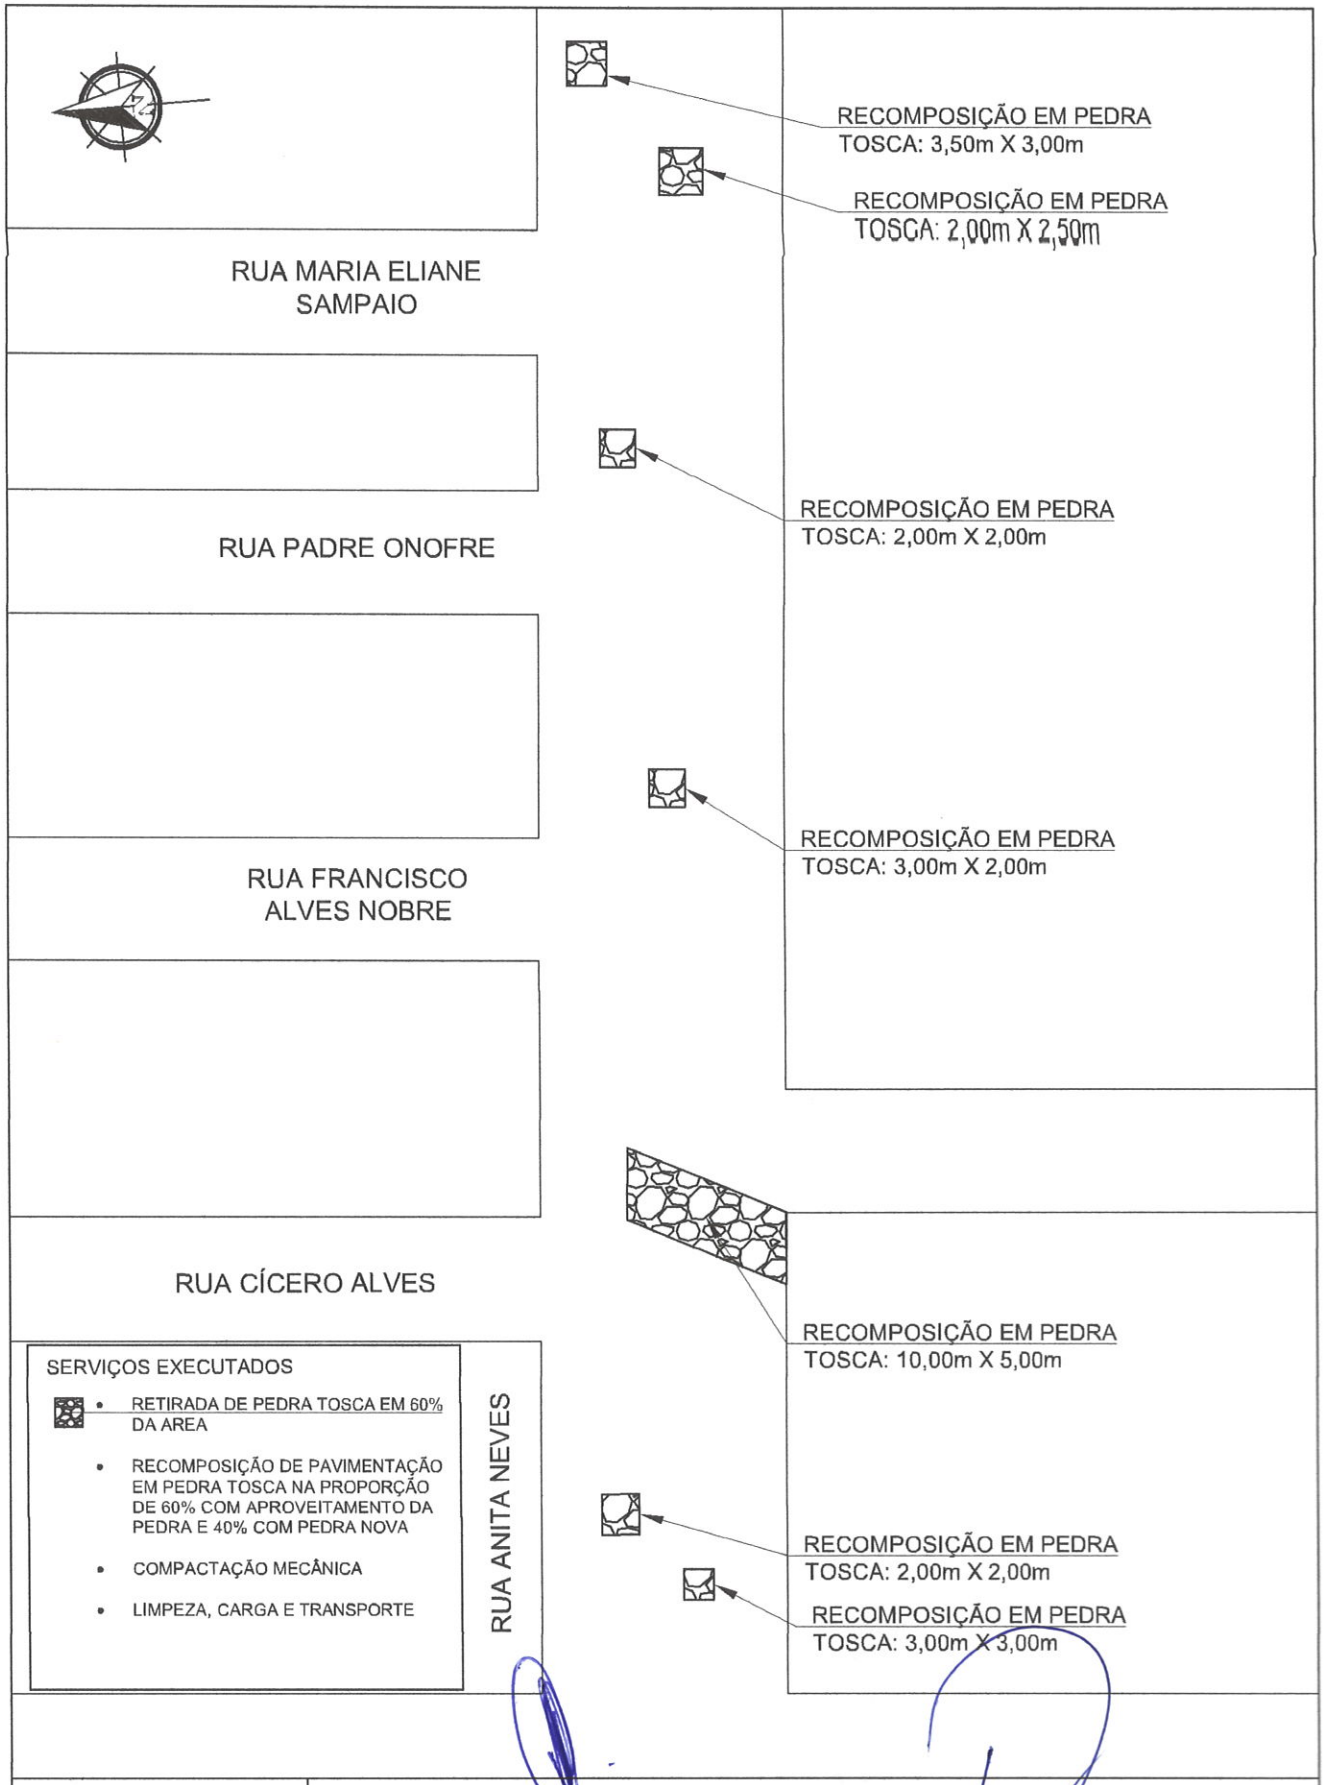

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 17	**LOCALIDADE:** RUA ANITA NEVES	**BAIRRO:** JARDIM GONZAGA	**PRANCHA:** 2/2
SERVIÇO EXECUTADO: RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 463422 **LAT.:** 9197414
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	**DATA:** 31/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID: 17

ENDEREÇO: RUA ANITA NEVES

BAIRRO: JARDIM GONZAGA

TRECHO: ENTRE A RUA FRANCISCO MARTINS DE SOUZA E A RUA EDVALDO ALVES DA CRUZ

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO: 31/03/2026

EMPRESA EXECUTORA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO: N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	17.0	RUA ANITA NEVES						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I		P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	551,00	R$	1,84	R$	1.013,84
1.4	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	330,60	R$	14,68	R$	4.853,21
1.13	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	330,60	R$	1,35	R$	446,31
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	71,63	R$	4,99	R$	357,43
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	71,63	R$	41,23	R$	2.953,30
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM						
2.9	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	220,40	R$	78,14	R$	17.222,05
2.11	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	330,60	R$	37,98	R$	12.556,19
					TOTAL		R$	39.402,33

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (1)

FOTO 02 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (2)

FOTO 03 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (3)

FOTO 04 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (4)

FOTO 05 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (5)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO**
09.03.2026-05	CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO	**DATA DO CONTRATO**
2025.09.02-0002	02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A)	
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO:	
AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF	**N° DO TELEFONE/FAX**
07.195.191/0001-33	(85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA PADRE JOÃO MORETTI.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO**
12 (DOZE) MESES	12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 9 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

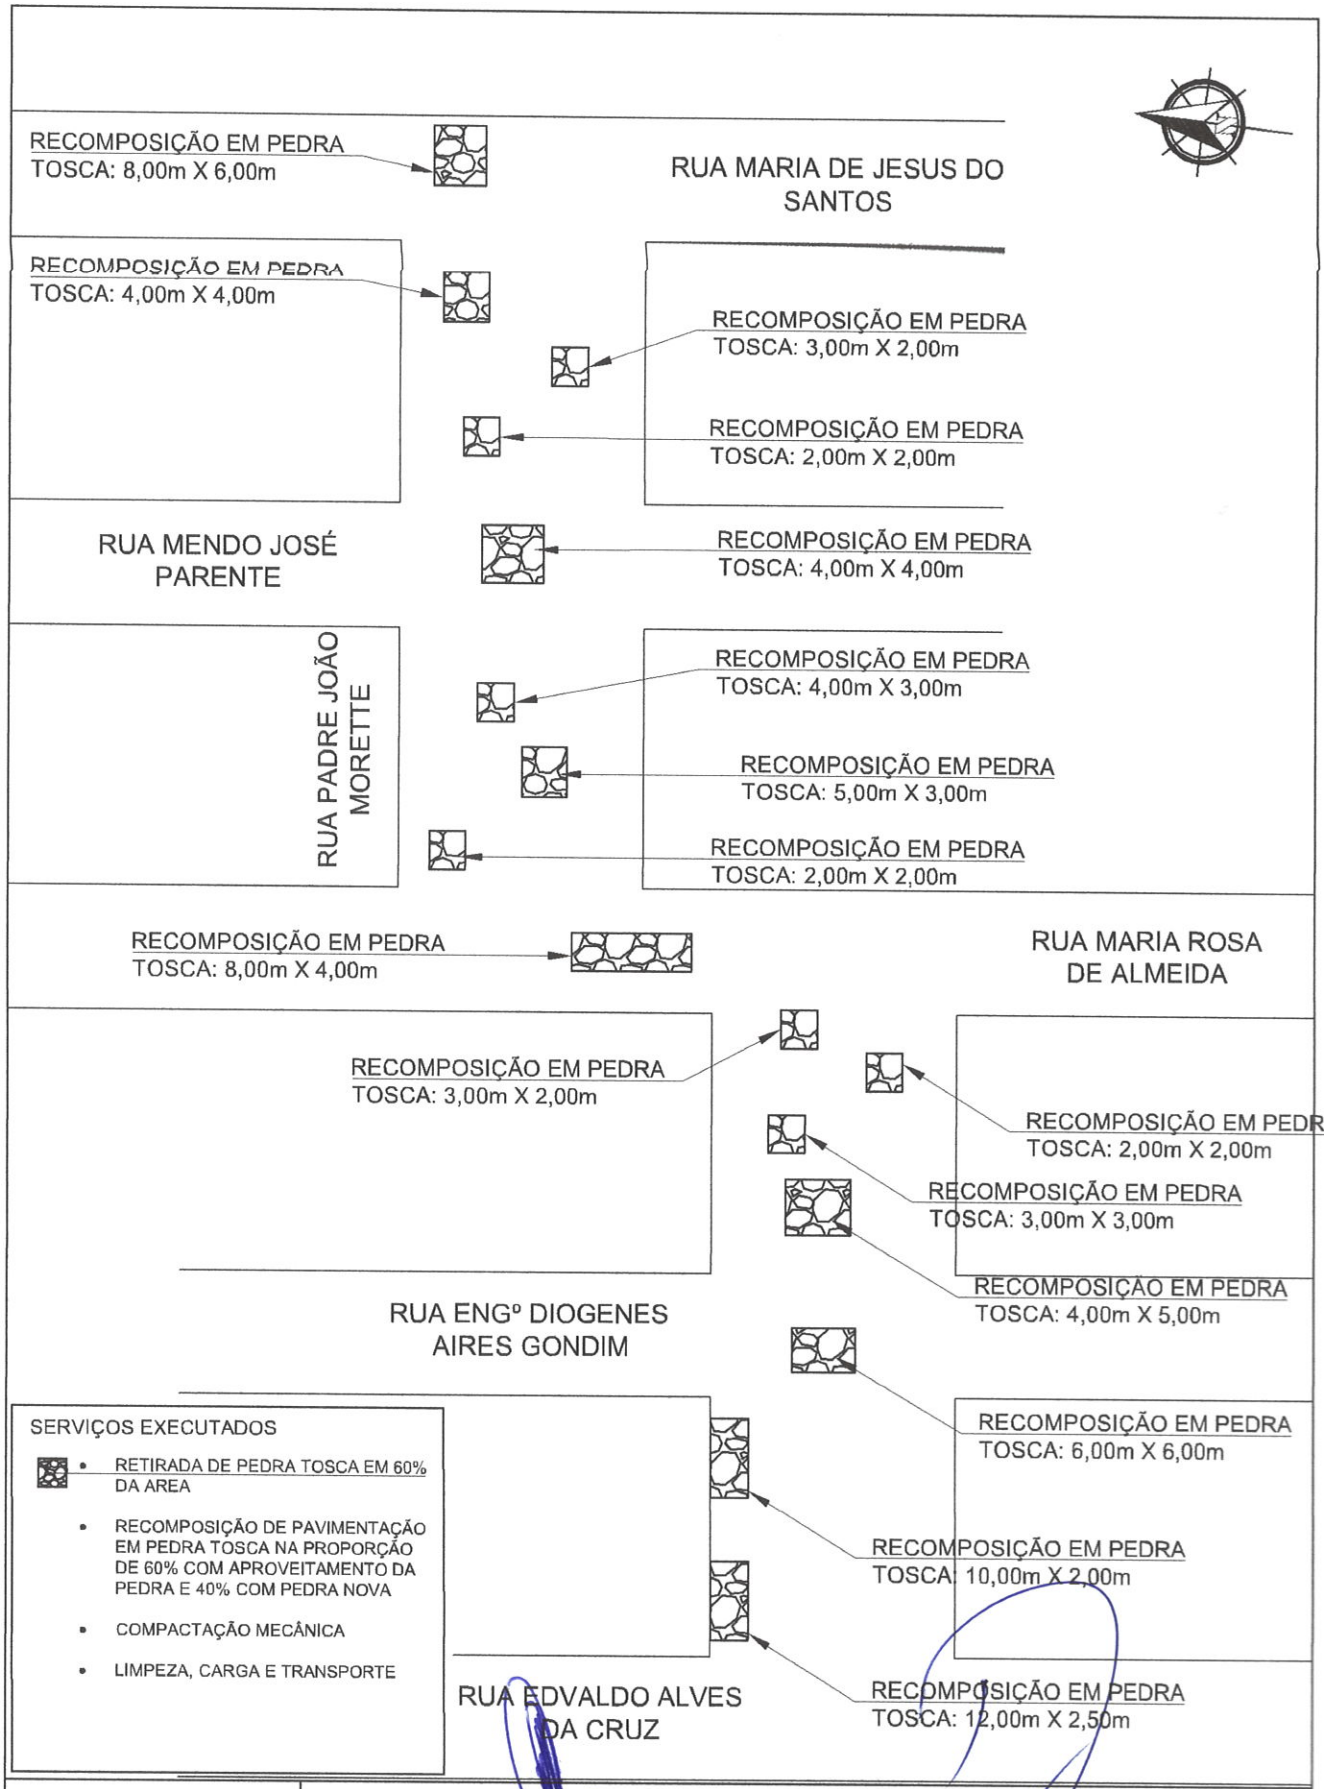

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 18	**LOCALIDADE:** RUA PADRE JOÃO MORETTI	**BAIRRO:** JARDIM GONZAGA	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 463742 **LAT.:** 9197414
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	**DATA:** 31/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
18	RUA PADRE JOÃO MORETTI	JARDIM GONZAGA

TRECHO

ENTRE A RUA EDVALDO ALVES DA CRUZ E A RUA MARIA DE JESUS

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
HEITOR BORGES	31/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	18.0	RUA PADRE JOÃO MORETTI					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	278,00	R$ 1,84	R$	511,52
1.4	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	166,80	R$ 14,68	R$	2.448,62
1.13	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	166,80	R$ 1,35	R$	225,18
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	36,14	R$ 4,99	R$	180,34
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	36,14	R$ 41,23	R$	1.490,05
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM					
2.9	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	111,20	R$ 78,14	R$	8.689,17
2.11	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	166,80	R$ 37,98	R$	6.335,06
					TOTAL	R$	19.879,94

MAPA DE SITUAÇÃO

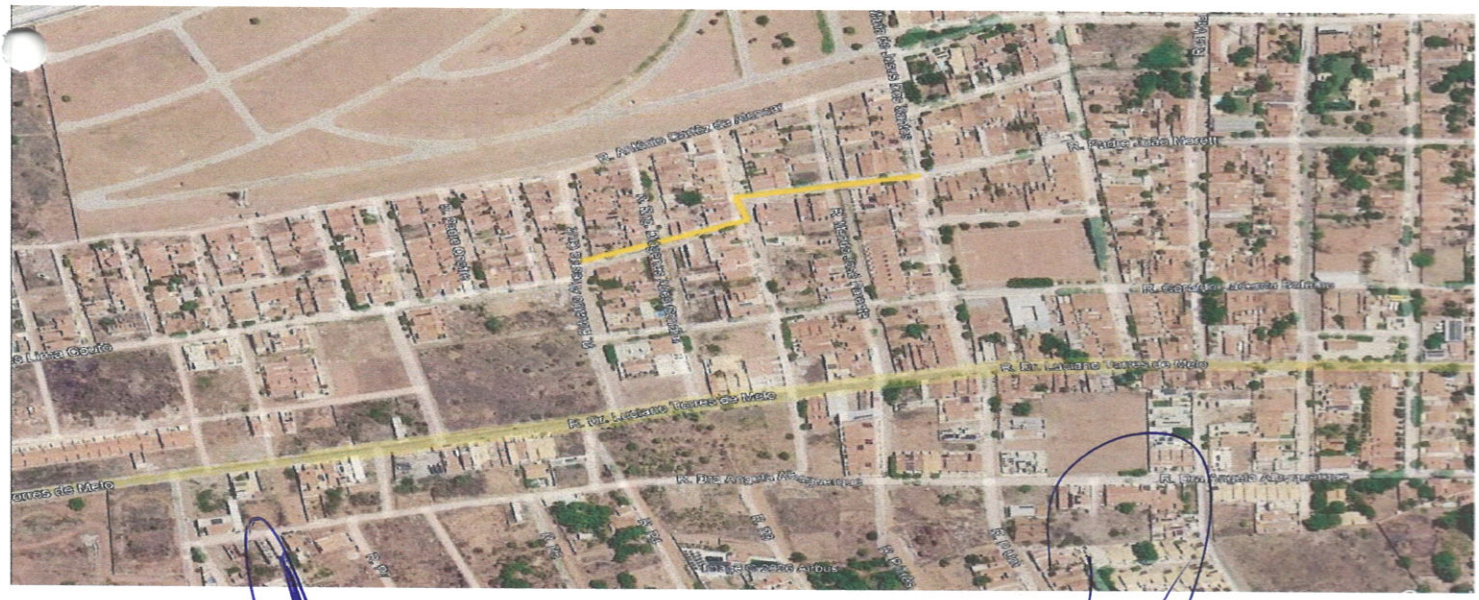

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (1)

FOTO 02 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (2)

FOTO 03 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (3)

FOTO 04 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (4)

FOTO 05 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (5)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 09.03.2026-06	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA VITAL LISBOA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 9 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

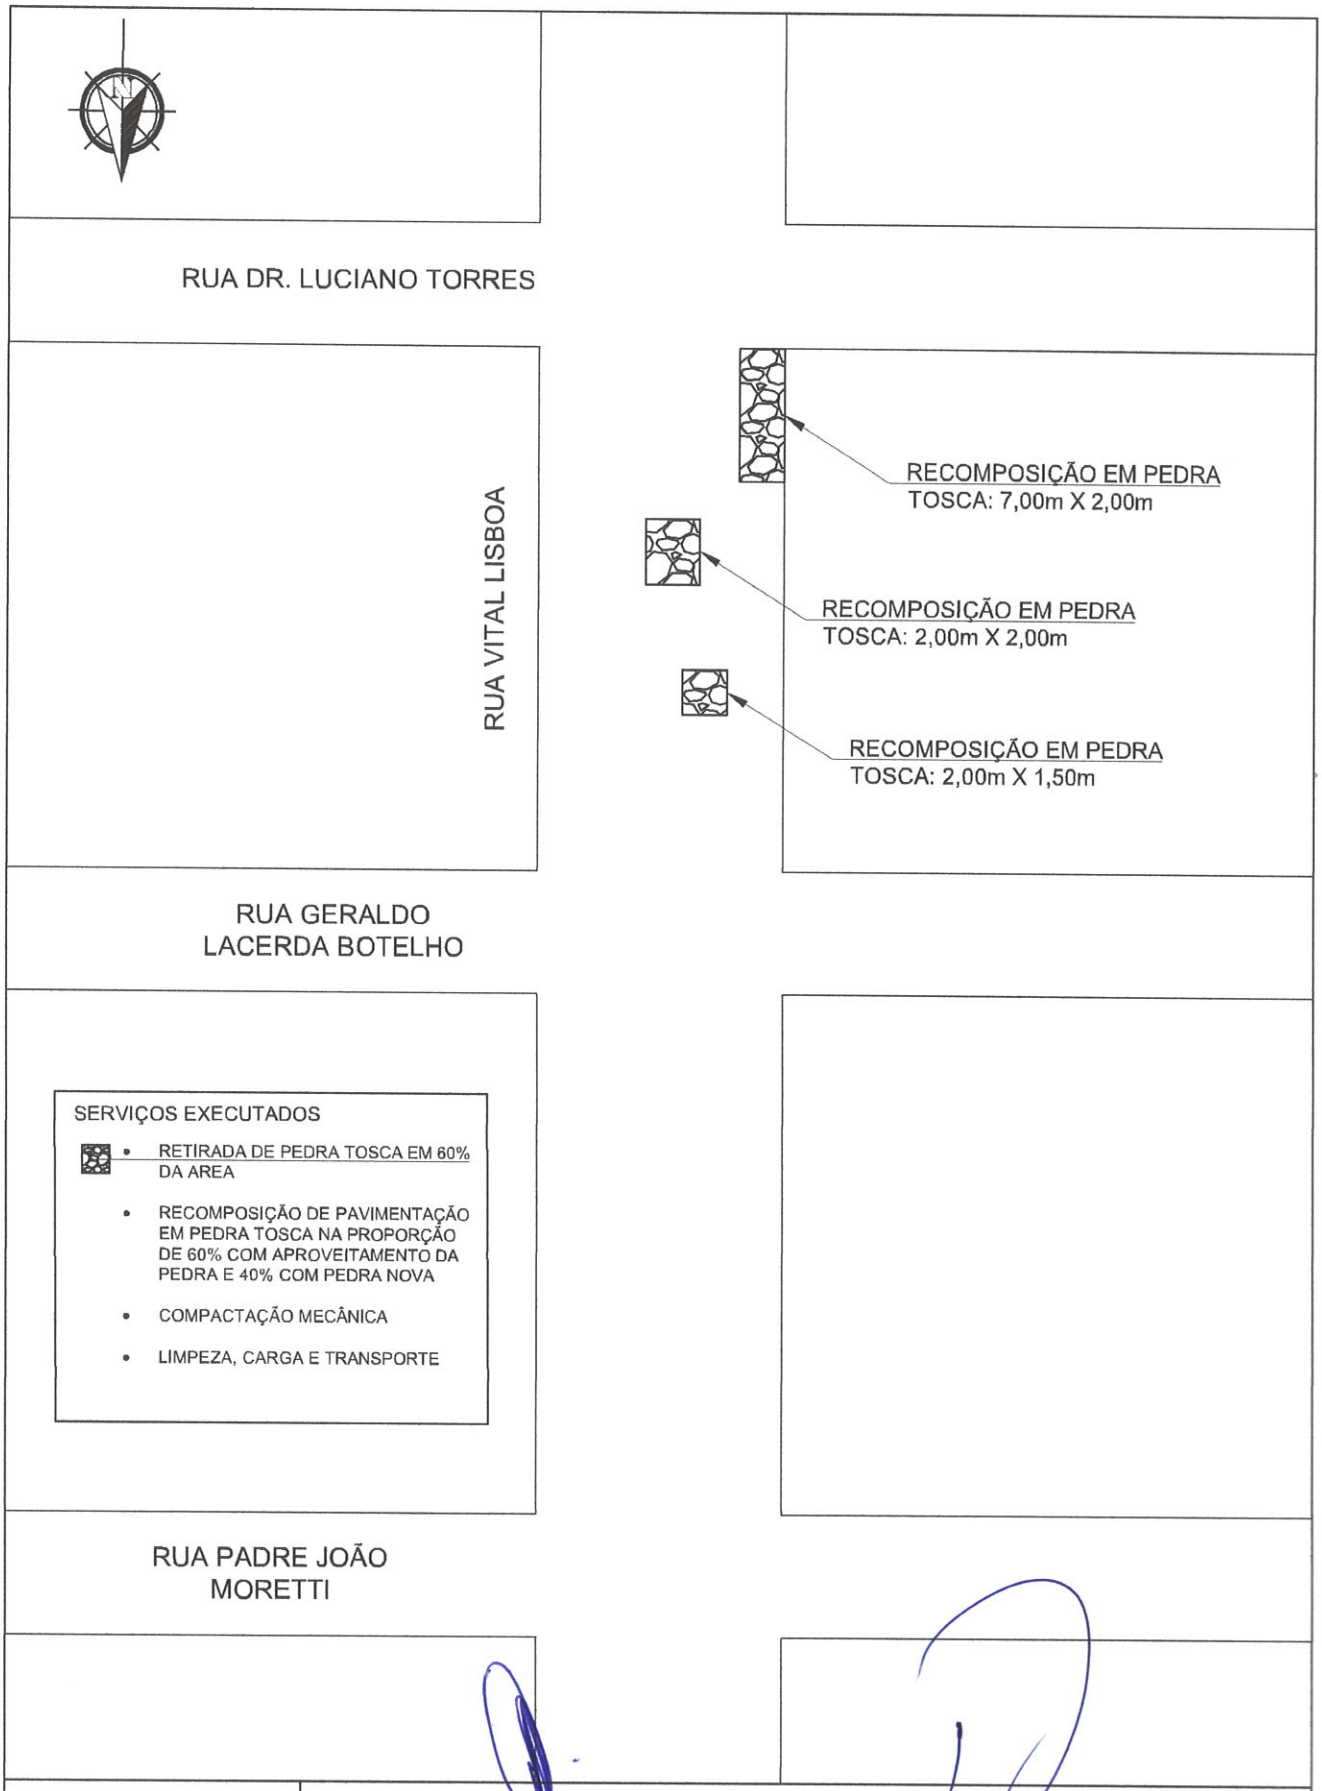

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 19	**LOCALIDADE:** RUA VITAL LISBOA	**BAIRRO:** JARDIM GONZAGA	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 464111 **LAT.:** 9197318
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	**DATA:** 31/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID: 19

ENDEREÇO: RUA VITAL LISBOA

BAIRRO: JARDIM GONZAGA

TRECHO: ENTRE A RUA GERALDO LACERDA BOTELHO E A RUA DR. LUCIANO TORRES

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO: 31/03/2026

EMPRESA EXECUTORA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO: N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	19.0	RUA VITAL LISBOA						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I		P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	21,00	RS	1,84	RS	38,64
1.4	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	12,60	RS	14,68	RS	184,97
1.13	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	12,60	RS	1,35	RS	17,01
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,73	RS	4,99	RS	13,62
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	2,73	RS	41,23	RS	112,56
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM						
2.9	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	8,40	RS	78,14	RS	656,38
2.11	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	12,60	RS	37,98	RS	478,55
					TOTAL		RS	1.501,73

MAPA DE SITUAÇÃO

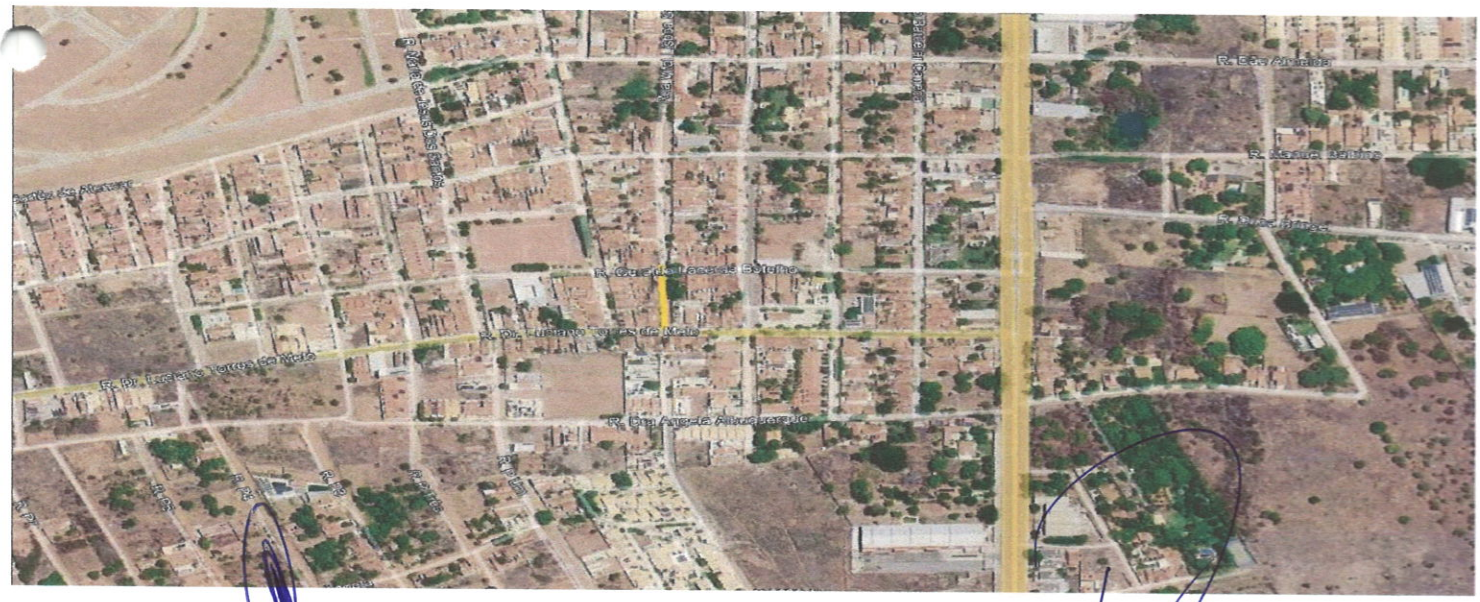

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

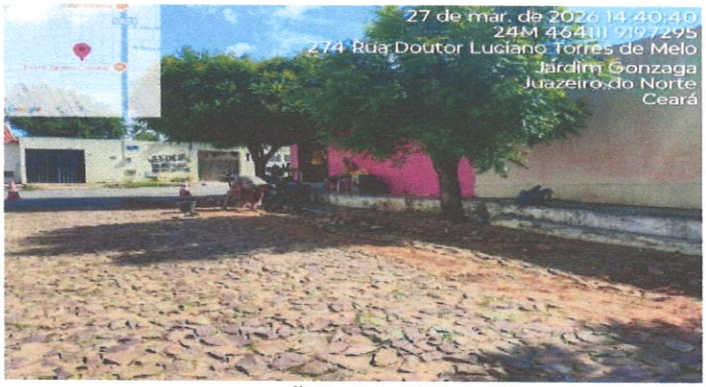

FOTO 01 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 09.03.2026-07	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA DR. BELEM DE FIGUEIREDO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 9 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA
TOSCA: 10,00m X 6,00m

RUA POSSIDONIO BEM



RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA
TOSCA: 20,00m X 9,00m

RUA ALAMEDA PORTUGAL

RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA
TOSCA: 15,00m X 3,00m

RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA
TOSCA: 12,00m X 8,00m

RUA DOUTOR BELÉM DE FIGUEREDO

RUA ALAMEDA ITÁLIA

RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA
TOSCA: 5,00m X 5,00m

RUA ALAMEDA VATICANO

SERVIÇOS EXECUTADOS

- RETIRADA DE PEDRA TOSCA EM 60% DA AREA
- RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA PROPORÇÃO DE 60% COM APROVEITAMENTO DA PEDRA E 40% COM PEDRA NOVA
- COMPACTAÇÃO MECÂNICA
- LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE

RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA
TOSCA: 3,50m X 2,00m

RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA
TOSCA: 7,00m X 5,00m

AVENIDA AILTON GOMES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 20	**LOCALIDADE:** RUA DOUTOR BELÉM DE FIGUEREDO	**BAIRRO:** LAGOA SECA	**PRANCHA:** 1/2
SERVIÇO EXECUTADO: RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465163 **LAT.:** 9199885
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	**DATA:** 31/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	

RUA ALAMEDA ESPANHA

RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA
TOSCA: 15,00m X 3,00m

RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA
TOSCA: 7,00m X 5,00m

RUA DOUTOR BELÉM
DE FIGUEREDO

RUA ALAMEDA FRANÇA

SERVIÇOS EXECUTADOS

- RETIRADA DE PEDRA TOSCA EM 60% DA AREA
- RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA PROPORÇÃO DE 60% COM APROVEITAMENTO DA PEDRA E 40% COM PEDRA NOVA
- COMPACTAÇÃO MECÂNICA
- LIMPEZA, CARGA E TRANSPORT

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 20	**LOCALIDADE:** RUA DOUTOR BELÉM DE FIGUEREDO	**BAIRRO:** LAGOA SECA	**PRANCHA:** 2/2
SERVIÇO EXECUTADO: RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	**DATA:** 31/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	**LONG.:** 465163 **LAT.:** 9199885

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID: 20

ENDEREÇO: RUA DR. BELEM DE FIGUEIREDO

BAIRRO: LAGOA SECA

TRECHO: ENTRE A AV. AILTON GOMES E A ALAMEDA ESPANHA

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO: 31/03/2026

EMPRESA EXECUTORA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO: N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	20.0	RUA DR. BELEM DE FIGUEIREDO						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I		P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	528,00	R$	1,84	R$	971,52
1.4	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	316,80	R$	14,68	R$	4.650,62
1.13	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	316,80	R$	1,35	R$	427,68
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	68,64	R$	4,99	R$	342,51
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	68,64	R$	41,23	R$	2.830,03
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM						
2.9	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	211,20	R$	78,14	R$	16.503,17
2.11	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	316,80	R$	37,98	R$	12.032,06
					TOTAL		R$	37.757,59

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (1)

FOTO 02 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (2)

FOTO 03 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (3)

FOTO 04 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (4)

FOTO 05 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (5)

FOTO 06 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (6)

FOTO 07 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (7)

FOTO 08 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (8)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (9)

FOTO 10 - RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA (10)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 10.03.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA SÃO MAMEDE.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 10 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

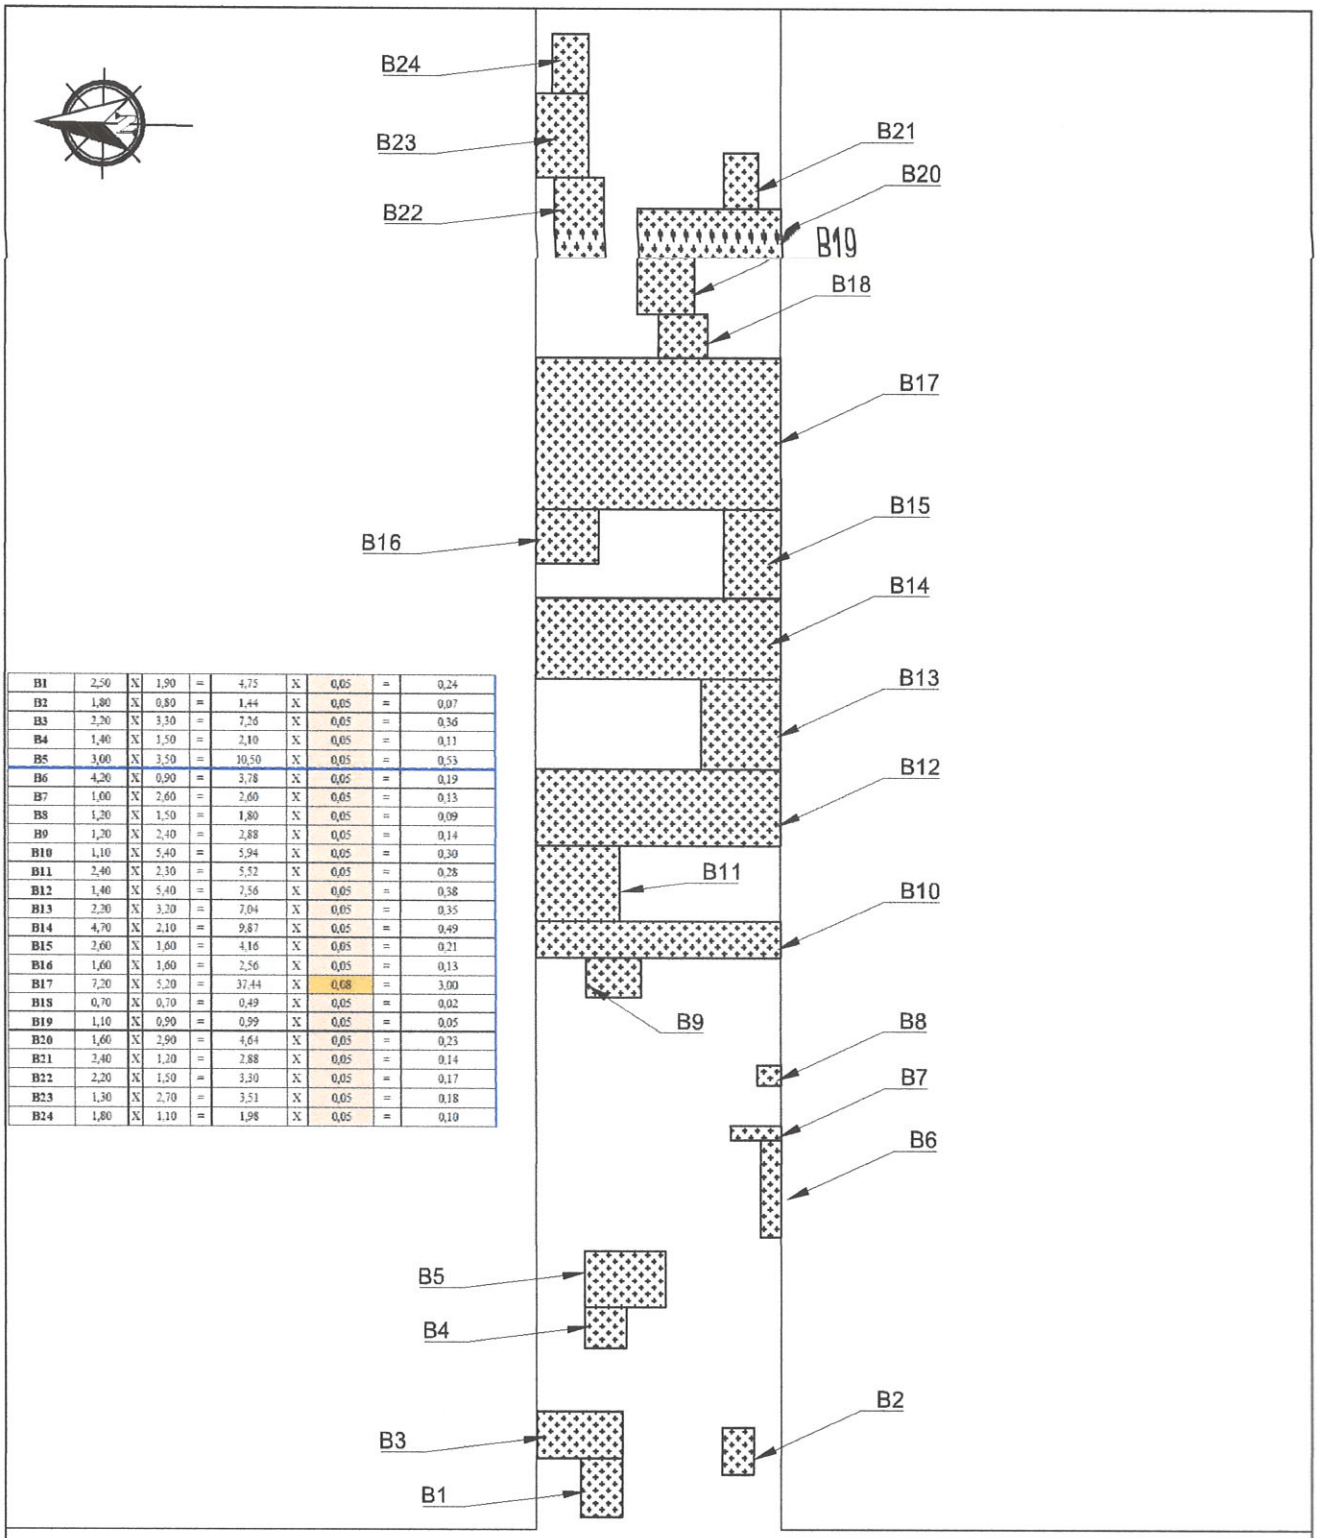

B1	2,50	X	1,90	=	4,75	X	0,05	=	0,24
B2	1,80	X	0,80	=	1,44	X	0,05	=	0,07
B3	2,20	X	3,30	=	7,26	X	0,05	=	0,36
B4	1,40	X	1,50	=	2,10	X	0,05	=	0,11
B5	3,00	X	3,50	=	10,50	X	0,05	=	0,53
B6	4,20	X	0,90	=	3,78	X	0,05	=	0,19
B7	1,00	X	2,60	=	2,60	X	0,05	=	0,13
B8	1,20	X	1,50	=	1,80	X	0,05	=	0,09
B9	1,20	X	2,40	=	2,88	X	0,05	=	0,14
B10	1,10	X	5,40	=	5,94	X	0,05	=	0,30
B11	2,40	X	2,30	=	5,52	X	0,05	=	0,28
B12	1,40	X	5,40	=	7,56	X	0,05	=	0,38
B13	2,20	X	3,20	=	7,04	X	0,05	=	0,35
B14	4,70	X	2,10	=	9,87	X	0,05	=	0,49
B15	2,60	X	1,60	=	4,16	X	0,05	=	0,21
B16	1,60	X	1,60	=	2,56	X	0,05	=	0,13
B17	7,20	X	5,20	=	37,44	X	0,08	=	3,00
B18	0,70	X	0,70	=	0,49	X	0,05	=	0,02
B19	1,10	X	0,90	=	0,99	X	0,05	=	0,05
B20	1,60	X	2,90	=	4,64	X	0,05	=	0,23
B21	2,40	X	1,20	=	2,88	X	0,05	=	0,14
B22	2,20	X	1,50	=	3,30	X	0,05	=	0,17
B23	1,30	X	2,70	=	3,51	X	0,05	=	0,18
B24	1,80	X	1,10	=	1,98	X	0,05	=	0,10

RUA DO LIMOEIRO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 21	**LOCALIDADE:** RUA SÃO MAMEDE	**BAIRRO:** FRANCISCANOS	**PRANCHA:** 1/2
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465740 **LAT.:** 9202118
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 10/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

B25	1.80	X	1.20	=	2.16	X	0.05	=	0.11
B26	3.10	X	1.90	=	5.89	X	0.05	=	0.29
B27	1.30	X	1.70	=	2.21	X	0.05	=	0.11
B28	1.60	X	1.30	=	2.08	X	0.05	=	0.10
B29	10.80	X	0.80	=	8.64	X	0.05	=	0.43
B30	1.50	X	1.80	=	2.70	X	0.05	=	0.14
B31	2.00	X	0.80	=	1.60	X	0.05	=	0.08
B33	1.50	X	0.50	=	0.75	X	0.05	=	0.04
B34	4.70	X	1.40	=	6.58	X	0.05	=	0.33
B35	1.20	X	1.20	=	1.44	X	0.05	=	0.07
			ÁREA	=	171,51		VOLUME	=	9,70

RUA SÃO BENEDITO

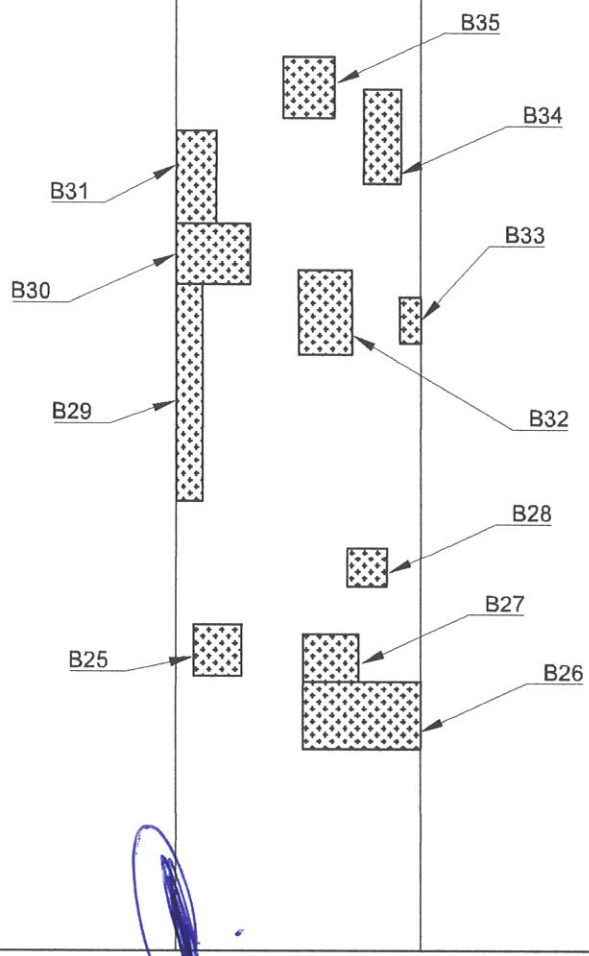

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 21	**LOCALIDADE:** RUA SÃO MAMEDE	**BAIRRO:** FRANCISCANOS	**PRANCHA:** 2/2
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 10/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	**LONG.:** 465740 **LAT.:** 9202118

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
21	RUA SÃO MAMEDE	FRANCISCANOS

TRECHO

ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA SÃO BENEDITO

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	10/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	21	RUA SÃO MAMEDE				
ITEM	**COD**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID**	**QTDE**	**P. UNIT. C/ B.D.I**	**P. TOTAL C/ B.D.I**
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	171,51	R$ 1,84	R$ 315,58
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	9,70	R$ 1.696,15	R$ 16.450,45
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	171,51	R$ 0,33	R$ 56,60
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,07	R$ 3.062,93	R$ 210,13
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	1,47	R$ 472,85	R$ 695,59
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	24,85	R$ 30,12	R$ 748,39
					TOTAL	R$ 18.476,74

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

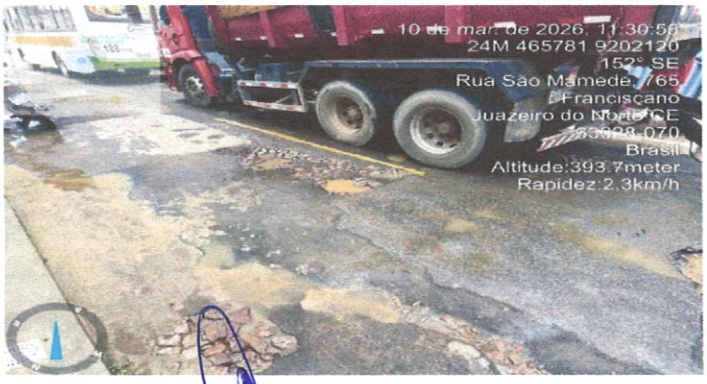

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - ANTES

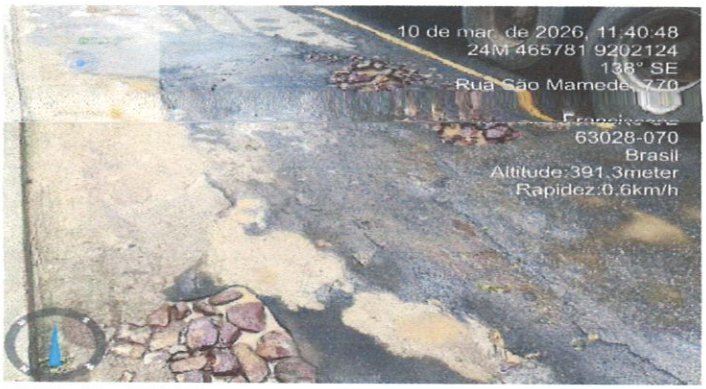

FOTO 10 - ANTES

FOTO 11 - ANTES

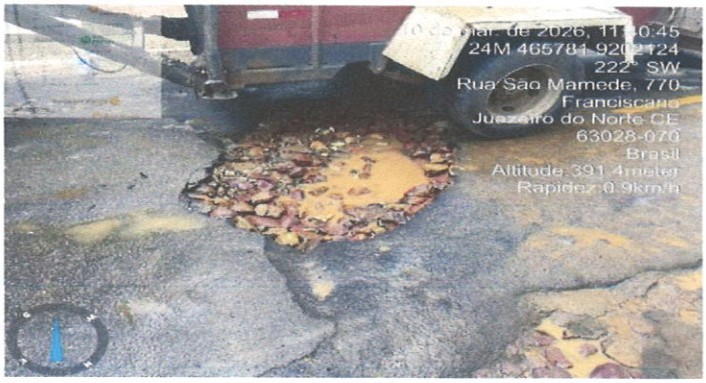

FOTO 12 - ANTES

FOTO 13 - ANTES

FOTO 14 - ANTES

FOTO 15 - ANTES

FOTO 16 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 17 - ANTES

FOTO 18 - ANTES

FOTO 19 - ANTES

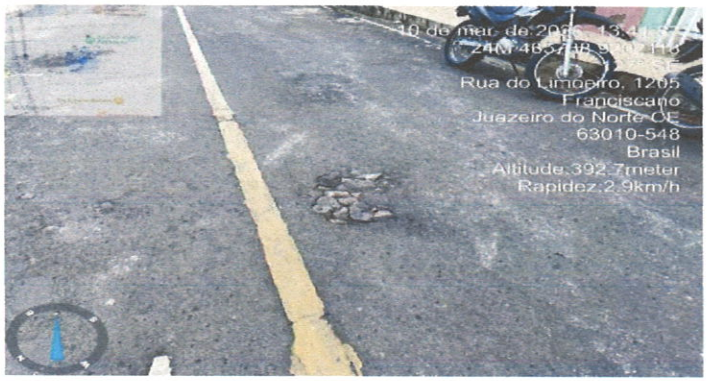

FOTO 20 - ANTES

FOTO 21 - ANTES

FOTO 22 - ANTES

FOTO 23 - B1 A B3

FOTO 24 - B4 A B7

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 25 - B8 A B11

FOTO 26 - B12 A B14

FOTO 27 - B15 A B17

FOTO 28 - B18 A B21

FOTO 29 - B22 A B25

FOTO 30 - B26 E 27

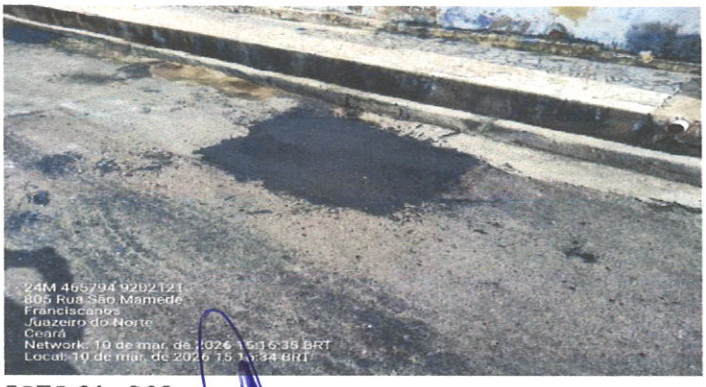

FOTO 31 - B28

FOTO 32 - B29 A B31

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 33 - B32 E 35

FOTO 34 - B33 E 34

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 10.03.2026-02	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA CAMPOS ELÍSEOS.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 10 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

B1	1,60	X	1,50	=	2,40	X	0,05	=	0,12
B2	1,10	X	0,80	=	0,88	X	0,05	=	0,04
B3	1,40	X	1,10	=	1,54	X	0,05	=	0,08
B4	3,30	X	3,20	=	10,56	X	0,08	=	0,84
B5	1,00	X	2,20	=	2,20	X	0,05	=	0,11
B6	1,30	X	3,80	=	4,94	X	0,05	=	0,25
B7	2,10	X	2,10	=	4,41	X	0,05	=	0,22
B8	[illegible]								
B9	2,30	X	1,80	=	4,14	X	0,05	=	0,21
B10	3,10	X	1,50	=	4,65	X	0,05	=	0,23
B11	1,00	X	1,10	=	1,10	X	0,05	=	0,06

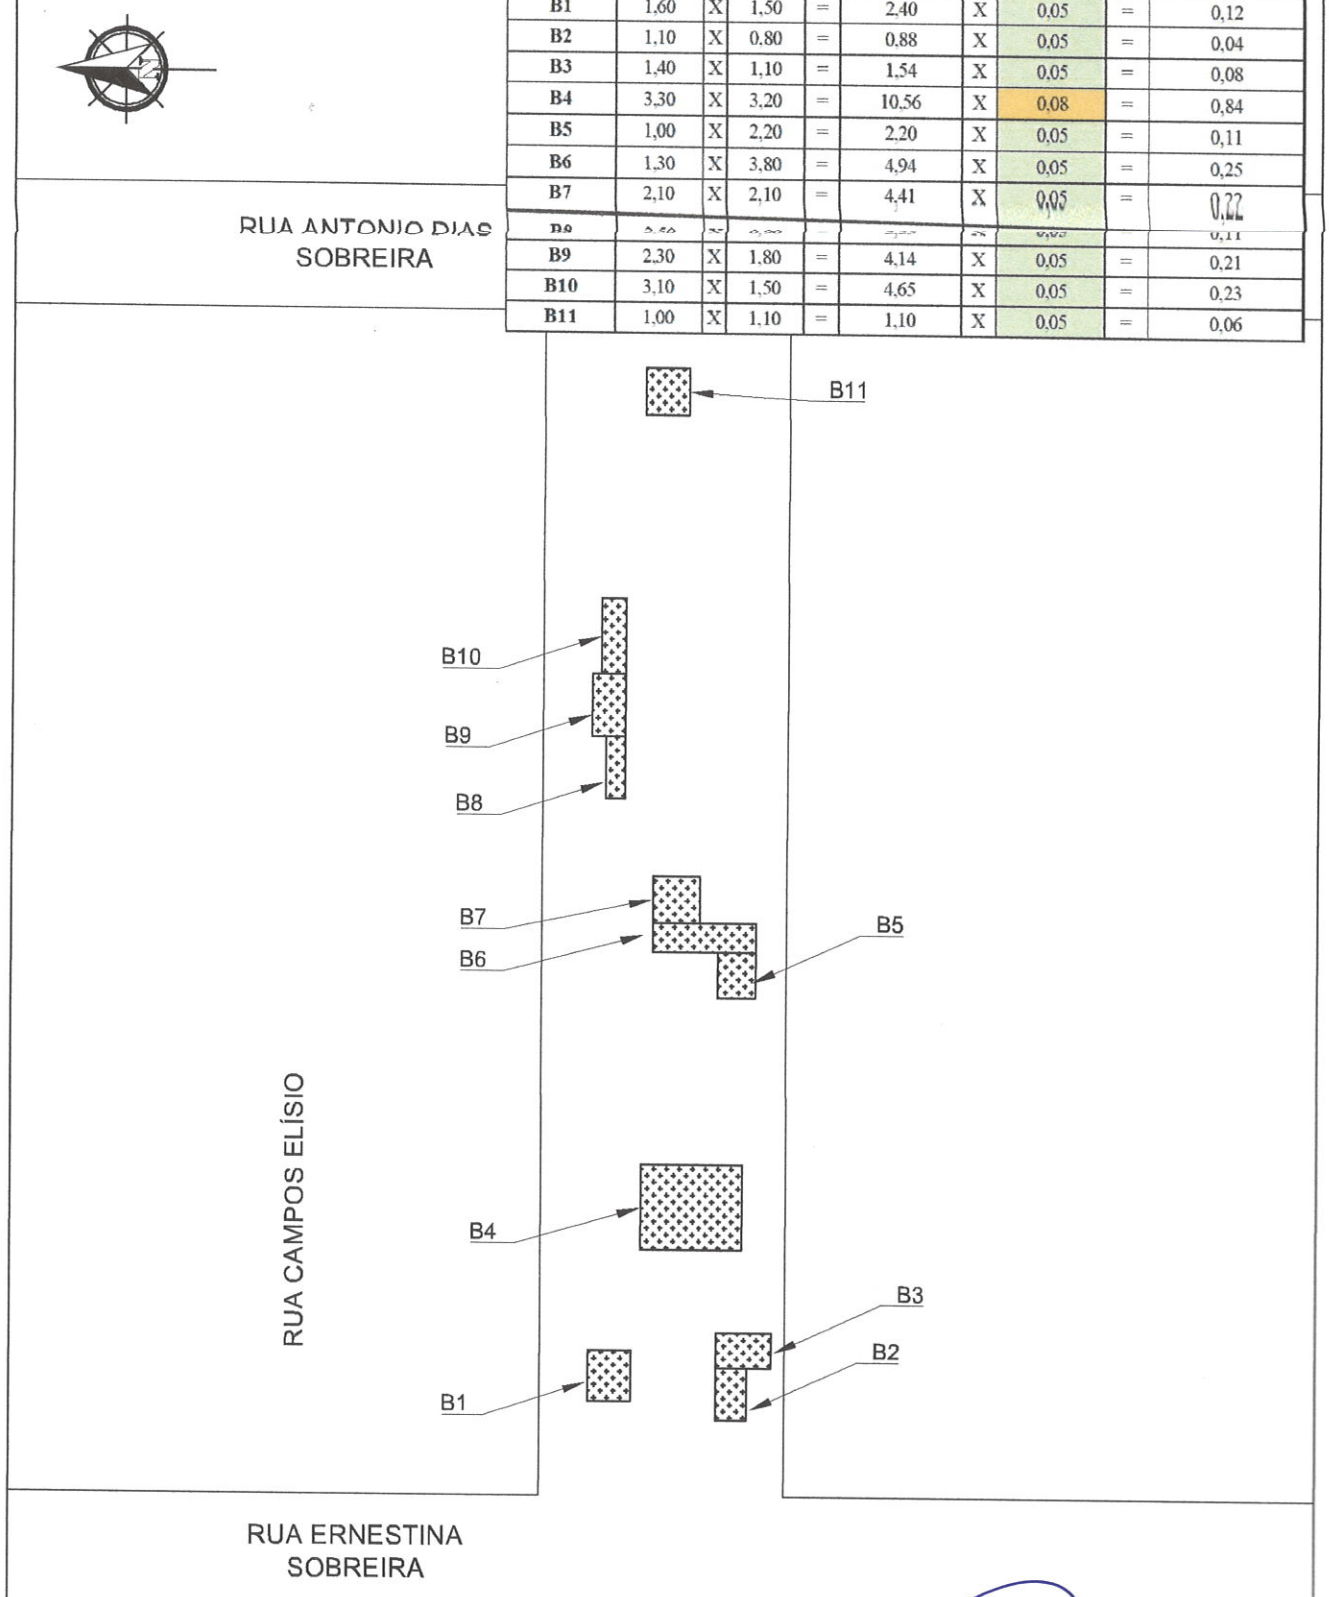

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 22	**LOCALIDADE:** RUA CAMPOS ELÍSIO	**BAIRRO:** TIMBAUBAS	**PRANCHA:** 1/3
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465731 **LAT.:** 9202202
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 10/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

B12	2,20	X	1,80	=	3,96	X	0,05	=	0,20
B13	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09
B14	0,90	X	0,80	=	0,72	X	0,05	=	0,04
B15	1,20	X	0,90	=	1,08	X	0,05	=	0,05
B16	3,90	X	1,70	=	6,63	X	0,05	=	0,33
B17	4,10	X	1,30	=	5,33	X	0,05	=	0,27
B18	1,60	X	1,20	=	1,92	X	0,05	=	0,10
B19	2,20	X	1,60	=	3,52	X	0,05	=	0,18
B20	1,70	X	1,50	=	2,55	X	0,05	=	0,13
B21	[illegible]								
B22	1,10	X	3,80	=	4,18	X	0,05	=	0,21
B23	1,00	X	2,20	=	2,20	X	0,05	=	0,11
B24	1,00	X	0,70	=	0,70	X	0,05	=	0,04
B25	1,20	X	0,80	=	0,96	X	0,05	=	0,05
B26	1,70	X	1,40	=	2,38	X	0,05	=	0,12
B27	0,70	X	0,70	=	0,49	X	0,05	=	0,02
B28	2,00	X	1,40	=	2,80	X	0,05	=	0,14
B29	3,00	X	2,40	=	7,20	X	0,05	=	0,36
B30	2,40	X	1,10	=	2,64	X	0,05	=	0,13
B31	1,00	X	1,40	=	1,40	X	0,05	=	0,07
B32	1,80	X	0,70	=	1,26	X	0,05	=	0,06
B33	2,30	X	1,30	=	2,99	X	0,05	=	0,15

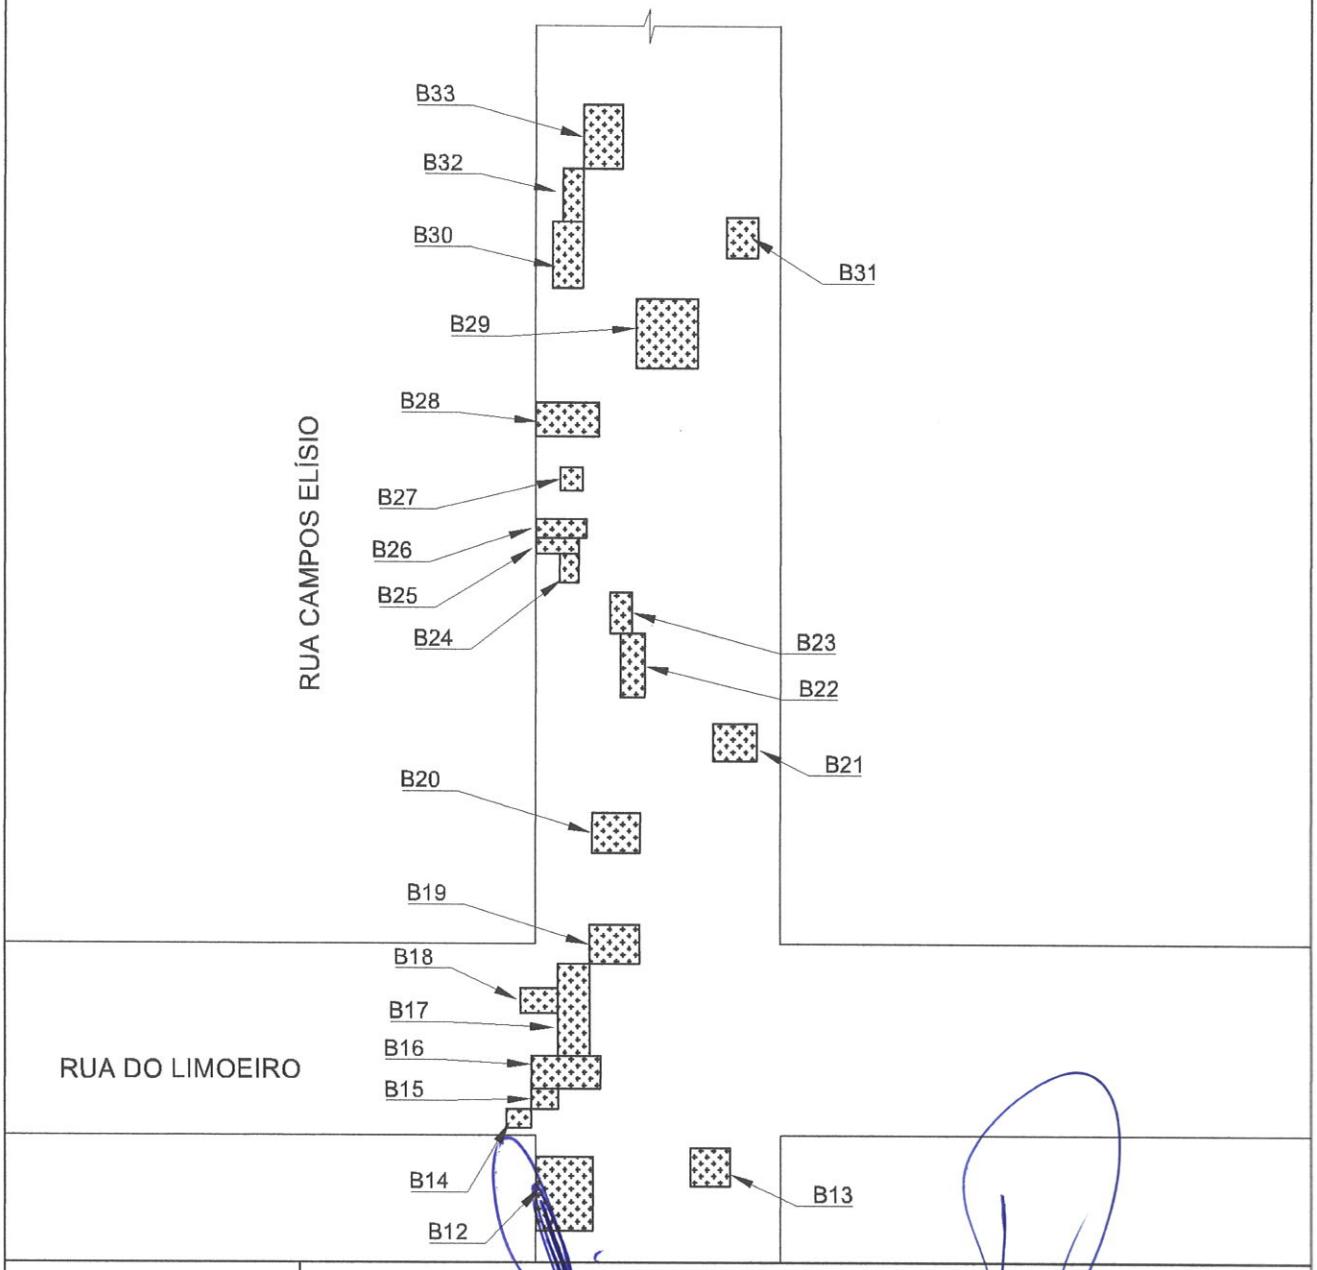

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Dedgenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 22	**LOCALIDADE:** RUA CAMPOS ELÍSIO	**BAIRRO:** TIMBAUBAS	**PRANCHA:** 2/3
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465731 **LAT.:** 9202202
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 11/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

B34	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
B35	2,40	X	1,60	=	3,84	X	0,05	=	0,19
B36	1,60	X	0,80	=	1,28	X	0,05	=	0,06
B37	2,90	X	1,40	=	4,06	X	0,05	=	0,20
B38	3,10	X	0,60	=	1,86	X	0,05	=	0,09
B39	1,10	X	0,90	=	0,99	X	0,05	=	0,05
B40	8,60	X	0,70	=	6,02	X	0,05	=	0,30
B41	2,10	X	2,30	=	4,83	X	0,05	=	0,24
B42	0,70	X	0,80	=	0,42	X	0,05	=	0,02
B43	0,90	X	0,60	=	0,54	X	0,05	=	0,03
B44	4,60	X	1,50	=	6,90	X	0,05	=	0,35
B45	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
B46	0,80	X	0,60	=	0,48	X	0,05	=	0,02
B47	2,70	X	1,40	=	3,78	X	0,05	=	0,19
B48	1,00	X	1,20	=	1,20	X	0,05	=	0,06
B49	0,90	X	0,80	=	0,72	X	0,05	=	0,04
B50	9,00	X	0,80	=	7,20	X	0,05	=	0,36
			ÁREA	=	146,60		VOLUME	=	7,65

RUA SÃO BENEDITO

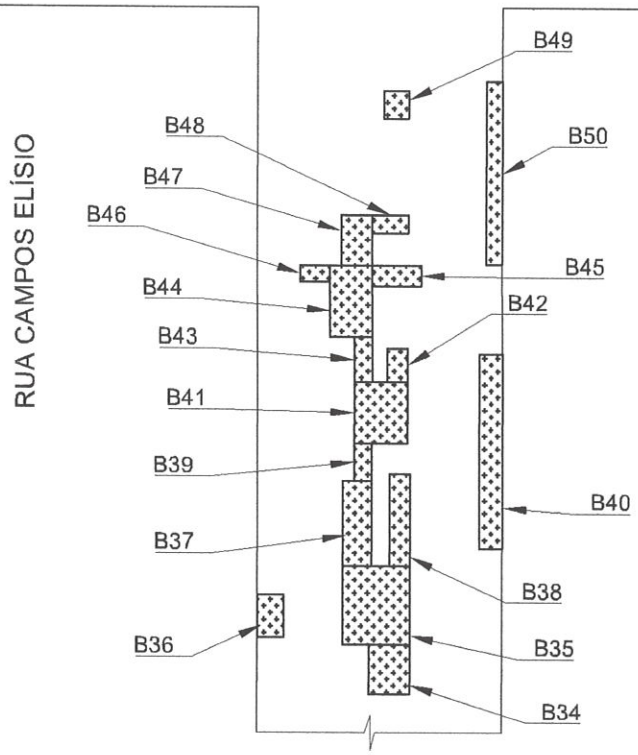

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 22	**LOCALIDADE:** RUA CAMPOS ELÍSIO	**BAIRRO:** TIMBAUBAS	**PRANCHA:** 3/3
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465731 **LAT.:** 9202202
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 11/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
22	RUA CAMPOS ELÍSEOS	TIMBAUBAS

TRECHO

ENTRE A RUA DO LIMOEIRO E A RUA ANTONIO DIAS SOBREIRA

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	10/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	22	RUA CAMPOS ELÍSEOS				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	146,60	R$ 1,84	R$ 269,74
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	7,65	R$ 1.696,15	R$ 12.970,12
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/ TRANSP)	M2	146,60	R$ 0,33	R$ 48,38
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,06	R$ 3.062,93	R$ 179,61
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	1,16	R$ 472,85	R$ 550,58
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	19,59	R$ 30,12	R$ 590,19
					TOTAL	R$ 14.608,62

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

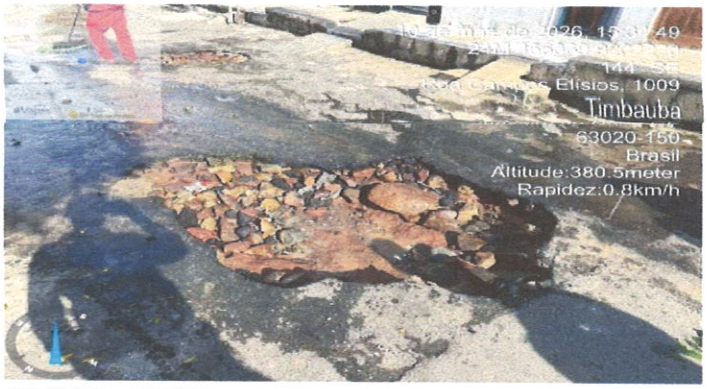

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

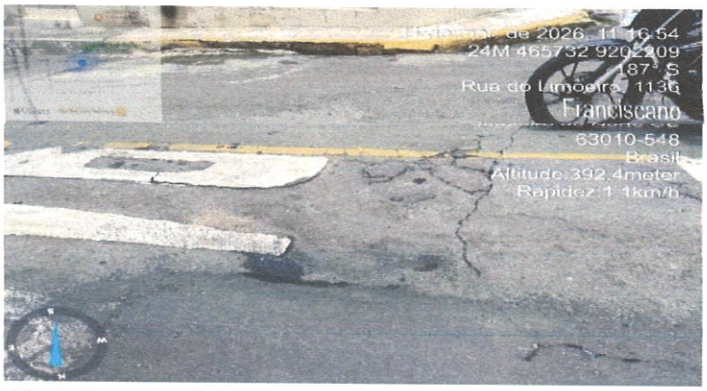

FOTO 09 - ANTES

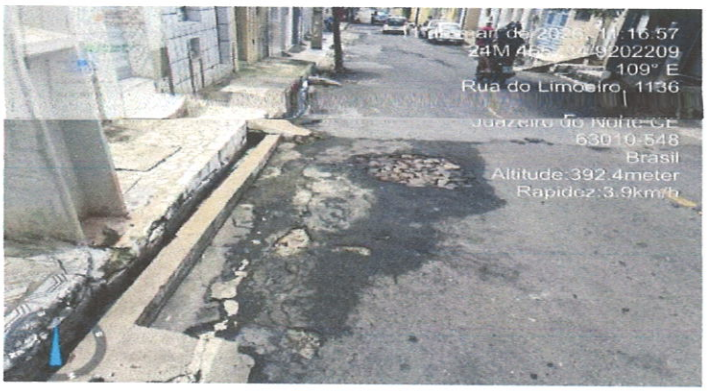

FOTO 10 - ANTES

FOTO 11 - ANTES

FOTO 12 - ANTES

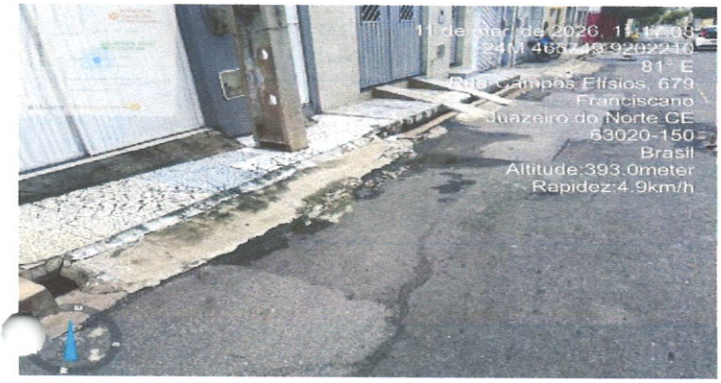

FOTO 13 - ANTES

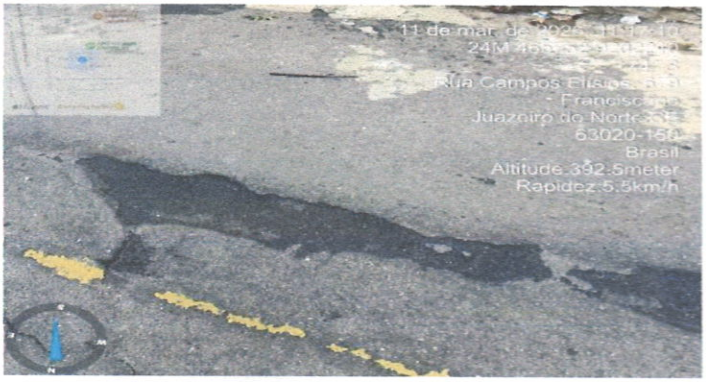

FOTO 14 - ANTES

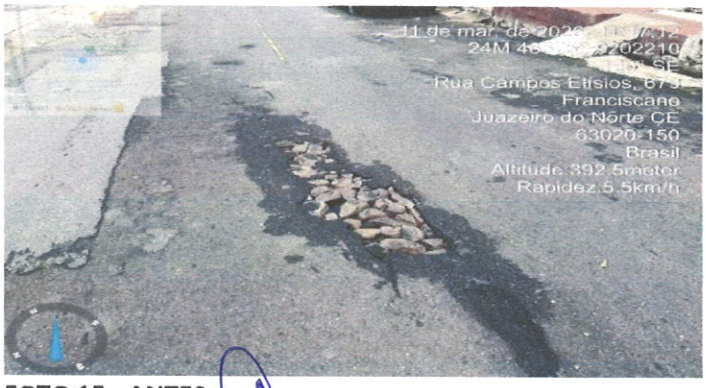

FOTO 15 - ANTES

FOTO 16 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engª Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

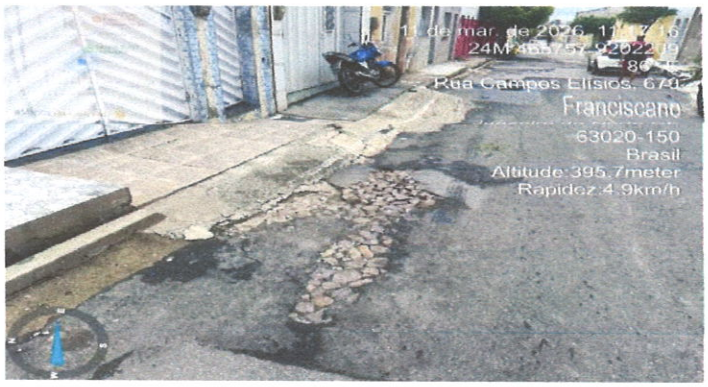

FOTO 17 - ANTES

FOTO 18 - ANTES

FOTO 19 - ANTES

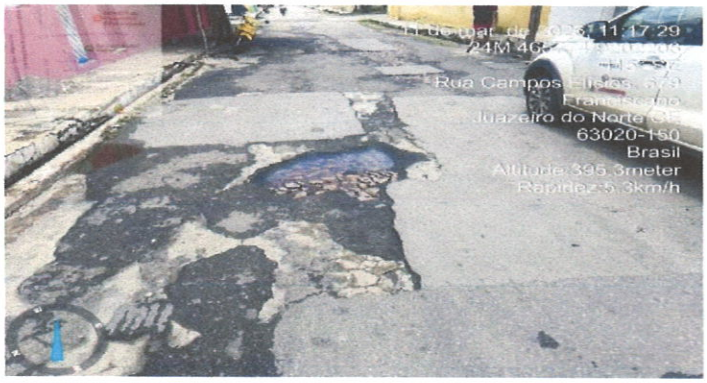

FOTO 20 - ANTES

FOTO 21 - ANTES

FOTO 22 - ANTES

FOTO 23 - ANTES

FOTO 24 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 25 - ANTES

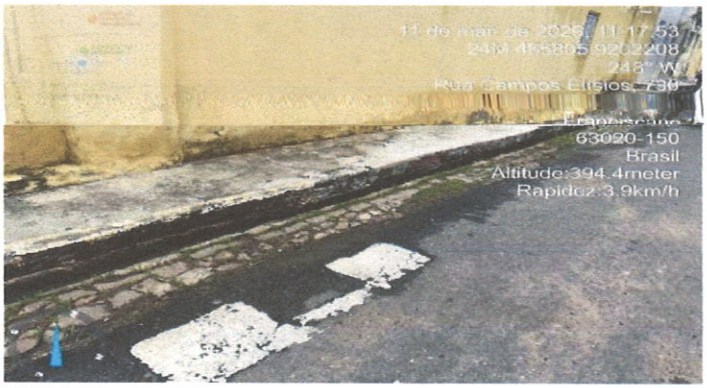

FOTO 26 - ANTES

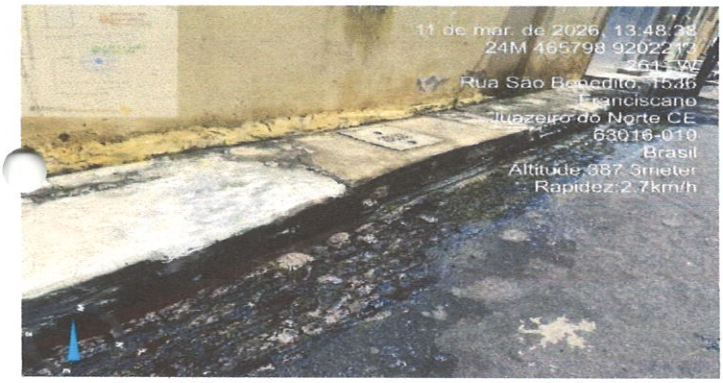

FOTO 27 - ANTES

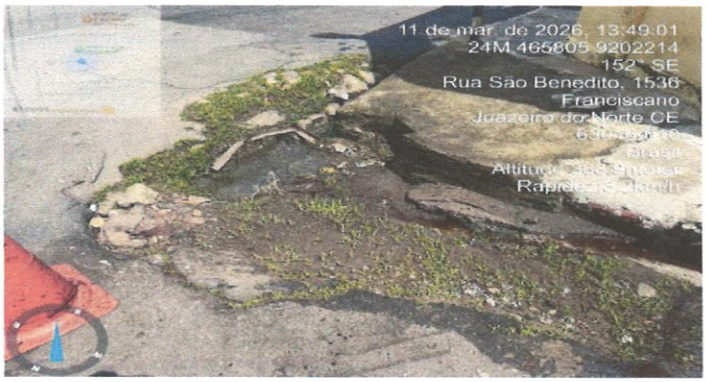

FOTO 28 - ANTES

FOTO 29 - ANTES

FOTO 30 - B1 A B4

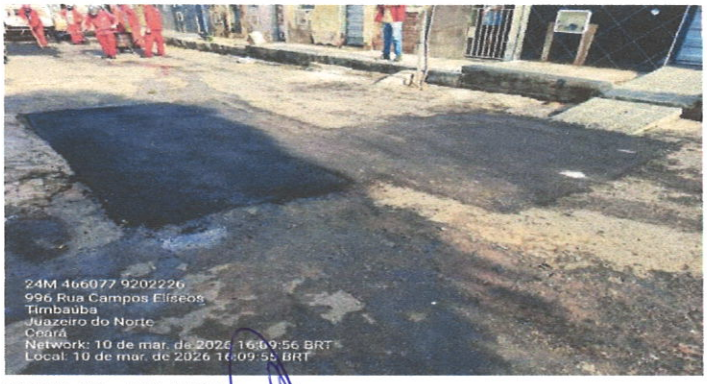

FOTO 31 - B5 A B7

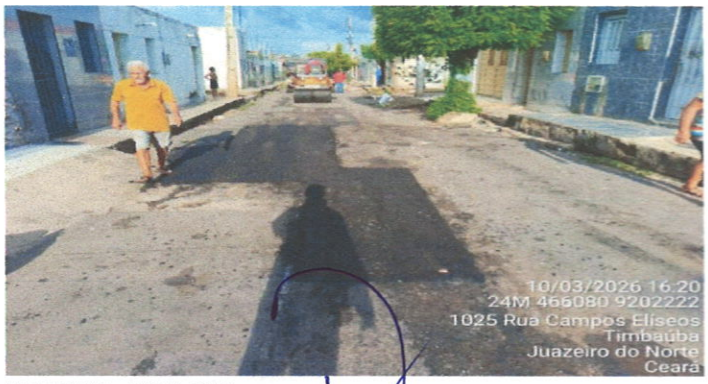

FOTO 32 - B8 A B10

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engª Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 33 - B11

FOTO 34 - B12

FOTO 35 - B13

FOTO 36 - B14 A B18

FOTO 37 - B19

FOTO 38 - B20 E B21

FOTO 39 - B22 E B23

FOTO 40 - B24 A B26

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 41 - B27

FOTO 42 - B28 E B29

FOTO 43 - B30 A B33

FOTO 44 - B34, B35, B37 E B38

FOTO 45 - B36

FOTO 46 - B39, B41, B42 E B43

FOTO 47 - B40

FOTO 48 - B44 A B48

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 49 - B49

FOTO 50 - B50

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 11.03.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) AVENIDA CARLOS CRUZ .	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 11 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

B1	2,80	X	1,10	=	3,08	X	0,08	=	0,25
B2	1,80	X	1,30	=	2,34	X	0,08	=	0,19
B3	1,30	X	1,00	=	1,30	X	0,08	=	0,10
B4	1,00	X	1,10	=	1,10	X	0,08	=	0,09
B5	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,08	=	0,18
B6	1,60	X	1,00	=	1,00	X	0,08	=	0,15
			ÁREA	=	**11,66**		**VOLUME**	=	**0,93**

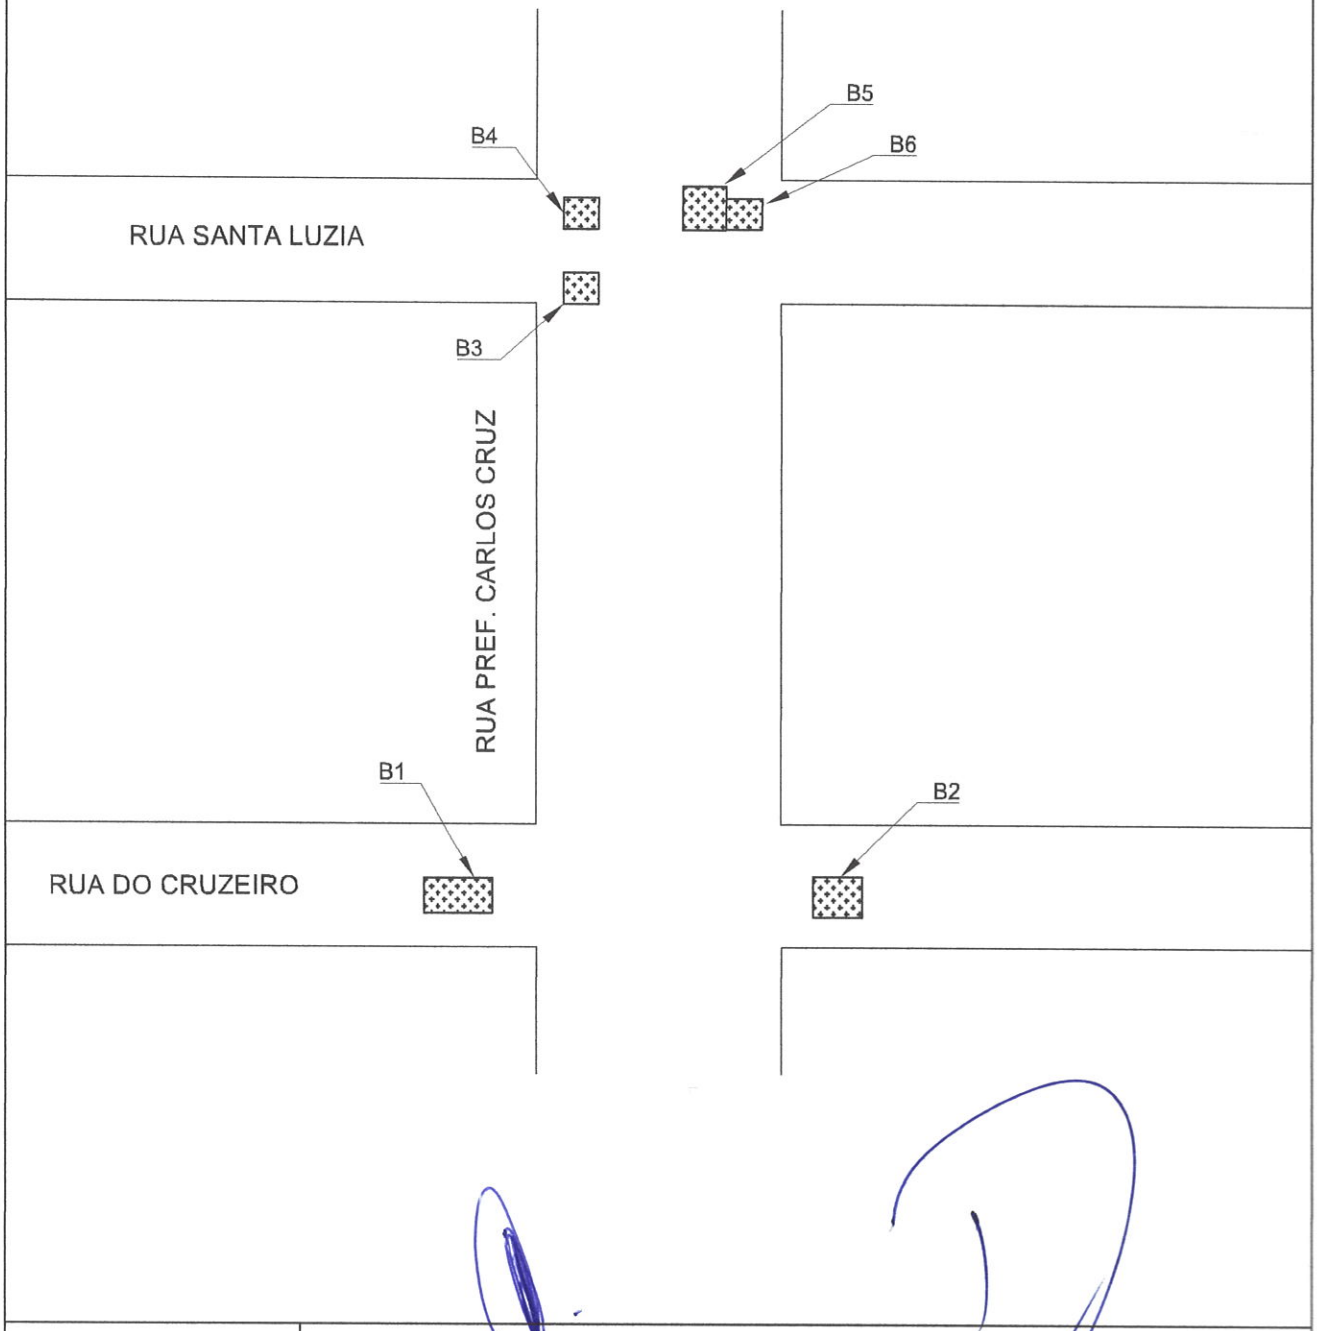

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 23	**LOCALIDADE:** AVENIDA CARLOS CRUZ	**BAIRRO:** FATIMA	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	**DATA:** 11/03/2026	**RESP. DESENHO:** MILENA	**LONG.:** 466297 **LAT.:** 9203430

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID: 23

ENDEREÇO: AVENIDA CARLOS CRUZ

BAIRRO: FATIMA

TRECHO: ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA SANTA LUZIA

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM

DATA MEDIÇÃO: 11/03/2026

EMPRESA EXECUTORA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO: N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	23	AVENIDA CARLOS CRUZ					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	11,66	R$ 1,84	R$	21,45
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM					
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	0,93	R$ 1.696,15	R$	1.582,17
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S TRANSP)	M2	11,66	R$ 0,33	R$	3,85
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,00	R$ 3.062,93	R$	14,29
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,14	R$ 472,85	R$	65,99
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	2,39	R$ 30,12	R$	71,92
					TOTAL	R$	1.759,67

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

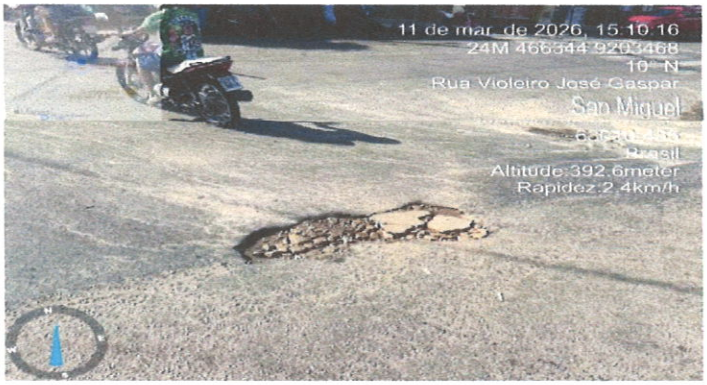

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - B1

FOTO 06 - B2

FOTO 07 - B3 E B4

FOTO 08 - B5 E B6

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 11.03.2026-02	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA SÃO BENEDITO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 11 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

B1	1,80	X	1,10	=	1,98	X	0,08	=	0,16
B2	0,70	X	0,60	=	0,42	X	0,08	=	0,03
B3	4,00	X	1,70	=	6,80	X	0,08	=	0,54
B4	1,30	X	1,00	=	1,30	X	0,08	=	0,10
B5	1,20	X	0,80	=	0,96	X	0,08	=	0,08
B6	1,30	X	1,10	=	1,43	X	0,08	=	0,11
			ÁREA	=	**12,89**		**VOLUME**	=	**1,03**

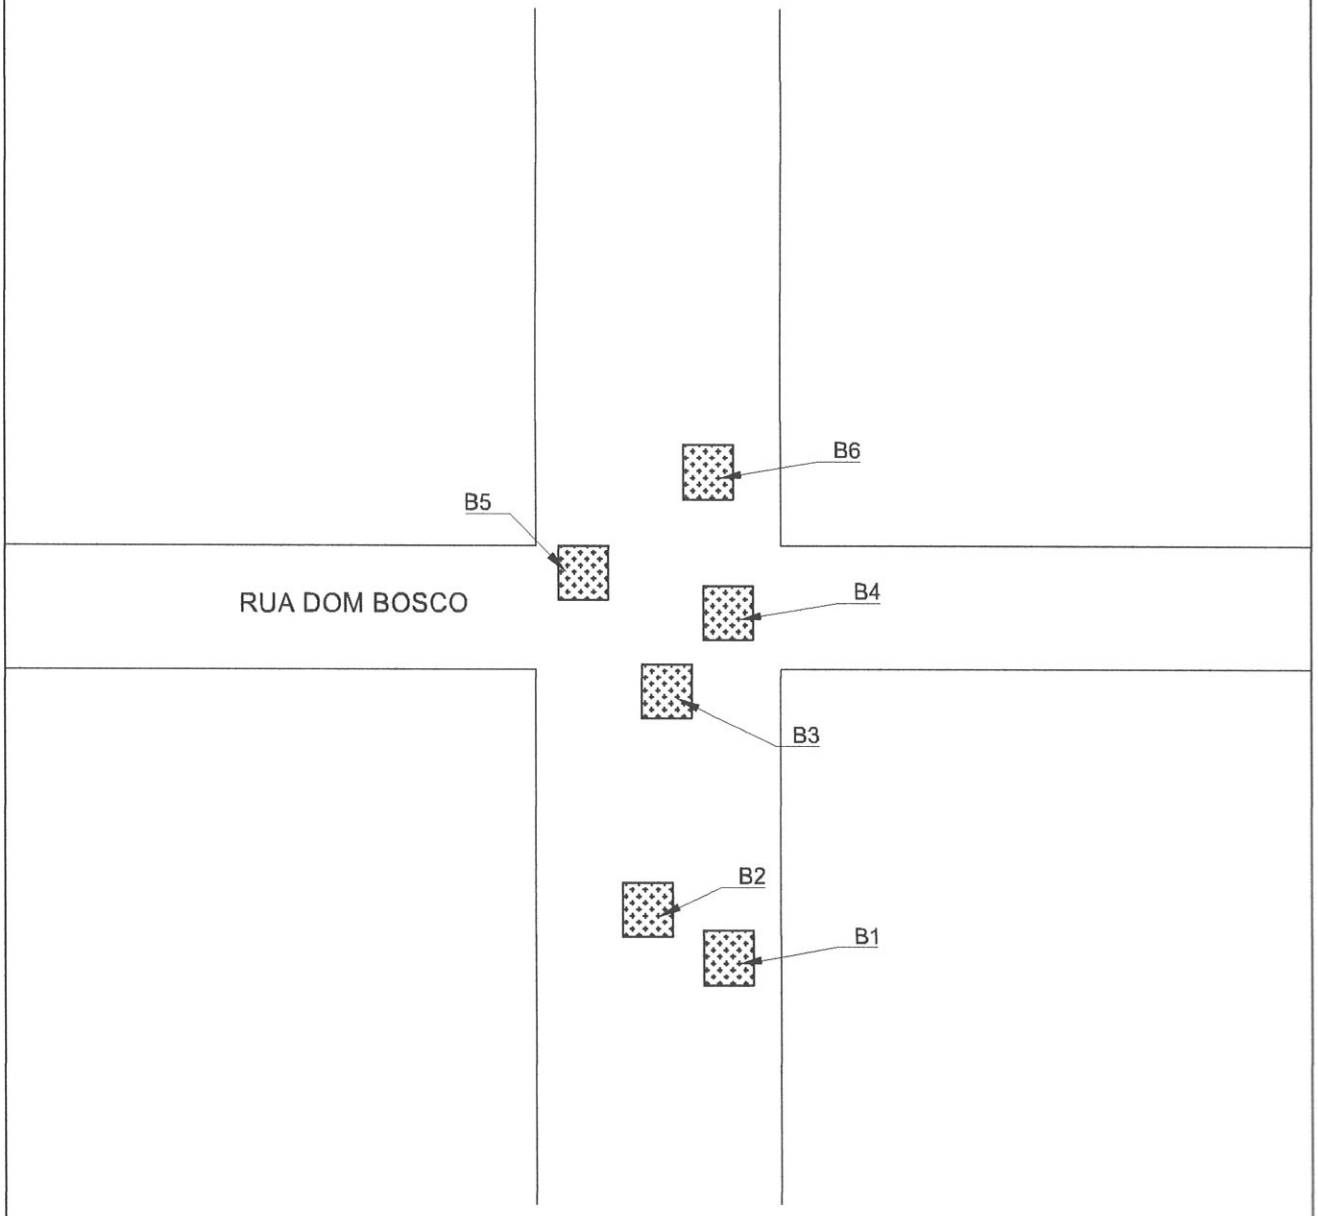

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 40979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 24	**LOCALIDADE:** RUA SÃO BENEDITO	**BAIRRO:** FRANCISCANOS	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 11/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	**LONG.:** 465755 **LAT.:** 9202765

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID 24

ENDEREÇO RUA SÃO BENEDITO

BAIRRO FRANCISCANOS

TRECHO CRUZAMENTO COM A RUA DOM BOSCO

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO PHILIPPE E FRANKLIM

DATA MEDIÇÃO 11/03/2026

EMPRESA EXECUTORA CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	24	RUA SÃO BENEDITO				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	12,89	R$ 1,84	R$ 23,72
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	1,03	R$ 1.696,15	R$ 1.749,07
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S TRANSP)	M2	12,89	R$ 0,33	R$ 4,25
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,01	R$ 3.062,93	R$ 15,79
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,15	R$ 472,85	R$ 72,95
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	2,64	R$ 30,12	R$ 79,51
					TOTAL	R$ 1.945,29

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

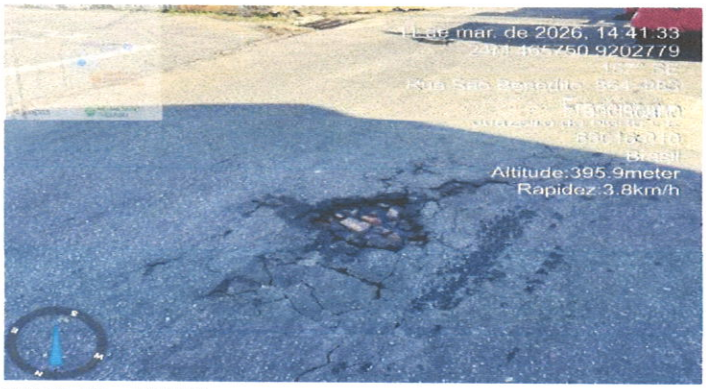

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

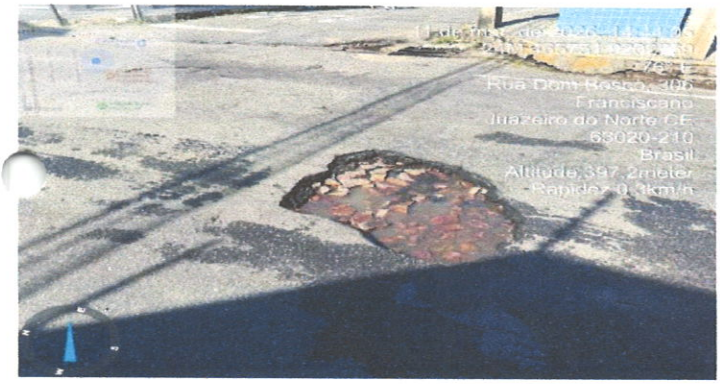

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - B1 E B2

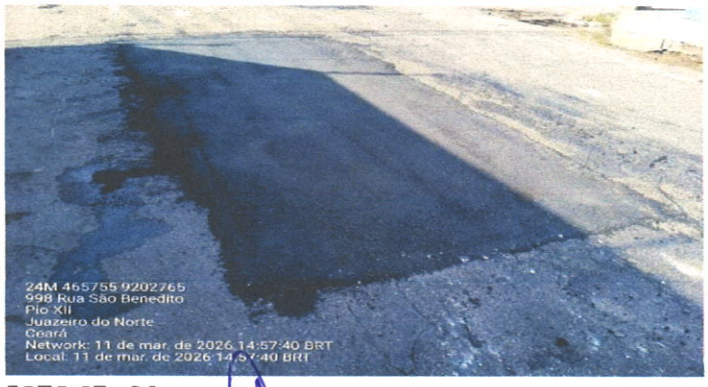

FOTO 07 - B3

FOTO 08 - B4 E B5

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - B6

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 12.03.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 12 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
25	RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA	TIRADENTES

TRECHO

ENTRE A TRAVESSA BEATO JOSE LOURENÇO E A RUA CEL. FILEMON TELES

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	12/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	25	RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	49,35	R$ 1,84	R$ 90,80
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	3,16	R$ 1.696,15	R$ 5.356,61
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/ TRANSP)	M2	49,35	R$ 0,33	R$ 16,29
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,02	R$ 3.062,93	R$ 60,46
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,48	R$ 472,85	R$ 225,27
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	8,09	R$ 30,12	R$ 243,61
					TOTAL	R$ 5.993,04

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

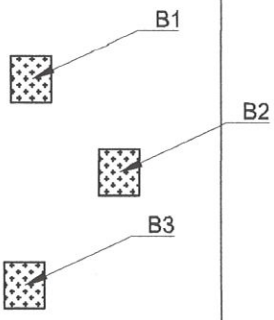



RUA VER. JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA

RUA LUIZ GONZAGA



RUA BEATO JOSÉ LOURENÇO

B1	1,40	X	0,90	=	1,26	X	0,05	=	0,06
B2	1,90	X	1,50	=	2,85	X	0,03	=	0,14
B3	2,20	X	1,40	=	3,08	X	0,05	=	0,15
B4	8,20	X	0,70	=	5,74	X	0,08	=	0,46
B5	3,30	X	1,10	=	3,63	X	0,08	=	0,29
B6	3,90	X	3,50	=	13,65	X	0,08	=	1,09
B7	7,90	X	1,80	=	14,22	X	0,05	=	0,71
B8	4,10	X	1,20	=	4,92	X	0,05	=	0,25
			ÁREA	=	49,35		VOLUME	=	3,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 25	**LOCALIDADE:** RUA VER. JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA	**BAIRRO:** TIRADENTES	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 12/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	**LONG.:** 466550 **LAT.:** 9200771

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

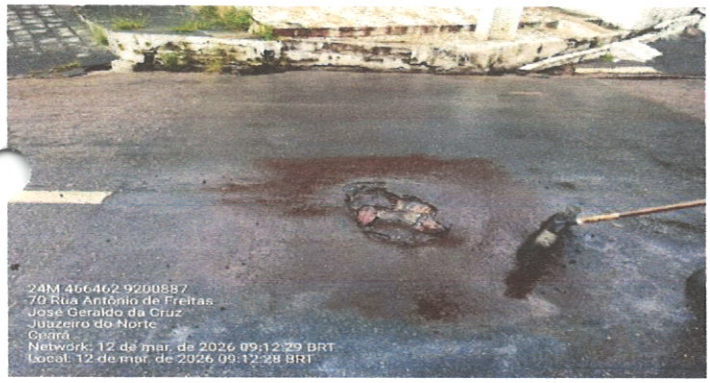

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

FOTO 07 - B1

FOTO 08 - B2

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - B3

FOTO 10 - B4 A B6

FOTO 11 - B7

FOTO 12 - B8

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 13.03.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA MANOEL GOUVEIA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 13 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

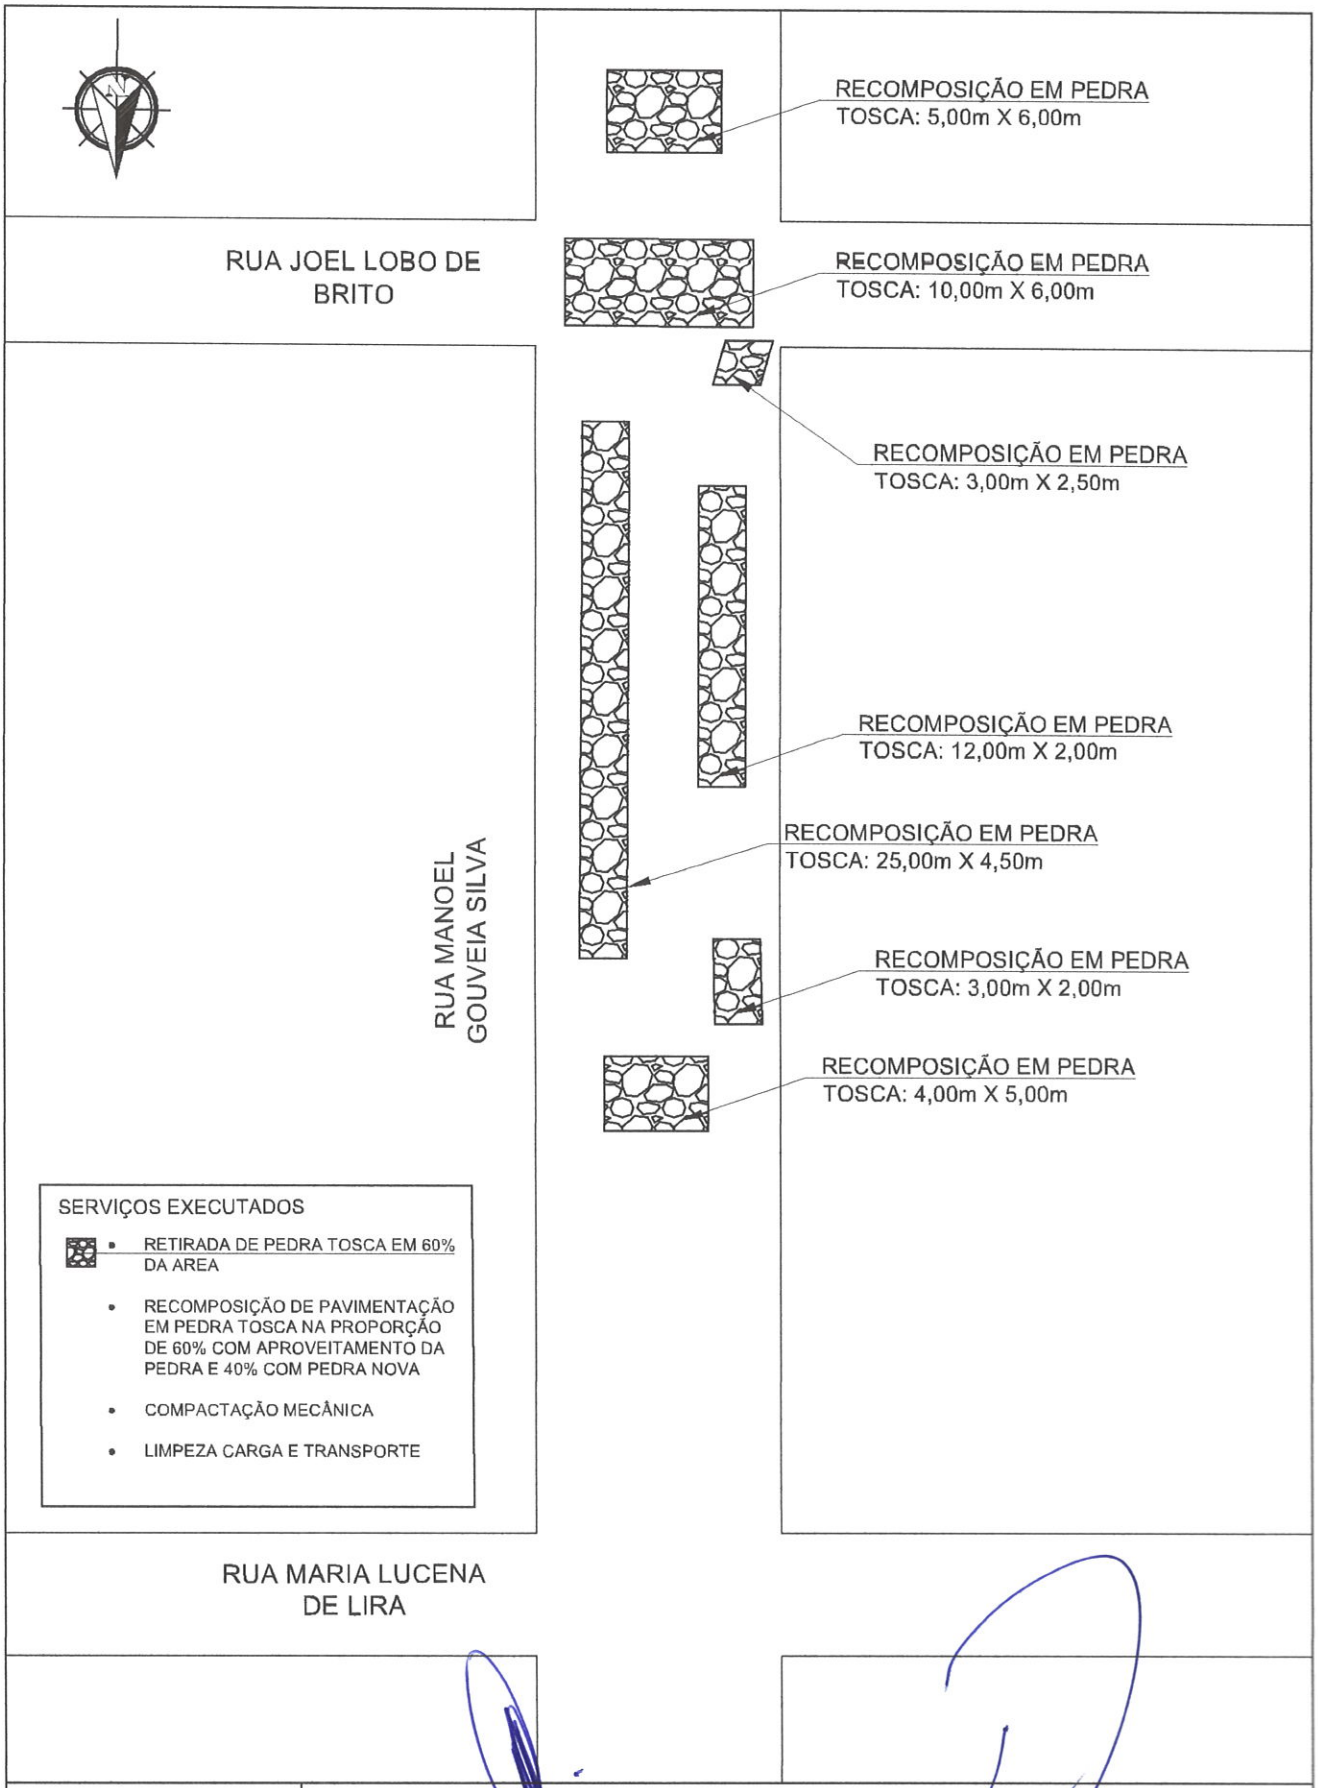

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 26	**LOCALIDADE:** RUA MANOEL GOUVEIA SILVA	**BAIRRO:** AEROPORTO	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 468978 **LAT.:** 9203408
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	**DATA:** 31/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
26	RUA MANOEL GOUVEIA	AEROPORTO

TRECHO

ENTRE A RUA MARIA LUCENA DE LIRA E A RUA JOEL LOBO DE BRITO

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
HEITOR BORGES	31/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	26	RUA MANOEL GOUVEIA					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	258,50	R$ 1,84	R$	475,64
1.4	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	155,10	R$ 14,68	R$	2.276,87
1.13	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	155,10	R$ 1,35	R$	209,39
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,80	R$ 4,99	R$	83,84
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	16,80	R$ 41,23	R$	692,77
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM					
2.9	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	103,40	R$ 78,14	R$	8.079,68
2.11	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	155,10	R$ 37,98	R$	5.890,70
					TOTAL	R$	17.708,89

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

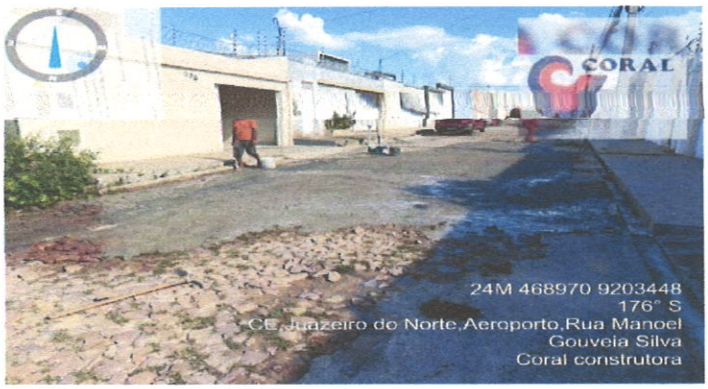

FOTO 02 - DEPOIS (1)

FOTO 03 - DEPOIS (1)

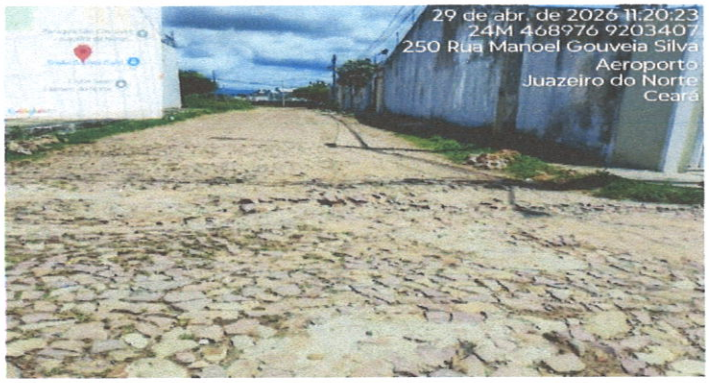

FOTO 04 - DEPOIS (2)

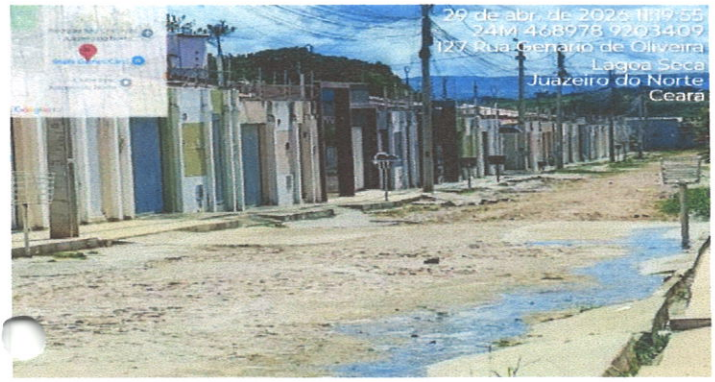

FOTO 05 - DEPOIS (3)

FOTO 06 - DEPOIS (4)

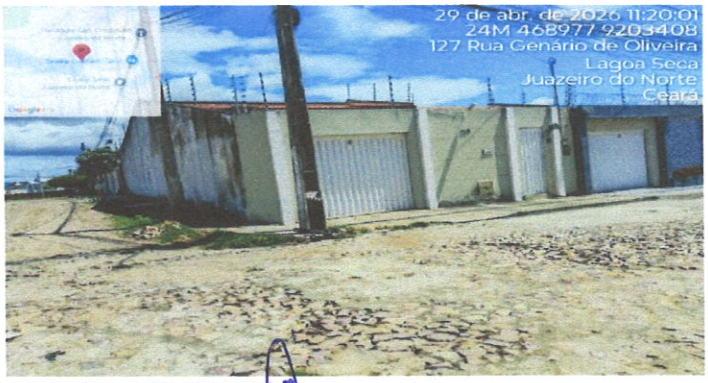

FOTO 07 - DEPOIS (5)

FOTO 08 - DEPOIS (6)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 16.03.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 16 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



RUA RAIMUNDO SARAIVA COELHO

AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA

B1	5,20	X	2,10	=	10,92	X	0,10	=	1,09
B2	4,00	X	0,90	=	3,60	X	0,10	=	0,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 27	**LOCALIDADE:** AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA		**BAIRRO:** AEROPORTO	**PRANCHA:** 1/7
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**	
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 16/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	**LONG.:** 467256	
			LAT.: 9202813	

B3	3,90	X	2,50	=	9,75	X	0,05	=	0,49
B4	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,05	=	0,11
B5	6,80	X	1,60	=	10,88	X	0,05	=	0,54
B6	2,10	X	1,70	=	3,57	X	0,05	=	0,18
B7	2,40	X	1,70	=	4,08	X	0,05	=	0,20
B8	2,10	X	1,70	=	3,57	X	0,05	=	0,18
B9	4,00	X	1,90	=	7,60	X	0,05	=	0,38
B10	2,80	X	1,60	=	4,48	X	0,05	=	0,22
B11	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,05	=	0,07
B12	2,10	X	1,40	=	2,94	X	0,05	=	0,15
B13	2,80	X	1,10	=	3,08	X	0,05	=	0,15
B14	1,60	X	1,20	=	1,92	X	0,05	=	0,10
B15	3,60	X	1,80	=	6,48	X	0,05	=	0,32
B16	3,30	X	1,20	=	3,96	X	0,05	=	0,20

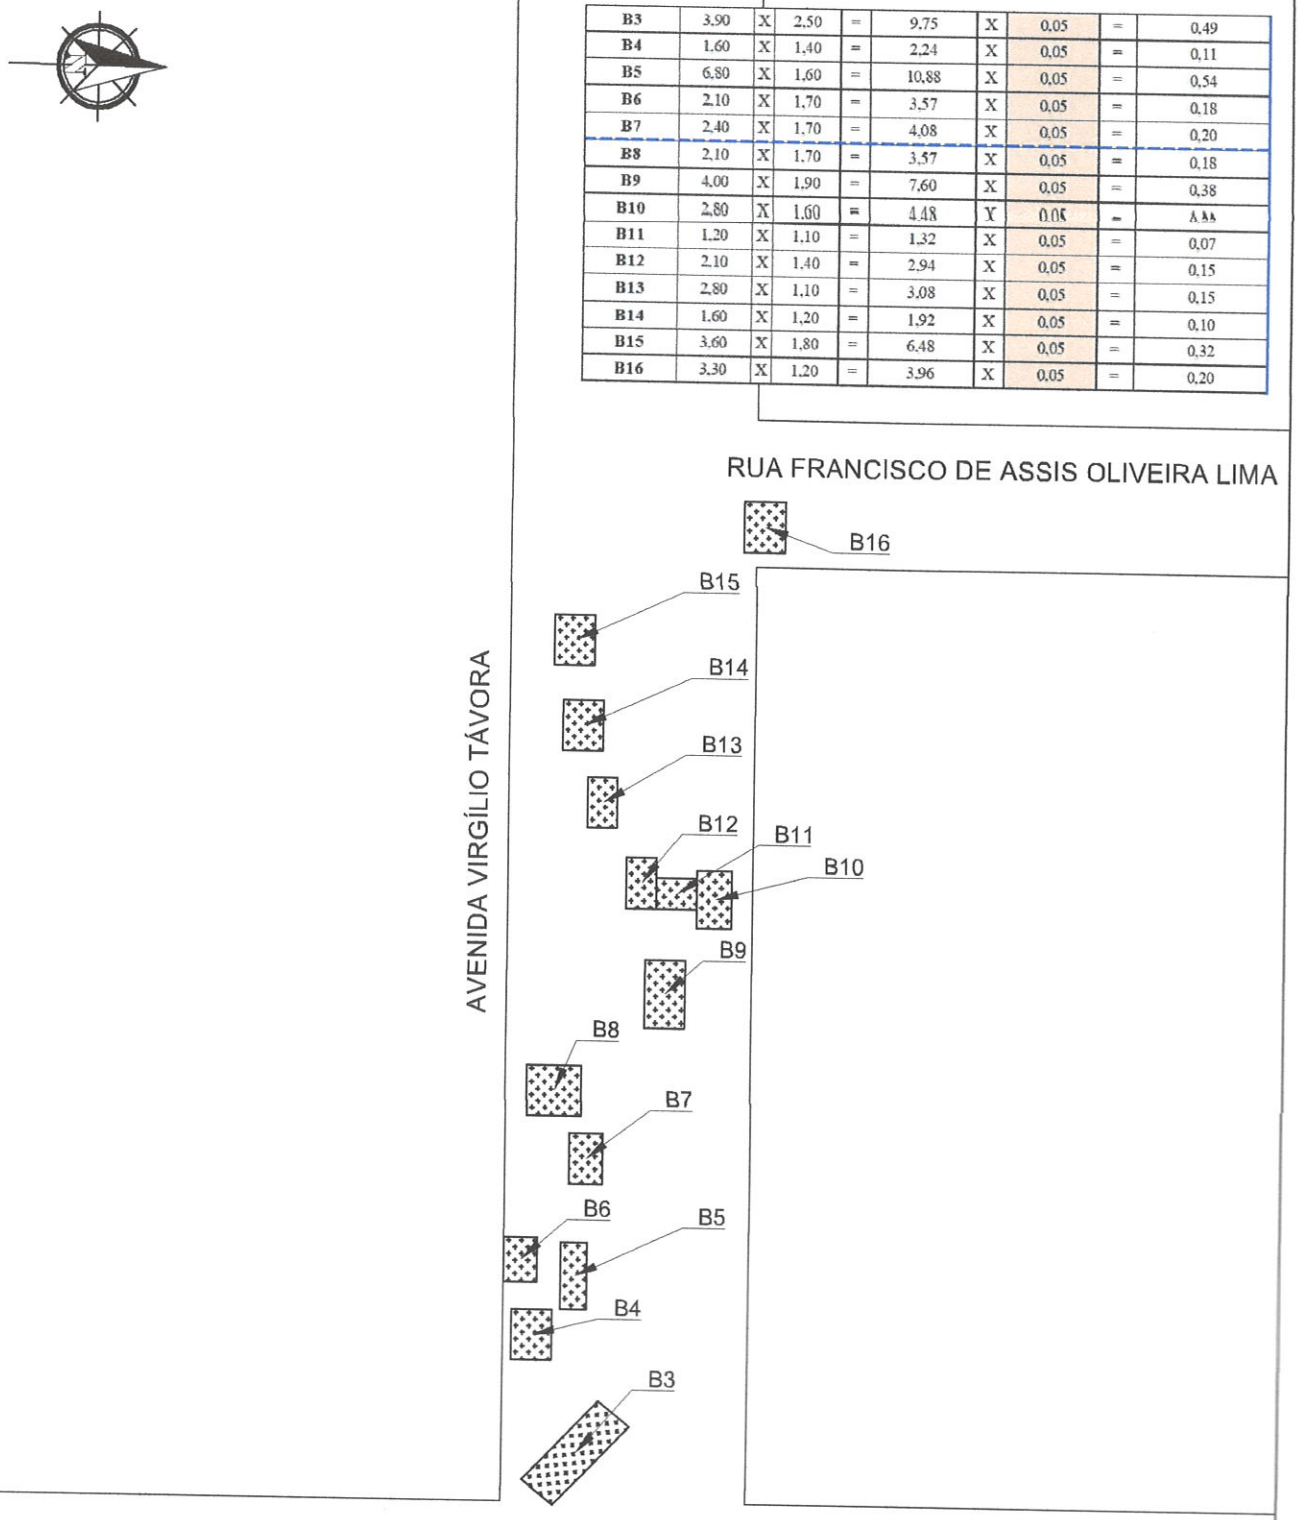

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 27	**LOCALIDADE:** AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	**BAIRRO:** AEROPORTO	**PRANCHA:** 2/7
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO		**COORDENADAS UTM**	
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 18/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	**LONG.:** 467256 **LAT.:** 9202813



RUA VICÊNCIA BEZERRA DE OLIVEIRA

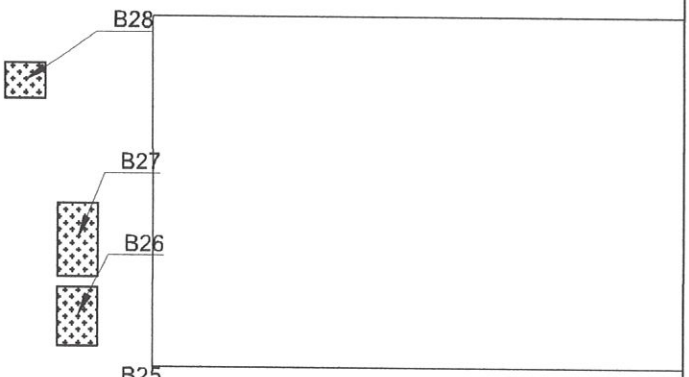

B17	2,60	X	1,60	=	4,16	X	0,03	=	0,12
B18	2,40	X	2,20	=	5,28	X	0,03	=	0,16
B19	3,50	X	2,30	=	8,05	X	0,03	=	0,24
B20	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,03	=	0,04
B21	2,30	X	1,50	=	3,45	X	0,03	=	0,10
B22	2,30	X	1,40	=	3,22	X	0,03	=	0,10
B23	2,20	X	2,20	=	4,84	X	0,03	=	0,15
B24	1,50	X	1,30	=	1,95	X	0,03	=	0,06
B25	5,30	X	1,70	=	9,01	X	0,03	=	0,27
B26	5,70	X	2,00	=	11,40	X	0,03	=	0,34
B27	2,50	X	1,90	=	4,75	X	0,03	=	0,14
B28	1,20	X	1,20	=	1,44	X	0,03	=	0,04
B29	6,30	X	3,70	=	23,31	X	0,03	=	0,70

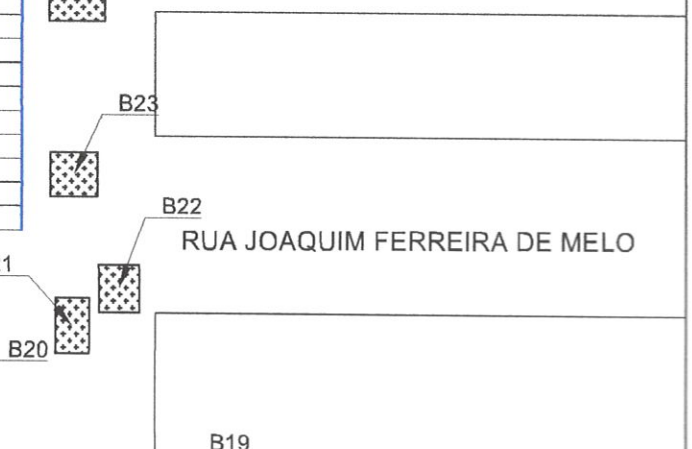

AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA

RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LIMA

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 27	**LOCALIDADE:** AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	**BAIRRO:** AEROPORTO	**PRANCHA:** 3/7
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 467256 **LAT.:** 9202813
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 19/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

B30	3,80	X	2,70	=	10,26	X	0,05	=	0,51
B31	11,30	X	1,10	=	12,43	X	0,05	=	0,62
B32	6,20	X	0,80	=	4,96	X	0,05	=	0,25
B33	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06
B34	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,05	=	0,06
B35	1,40	X	0,80	=	1,12	X	0,05	=	0,06
B36	4,00	X	1,20	=	4,80	X	0,05	=	0,24
B37	3,40	X	0,90	=	3,06	X	0,05	=	0,15
B38	4,50	X	2,00	=	9,00	X	0,05	=	0,45

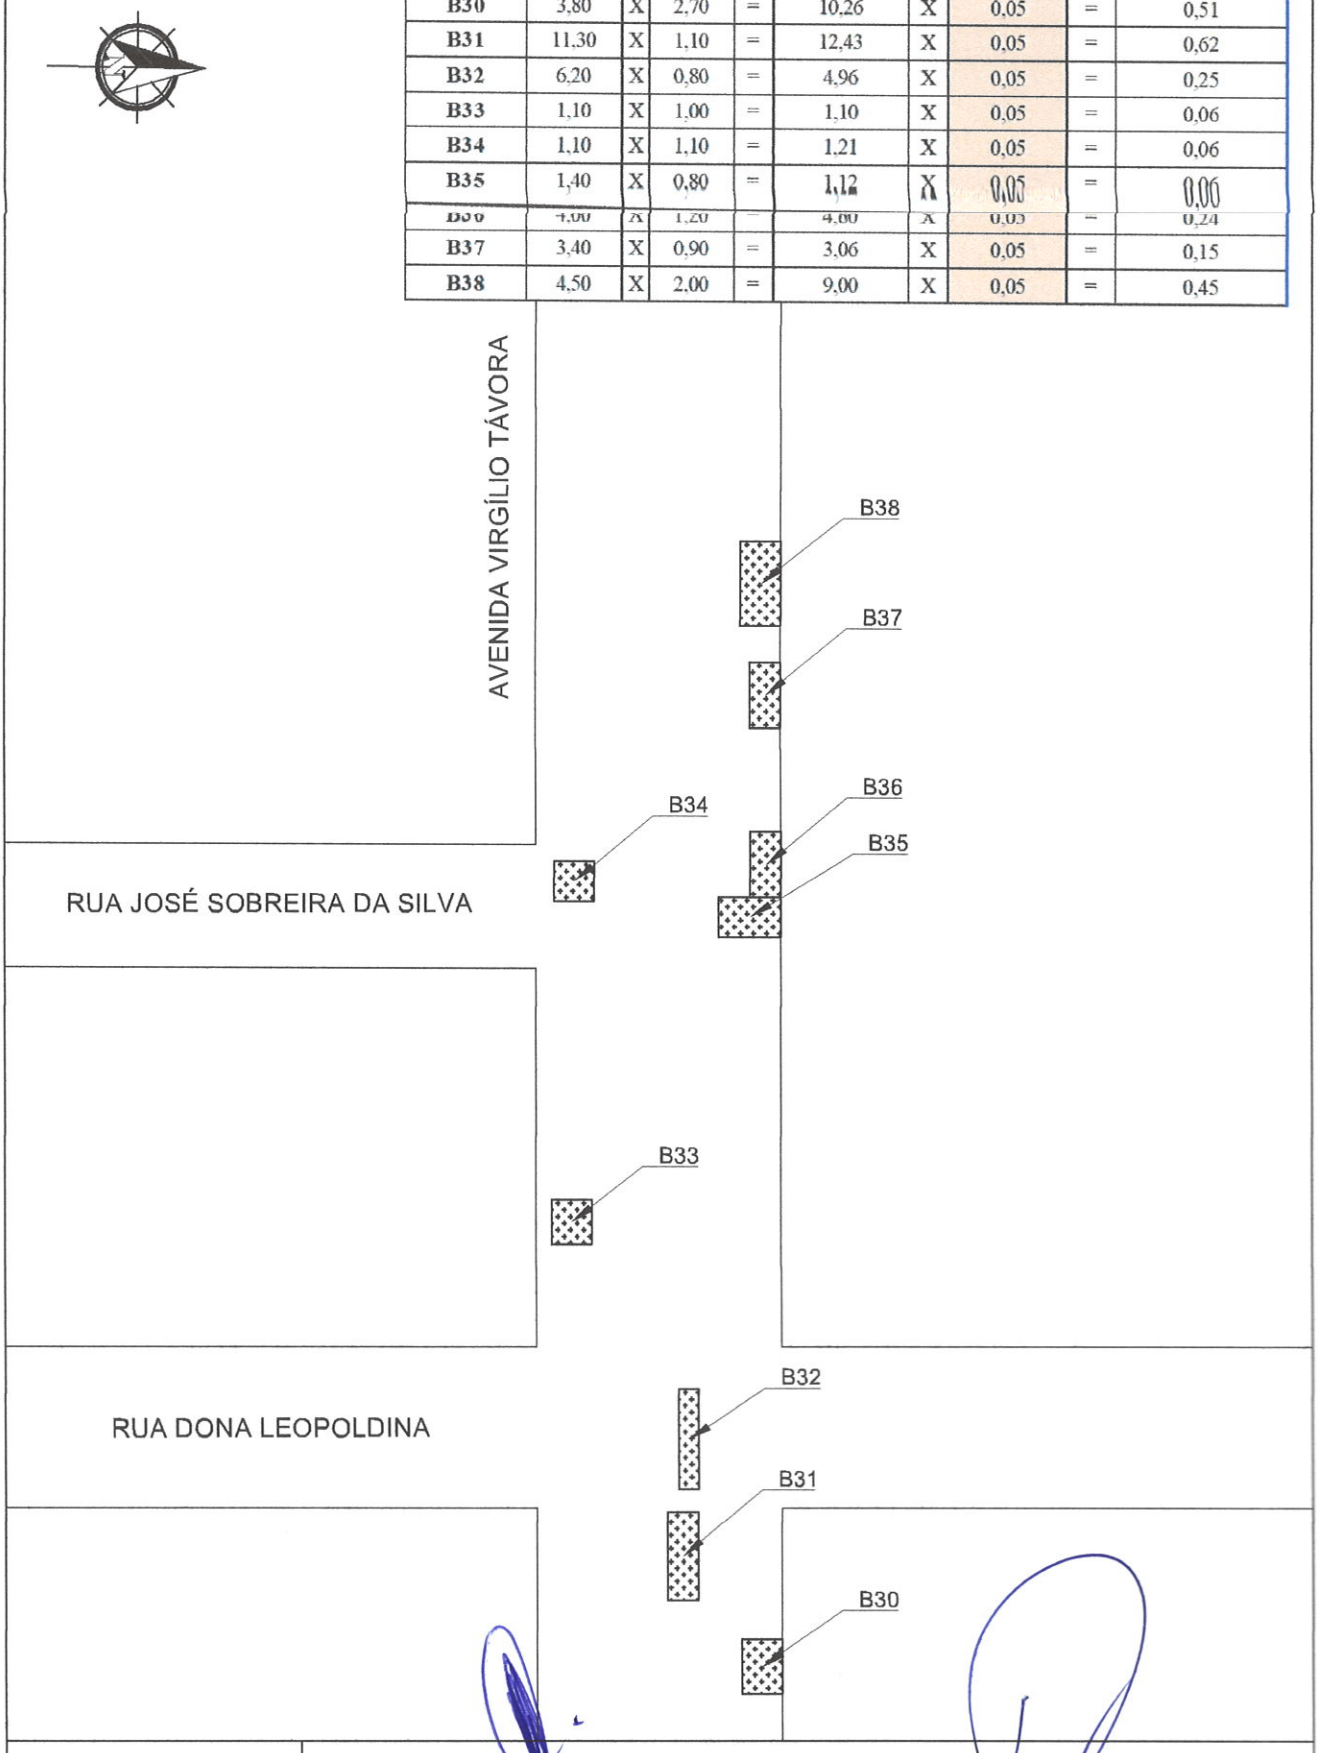

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 27	**LOCALIDADE:** AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	**BAIRRO:** AEROPORTO	**PRANCHA:** 4/7
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO		**COORDENADAS UTM**	
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 19/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	**LONG.:** 467256 **LAT.:** 9202813

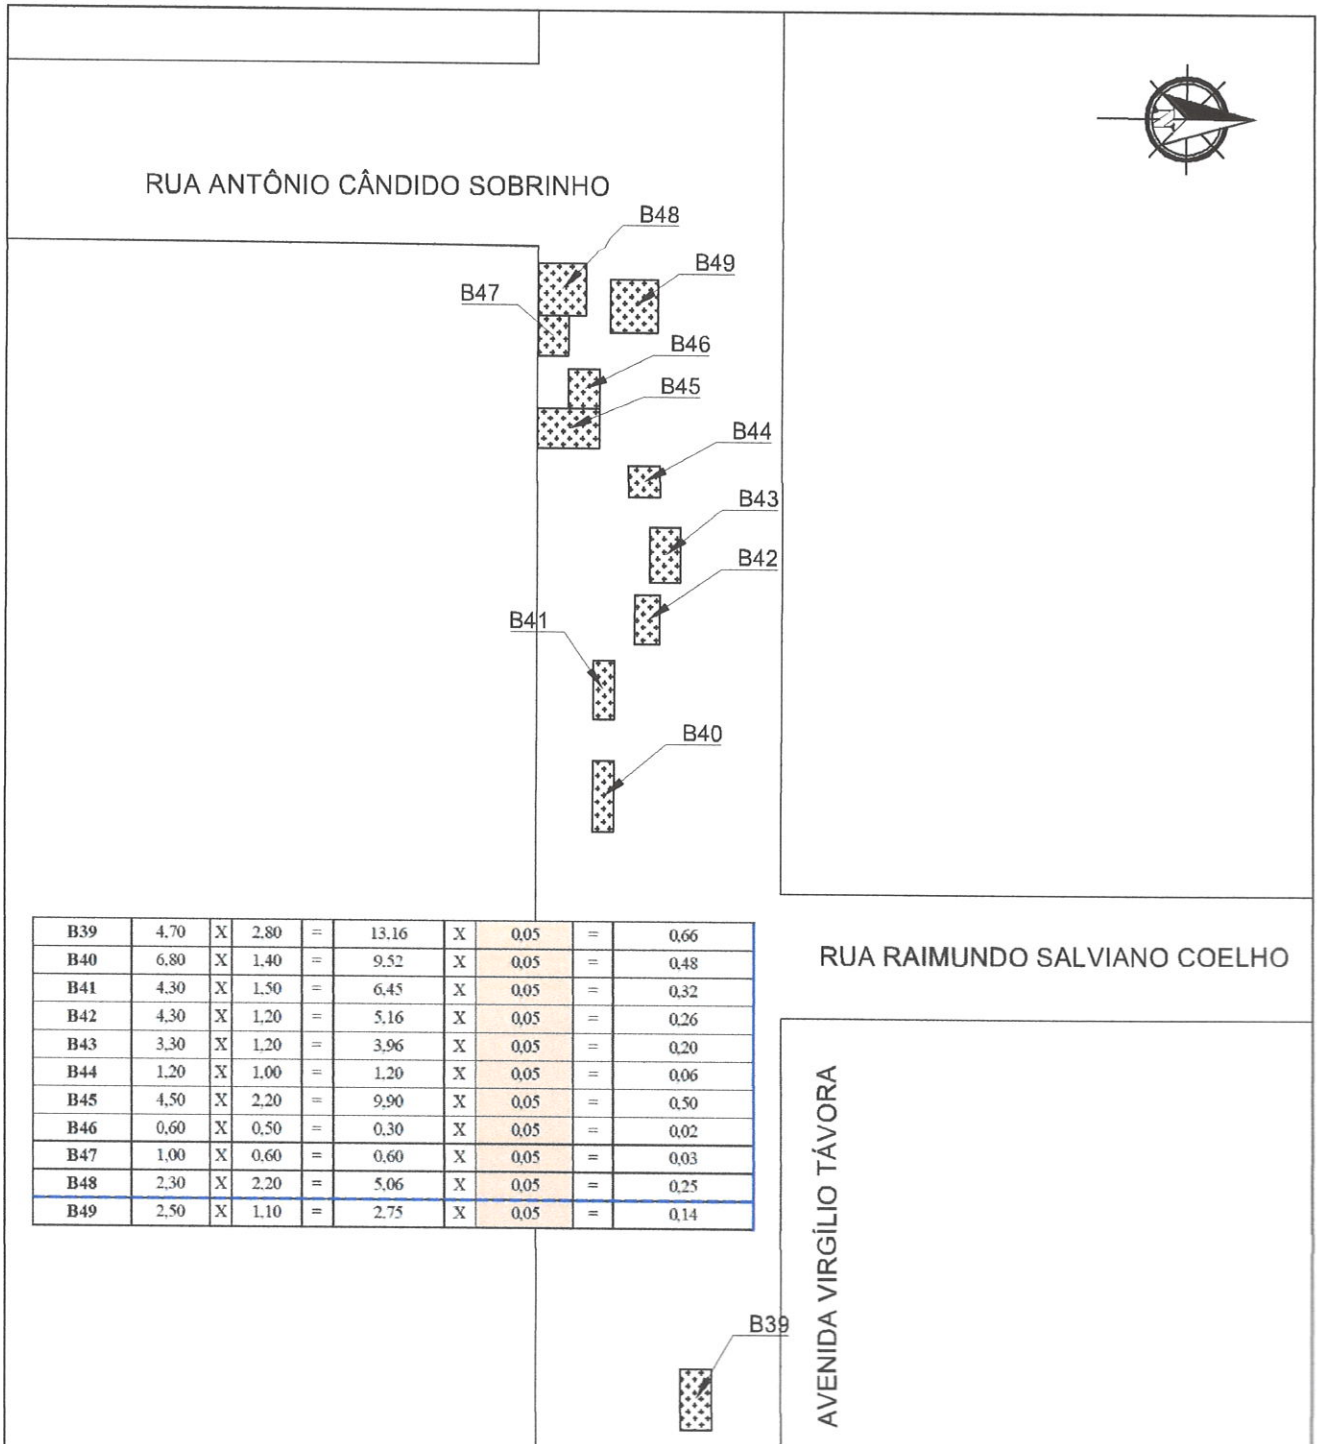

B39	4,70	X	2,80	=	13,16	X	0,05	=	0,66
B40	6,80	X	1,40	=	9,52	X	0,05	=	0,48
B41	4,30	X	1,50	=	6,45	X	0,05	=	0,32
B42	4,30	X	1,20	=	5,16	X	0,05	=	0,26
B43	3,30	X	1,20	=	3,96	X	0,05	=	0,20
B44	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06
B45	4,50	X	2,20	=	9,90	X	0,05	=	0,50
B46	0,60	X	0,50	=	0,30	X	0,05	=	0,02
B47	1,00	X	0,60	=	0,60	X	0,05	=	0,03
B48	2,30	X	2,20	=	5,06	X	0,05	=	0,25
B49	2,50	X	1,10	=	2,75	X	0,05	=	0,14

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 27	**LOCALIDADE:** AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	**BAIRRO:** AEROPORTO	**PRANCHA:** 5/7
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 467256 **LAT.:** 9202813
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

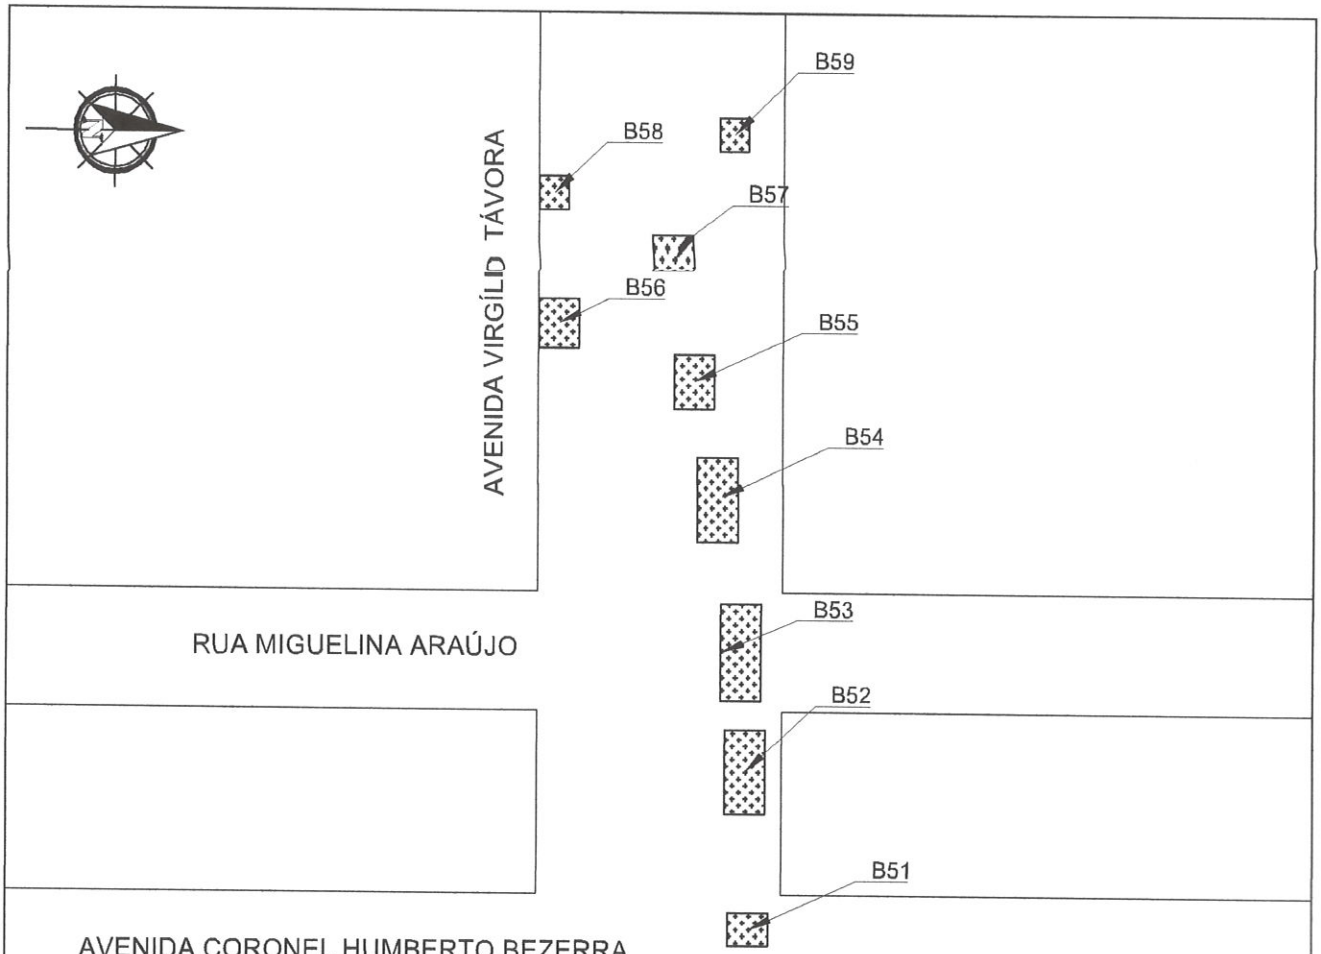

B50	3.30	X	2.20	=	7,26	X	0.05	=	0.36
B51	4.60	X	3.50	=	16.10	X	0.05	=	0.81
B52	14.20	X	1.40	=	19.88	X	0.05	=	0.99
B53	3.80	X	1.20	=	4,56	X	0.05	=	0.23
B54	4.50	X	1.10	=	4,95	X	0.05	=	0.25
B55	2.00	X	0.90	=	1,80	X	0.05	=	0.09
B56	2.30	X	1.50	=	3,45	X	0.05	=	0.17
B57	1.40	X	1.30	=	1,82	X	0.05	=	0.09
B58	1.90	X	1.60	=	3,04	X	0.05	=	0.15
B59	1.60	X	1.60	=	2,56	X	0.05	=	0.13

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 27	**LOCALIDADE:** AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	**BAIRRO:** AEROPORTO	**PRANCHA:** 6/7
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO		**COORDENADAS UTM** LONG.: 467256 LAT.: 9202813	
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

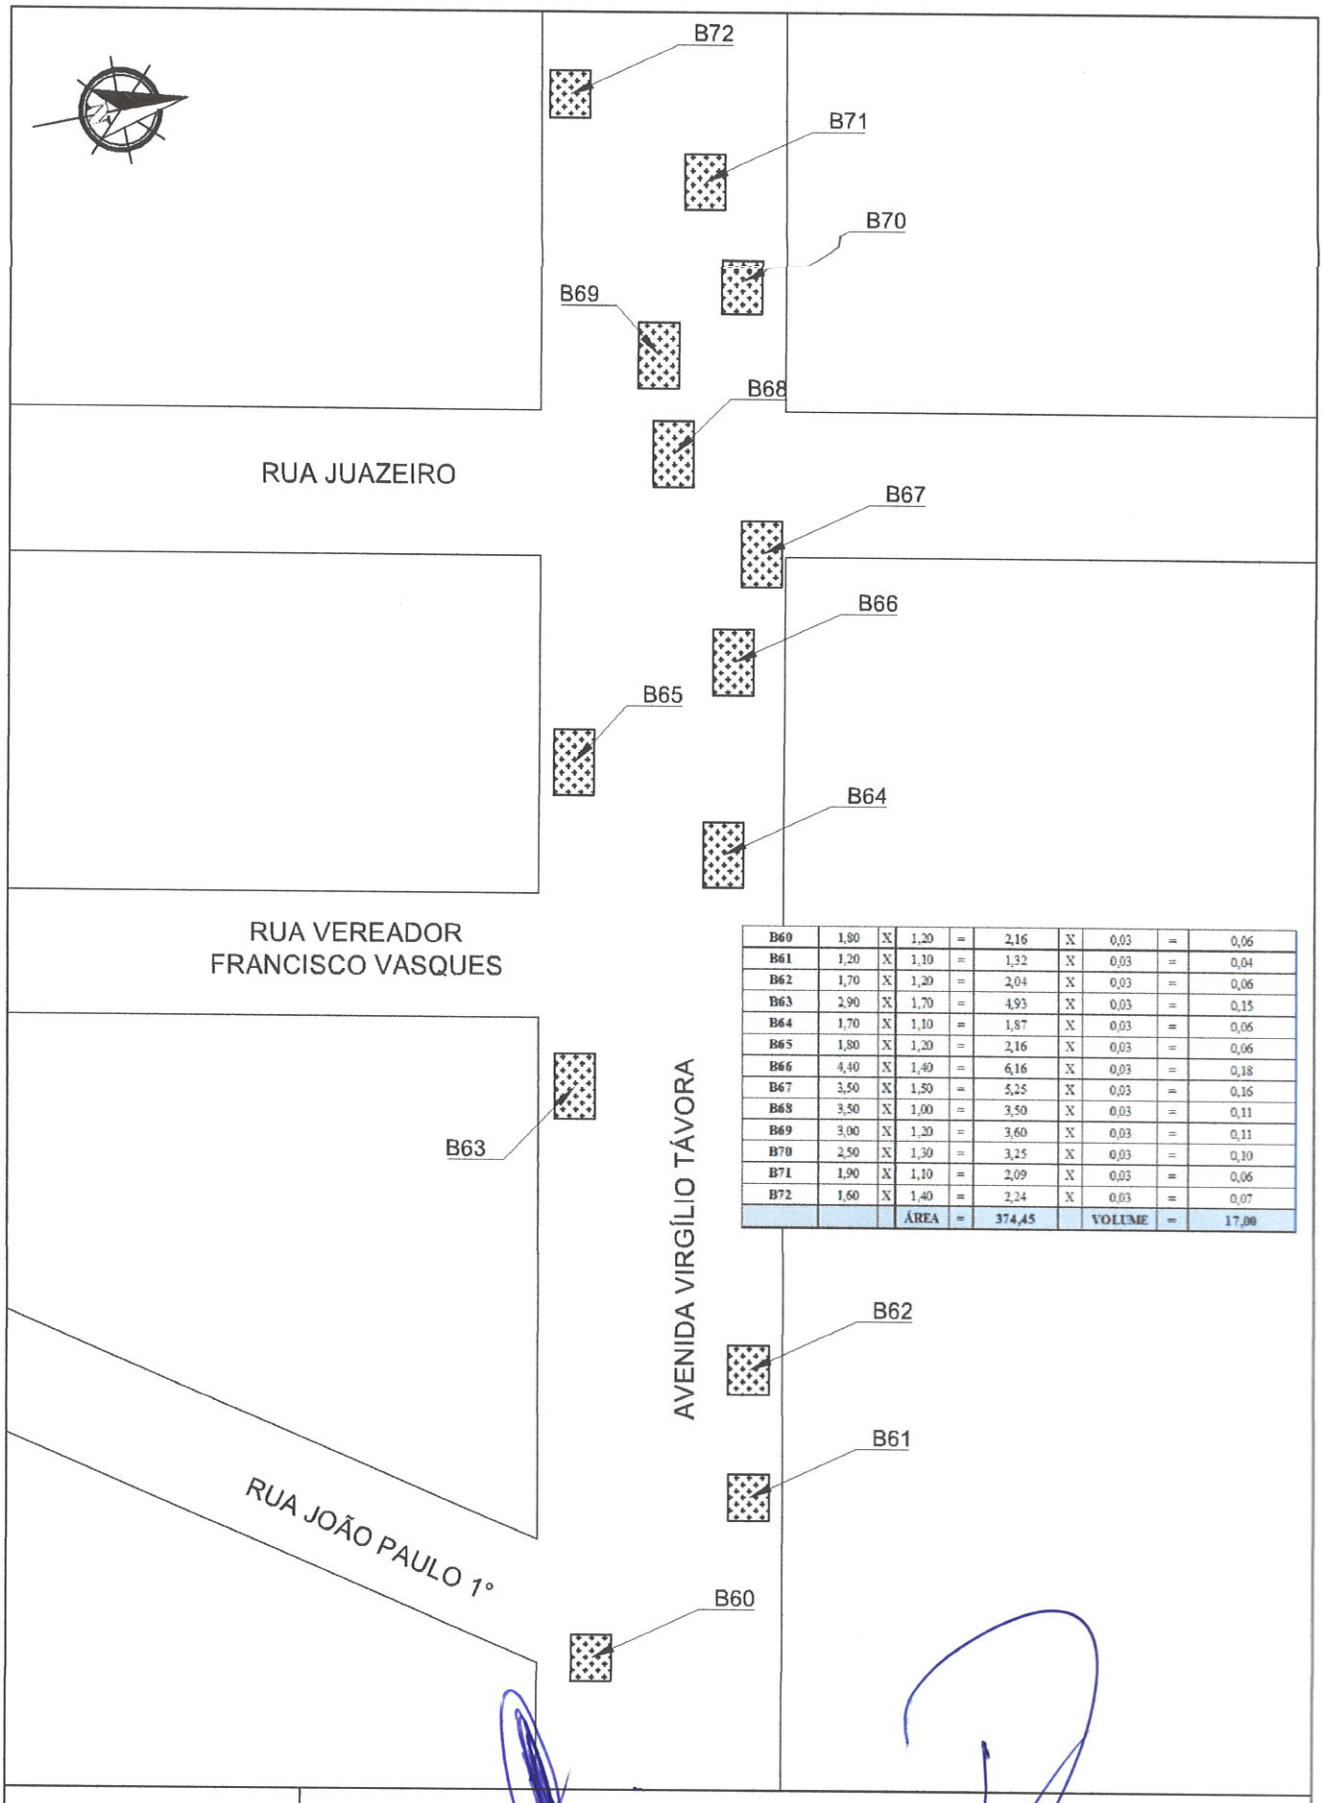

B60	1,80	X	1,20	=	2,16	X	0,03	=	0,06
B61	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,03	=	0,04
B62	1,70	X	1,20	=	2,04	X	0,03	=	0,06
B63	2,90	X	1,70	=	4,93	X	0,03	=	0,15
B64	1,70	X	1,10	=	1,87	X	0,03	=	0,06
B65	1,80	X	1,20	=	2,16	X	0,03	=	0,06
B66	4,40	X	1,40	=	6,16	X	0,03	=	0,18
B67	3,50	X	1,50	=	5,25	X	0,03	=	0,16
B68	3,50	X	1,00	=	3,50	X	0,03	=	0,11
B69	3,00	X	1,20	=	3,60	X	0,03	=	0,11
B70	2,50	X	1,30	=	3,25	X	0,03	=	0,10
B71	1,90	X	1,10	=	2,09	X	0,03	=	0,06
B72	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,03	=	0,07
			ÁREA	=	374,45		VOLUME	=	17,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engª Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 27	**LOCALIDADE:** AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA	**BAIRRO:** TIMBAÚBAS	**PRANCHA:** 7/7
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO		**COORDENADAS UTM** LONG.: 467256 LAT.: 9202813	
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID 27

ENDEREÇO AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA

BAIRRO AEROPORTO

TRECHO ENTRE O AEROPORTO E A AV. JOSE BEZERRA DE MENEZES

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO PHILIPPE E FRANKLIM

DATA MEDIÇÃO 18/03/2026

EMPRESA EXECUTORA CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	27	AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA						
ITEM	**COD**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID**	**QTDE**	**P. UNIT. C/ B.D.I**		**P. TOTAL C/ B.D.I**	
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	374,45	R$	1,84	R$	688,99
2.0		**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM**						
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	17,00	R$	1.696,15	R$	28.827,26
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	374,45	R$	0,33	R$	123,57
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,15	R$	3.062,93	R$	458,77
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	2,61	R$	472,85	R$	1.232,90
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	43,57	R$	30,12	R$	1.312,34
						TOTAL	R$	32.643,83

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

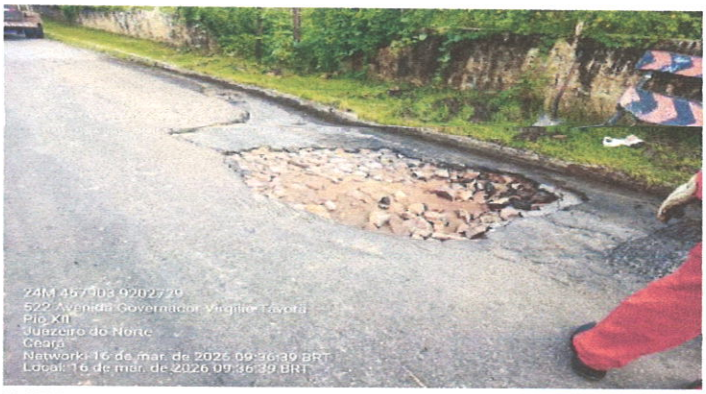

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

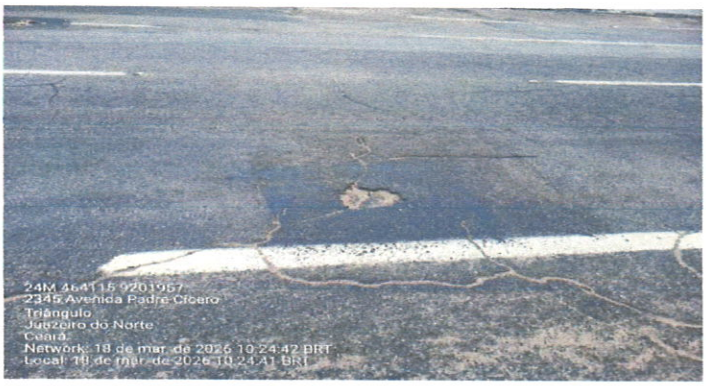

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engª Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - ANTES

FOTO 10 - ANTES

FOTO 11 - ANTES

FOTO 12 - ANTES

FOTO 13 - ANTES

FOTO 14 - ANTES

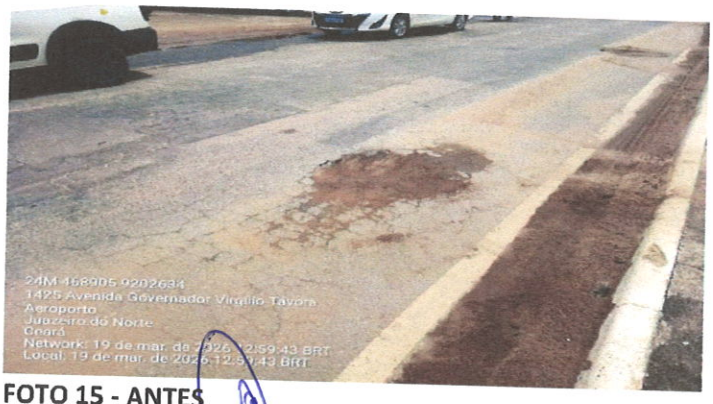

FOTO 15 - ANTES

FOTO 16 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 17 - ANTES

FOTO 18 - ANTES

FOTO 19 - ANTES

FOTO 20 - ANTES

FOTO 21 - ANTES

FOTO 22 - ANTES

FOTO 23 - ANTES

FOTO 24 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 25 - ANTES

FOTO 26 - ANTES

FOTO 27 - ANTES

FOTO 28 - ANTES

FOTO 29 - ANTES

FOTO 30 - ANTES

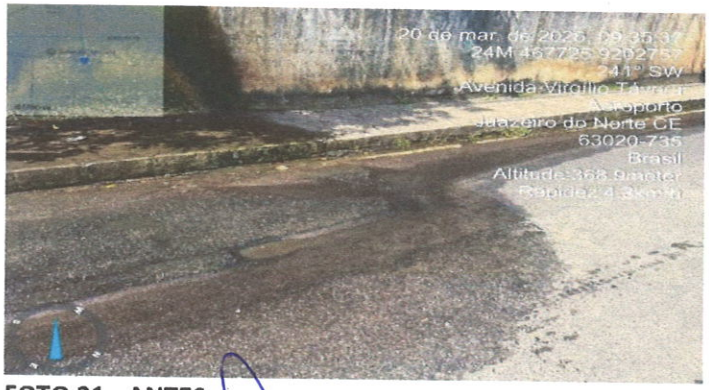

FOTO 31 - ANTES

FOTO 32 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 33 - ANTES

FOTO 34 - ANTES

FOTO 35 - ANTES

FOTO 36 - ANTES

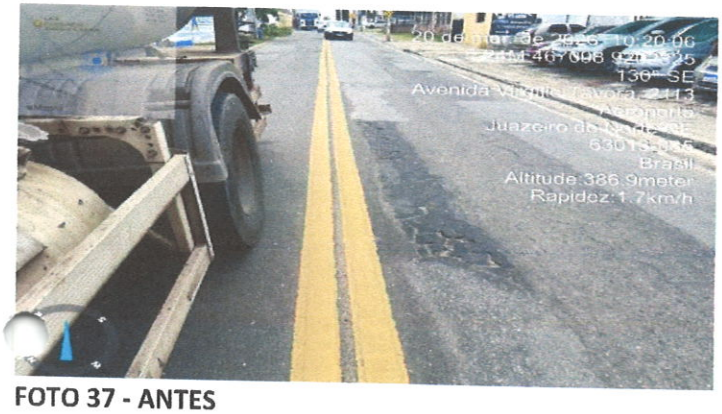

FOTO 37 - ANTES

FOTO 38 - ANTES

FOTO 39 - ANTES

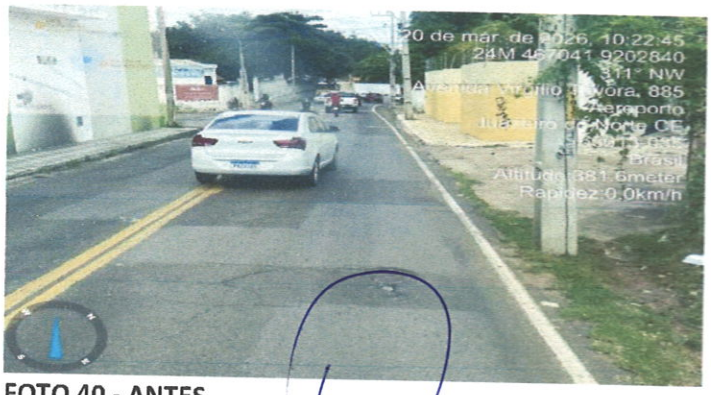

FOTO 40 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engª Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 41 - ANTES

FOTO 42 - ANTES

FOTO 43 - ANTES

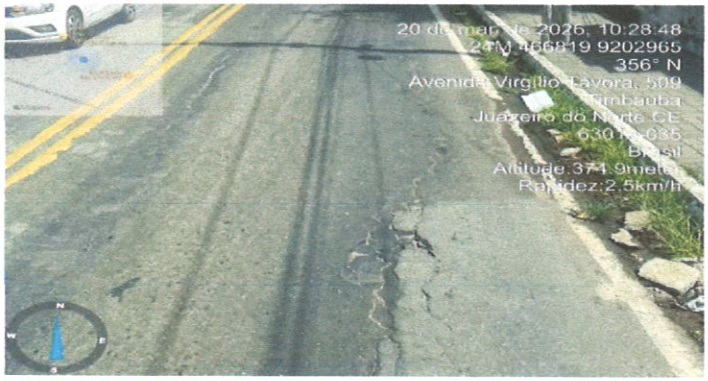

FOTO 44 - ANTES

FOTO 45 - ANTES

FOTO 46 - ANTES

FOTO 47 - B1 E B2

FOTO 48 - B3 E B4

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 49 - B5 E B6

FOTO 50 - B7 E B8

FOTO 51 - B9 A B12

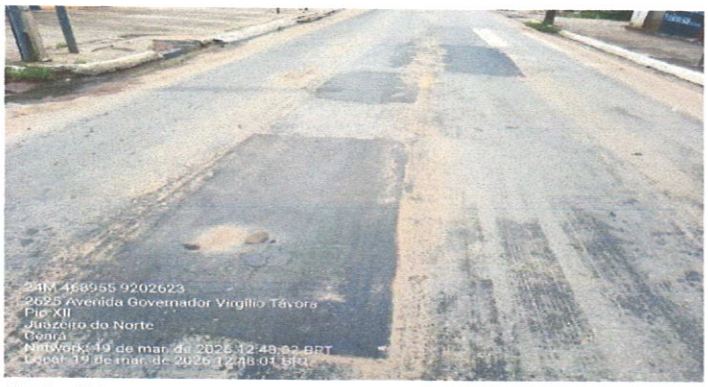

FOTO 52 - B13 A B15

FOTO 53 - B16

FOTO 54 - B17

FOTO 55 - B18 E B19

FOTO 56 - B20

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 57 - B21 A B23

FOTO 58 - B24 E B25

FOTO 59 - B26

FOTO 60 - B27

FOTO 61 - B28

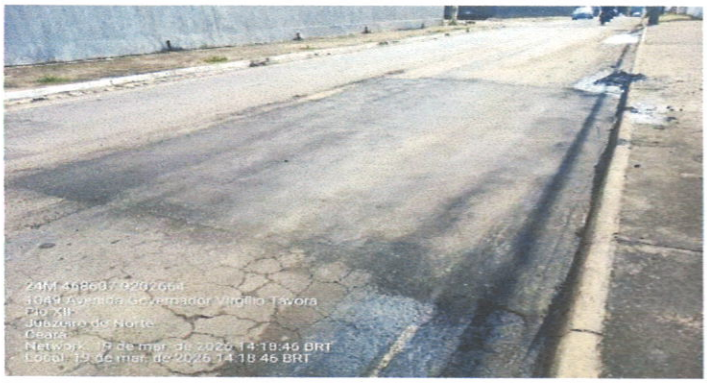

FOTO 62 - B29

FOTO 63 - B30

FOTO 64 - B31

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 65 - B32

FOTO 66 - B33

FOTO 67 - B34

FOTO 68 - B35 E B36

FOTO 69 - B37 E B38

FOTO 70 - B39

FOTO 71 - B40

FOTO 72 - B41

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 73 - B42

FOTO 74 - B43

FOTO 75 - B44

FOTO 76 - B45 E B46

FOTO 77 - B47, B48 E B49

FOTO 78 - B50

FOTO 79 - B51

FOTO 80 - B52

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 81 - B53

FOTO 82 - B54

FOTO 83 - B55 E B56

FOTO 84 - B57

FOTO 85 - B58

FOTO 86 - B59

FOTO 87 - B60

FOTO 88 - B61

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 89 - B62

FOTO 90 - B63

FOTO 91 - B64

FOTO 92 - B65

FOTO 93 - B66 E B67

FOTO 94 - B68 E B69

FOTO 95 - B70

FOTO 96 - B71

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 97 - B72

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 16.03.2026-02	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) ESTRADA DO SÃO GONÇALO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 16 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

B1	3,60	X	1,80	=	6,48	X	0,05	=	0,32
B2	3,80	X	4,20	=	15,96	X	0,05	=	0,80
B3	3,10	X	2,40	=	7,44	X	0,05	=	0,37
B4	3,30	X	2,20	=	7,26	X	0,05	=	0,36
B5	1,80	X	1,20	=	2,16	X	0,05	=	0,11
B6	2,50	X	2,30	=	5,75	X	0,05	=	0,29
B7	1,80	X	1,30	=	2,34	X	0,05	=	0,12
B8	4,20	X	1,80	=	7,56	X	0,05	=	0,38
B9	1,30	X	1,20	=	1,56	X	0,05	=	0,08
B10	1,30	X	1,20	=	1,56	X	0,05	=	0,08
B11	2,60	X	1,50	=	3,90	X	0,05	=	0,20
B12	3,00	X	3,10	=	9,30	X	0,08	=	0,74
B13	1,30	X	1,20	=	1,56	X	0,05	=	0,08
B14	2,30	X	1,60	=	3,68	X	0,05	=	0,18
B15	2,90	X	1,70	=	4,93	X	0,05	=	0,25

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 28	**LOCALIDADE:** ESTRADA DE SÃO GONÇALO	**BAIRRO:** CARITÉ	**PRANCHA:** 1/13
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 471070 **LAT.:** 9205876
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 16/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

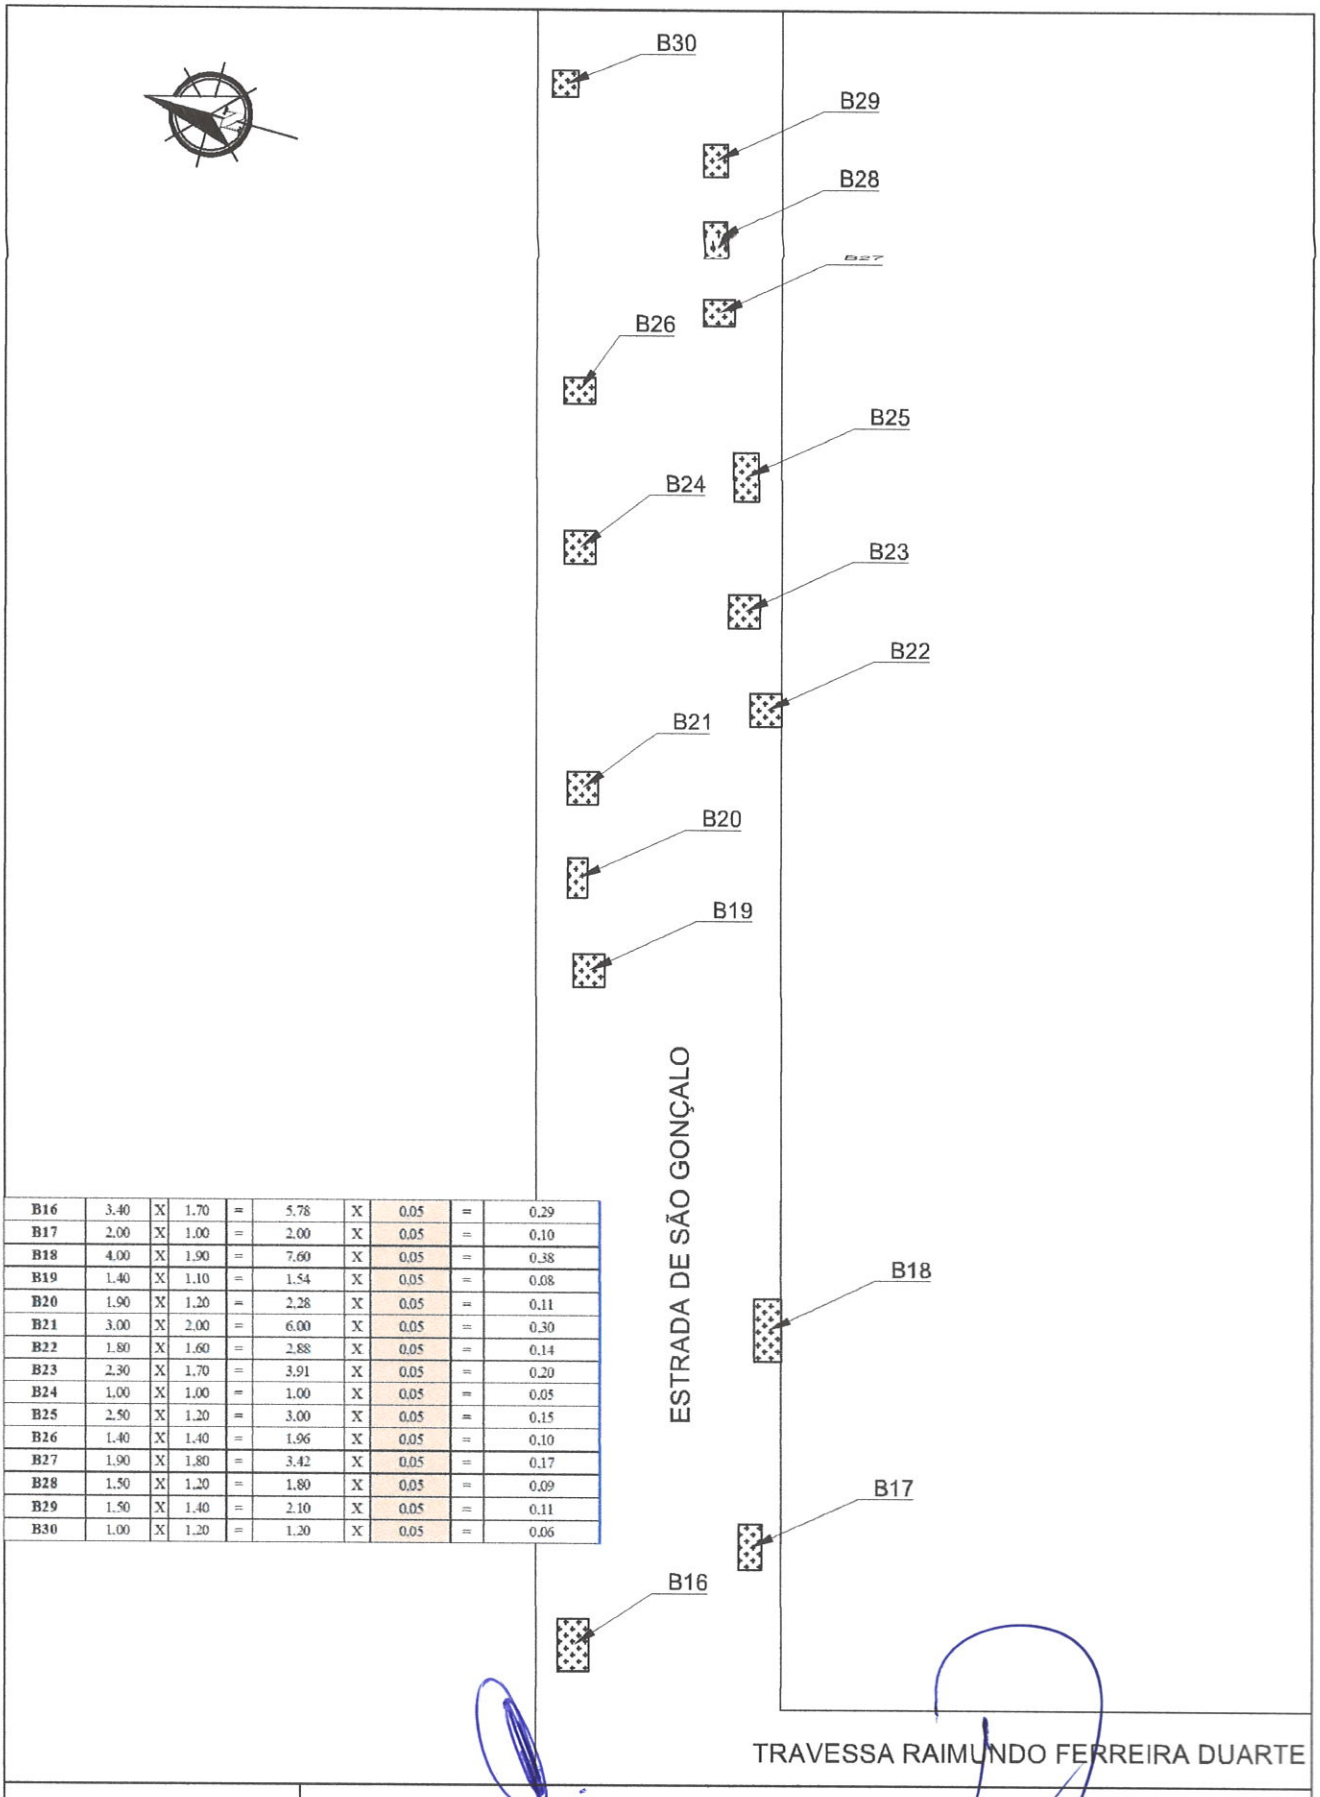

B16	3.40	X	1.70	=	5.78	X	0.05	=	0.29
B17	2.00	X	1.00	=	2.00	X	0.05	=	0.10
B18	4.00	X	1.90	=	7.60	X	0.05	=	0.38
B19	1.40	X	1.10	=	1.54	X	0.05	=	0.08
B20	1.90	X	1.20	=	2.28	X	0.05	=	0.11
B21	3.00	X	2.00	=	6.00	X	0.05	=	0.30
B22	1.80	X	1.60	=	2.88	X	0.05	=	0.14
B23	2.30	X	1.70	=	3.91	X	0.05	=	0.20
B24	1.00	X	1.00	=	1.00	X	0.05	=	0.05
B25	2.50	X	1.20	=	3.00	X	0.05	=	0.15
B26	1.40	X	1.40	=	1.96	X	0.05	=	0.10
B27	1.90	X	1.80	=	3.42	X	0.05	=	0.17
B28	1.50	X	1.20	=	1.80	X	0.05	=	0.09
B29	1.50	X	1.40	=	2.10	X	0.05	=	0.11
B30	1.00	X	1.20	=	1.20	X	0.05	=	0.06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 28	**LOCALIDADE:** ESTRADA DE SÃO GONÇALO	**BAIRRO:** CARITÉ	**PRANCHA:** 2/13
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 471070 **LAT.:** 9205876
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 16/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

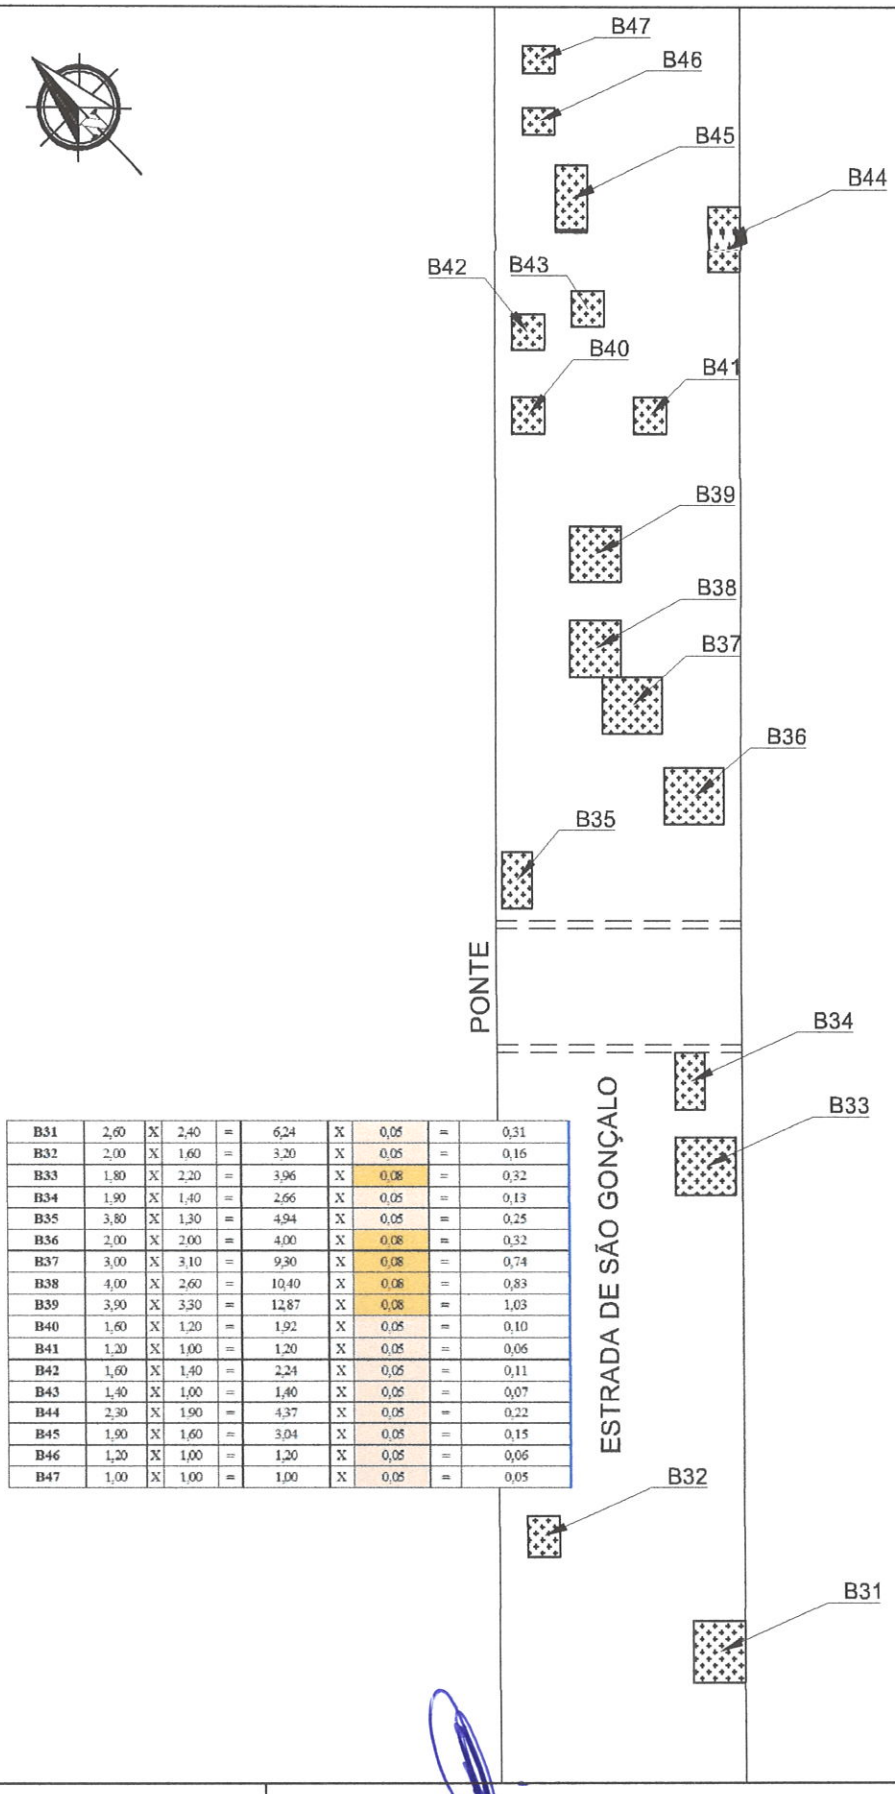

B31	2,60	X	2,40	=	6,24	X	0,05	=	0,31
B32	2,00	X	1,60	=	3,20	X	0,05	=	0,16
B33	1,80	X	2,20	=	3,96	X	0,08	=	0,32
B34	1,90	X	1,40	=	2,66	X	0,05	=	0,13
B35	3,80	X	1,30	=	4,94	X	0,05	=	0,25
B36	2,00	X	2,00	=	4,00	X	0,08	=	0,32
B37	3,00	X	3,10	=	9,30	X	0,08	=	0,74
B38	4,00	X	2,60	=	10,40	X	0,08	=	0,83
B39	3,90	X	3,30	=	12,87	X	0,08	=	1,03
B40	1,60	X	1,20	=	1,92	X	0,05	=	0,10
B41	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06
B42	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,05	=	0,11
B43	1,40	X	1,00	=	1,40	X	0,05	=	0,07
B44	2,30	X	1,90	=	4,37	X	0,05	=	0,22
B45	1,90	X	1,60	=	3,04	X	0,05	=	0,15
B46	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06
B47	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 28	**LOCALIDADE:** ESTRADA DE SÃO GONÇALO	**BAIRRO:** CARITÉ	**PRANCHA:** 3/13
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 471070 **LAT.:** 9205876
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

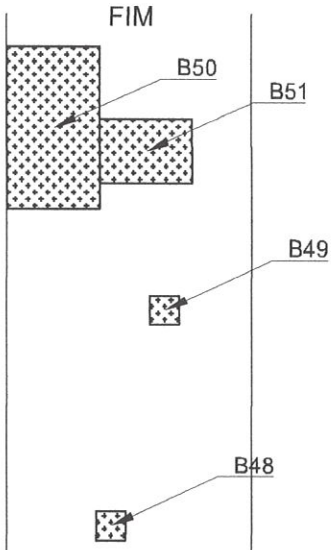

B48	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,08	=	0,11
B49	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,08	=	0,11
B50	3,20	X	3,40	=	10,88	X	0,08	=	0,87
B51	12,40	X	1,30	=	16,12	X	0,08	=	1,29

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 28	**LOCALIDADE:** ESTRADA DE SÃO GONÇALO	**BAIRRO:** CARITÉ	**PRANCHA:** 4/13
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 471070 **LAT.:** 9205876
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

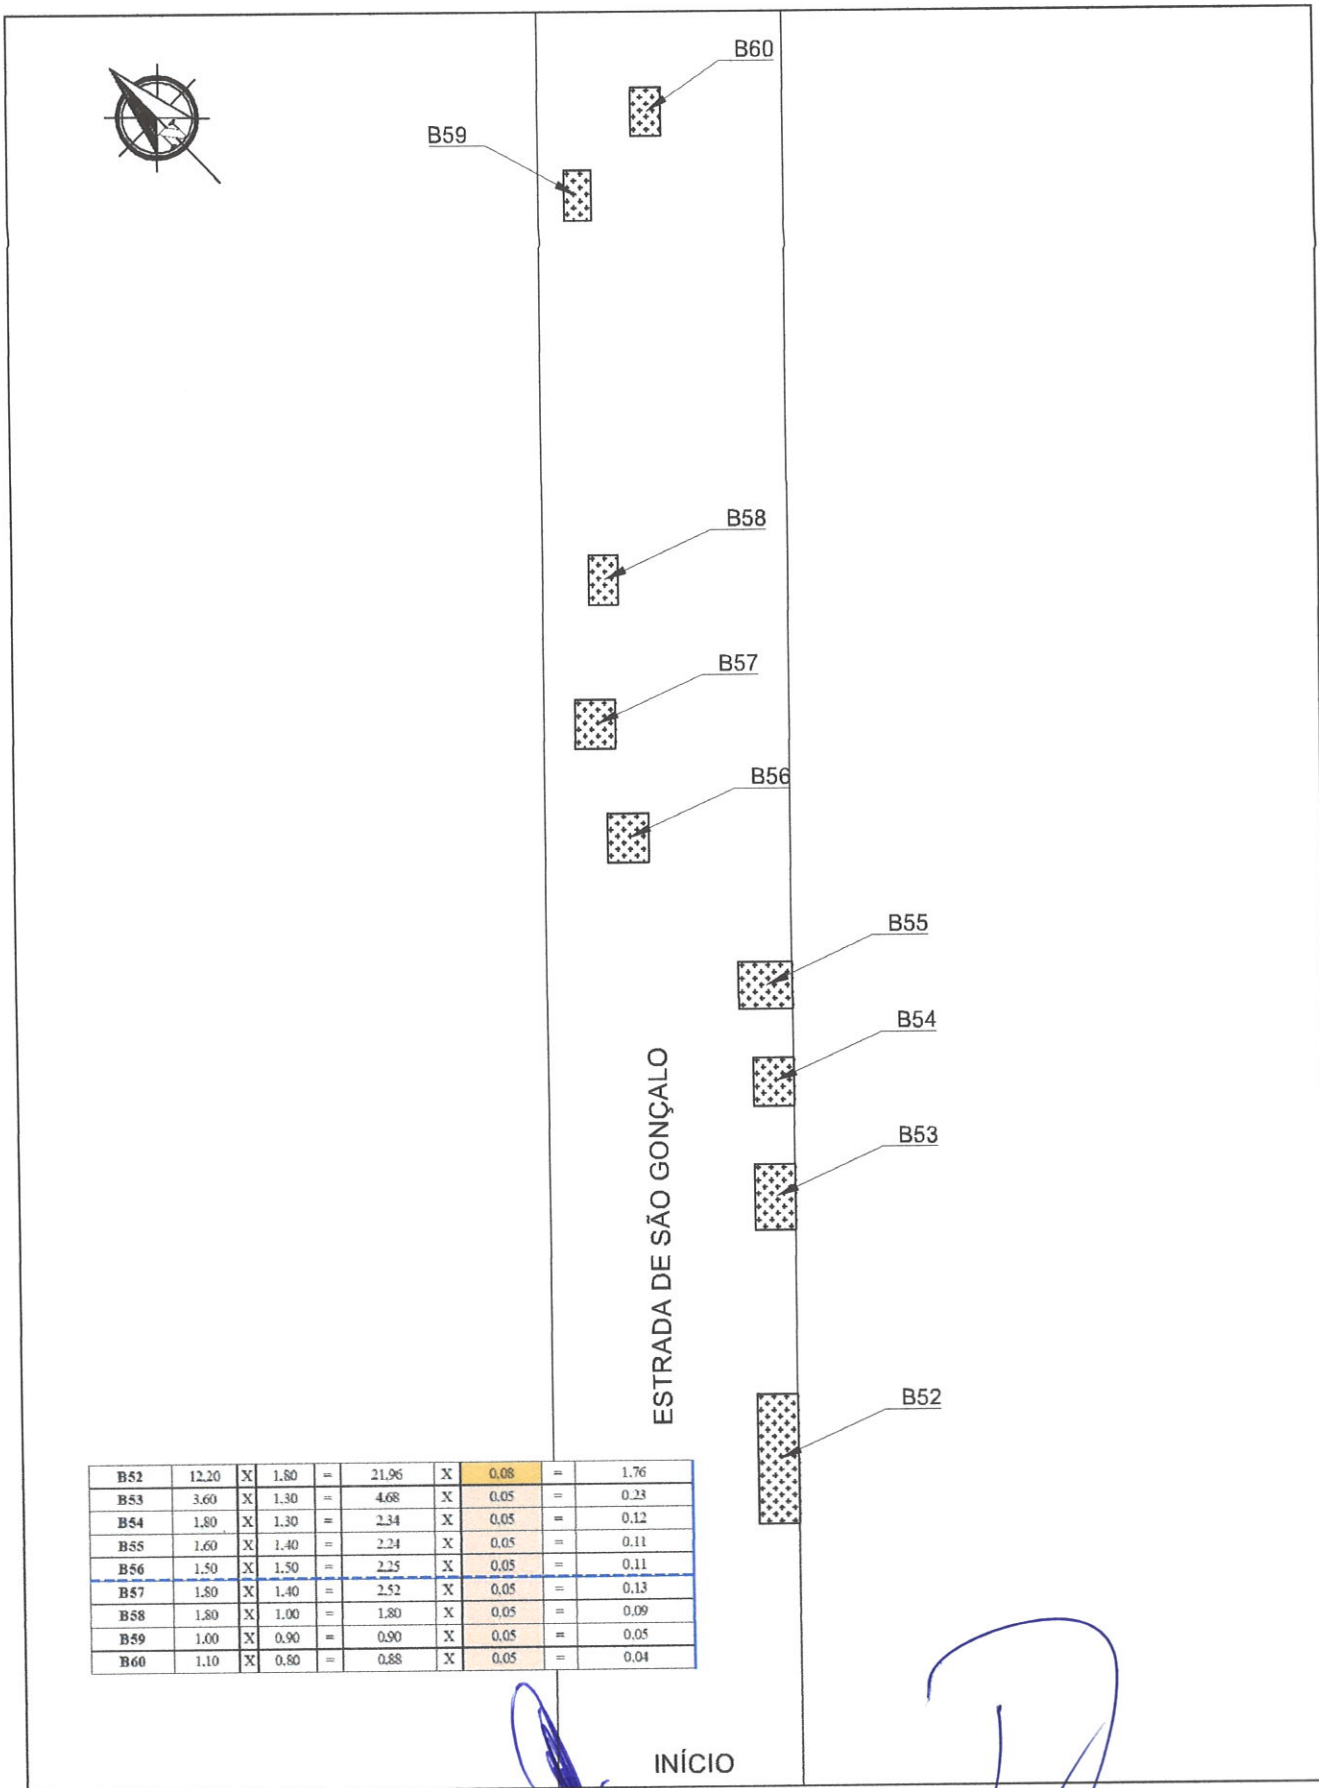

B52	12.20	X	1.80	=	21.96	X	0.08	=	1.76
B53	3.60	X	1.30	=	4.68	X	0.05	=	0.23
B54	1.80	X	1.30	=	2.34	X	0.05	=	0.12
B55	1.60	X	1.40	=	2.24	X	0.05	=	0.11
B56	1.50	X	1.50	=	2.25	X	0.05	=	0.11
B57	1.80	X	1.40	=	2.52	X	0.05	=	0.13
B58	1.80	X	1.00	=	1.80	X	0.05	=	0.09
B59	1.00	X	0.90	=	0.90	X	0.05	=	0.05
B60	1.10	X	0.80	=	0.88	X	0.05	=	0.04

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 28	**LOCALIDADE:** ESTRADA DE SÃO GONÇALO	**BAIRRO:** CARITÉ	**PRANCHA:** 5/13
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 471070 **LAT.:** 9205876
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

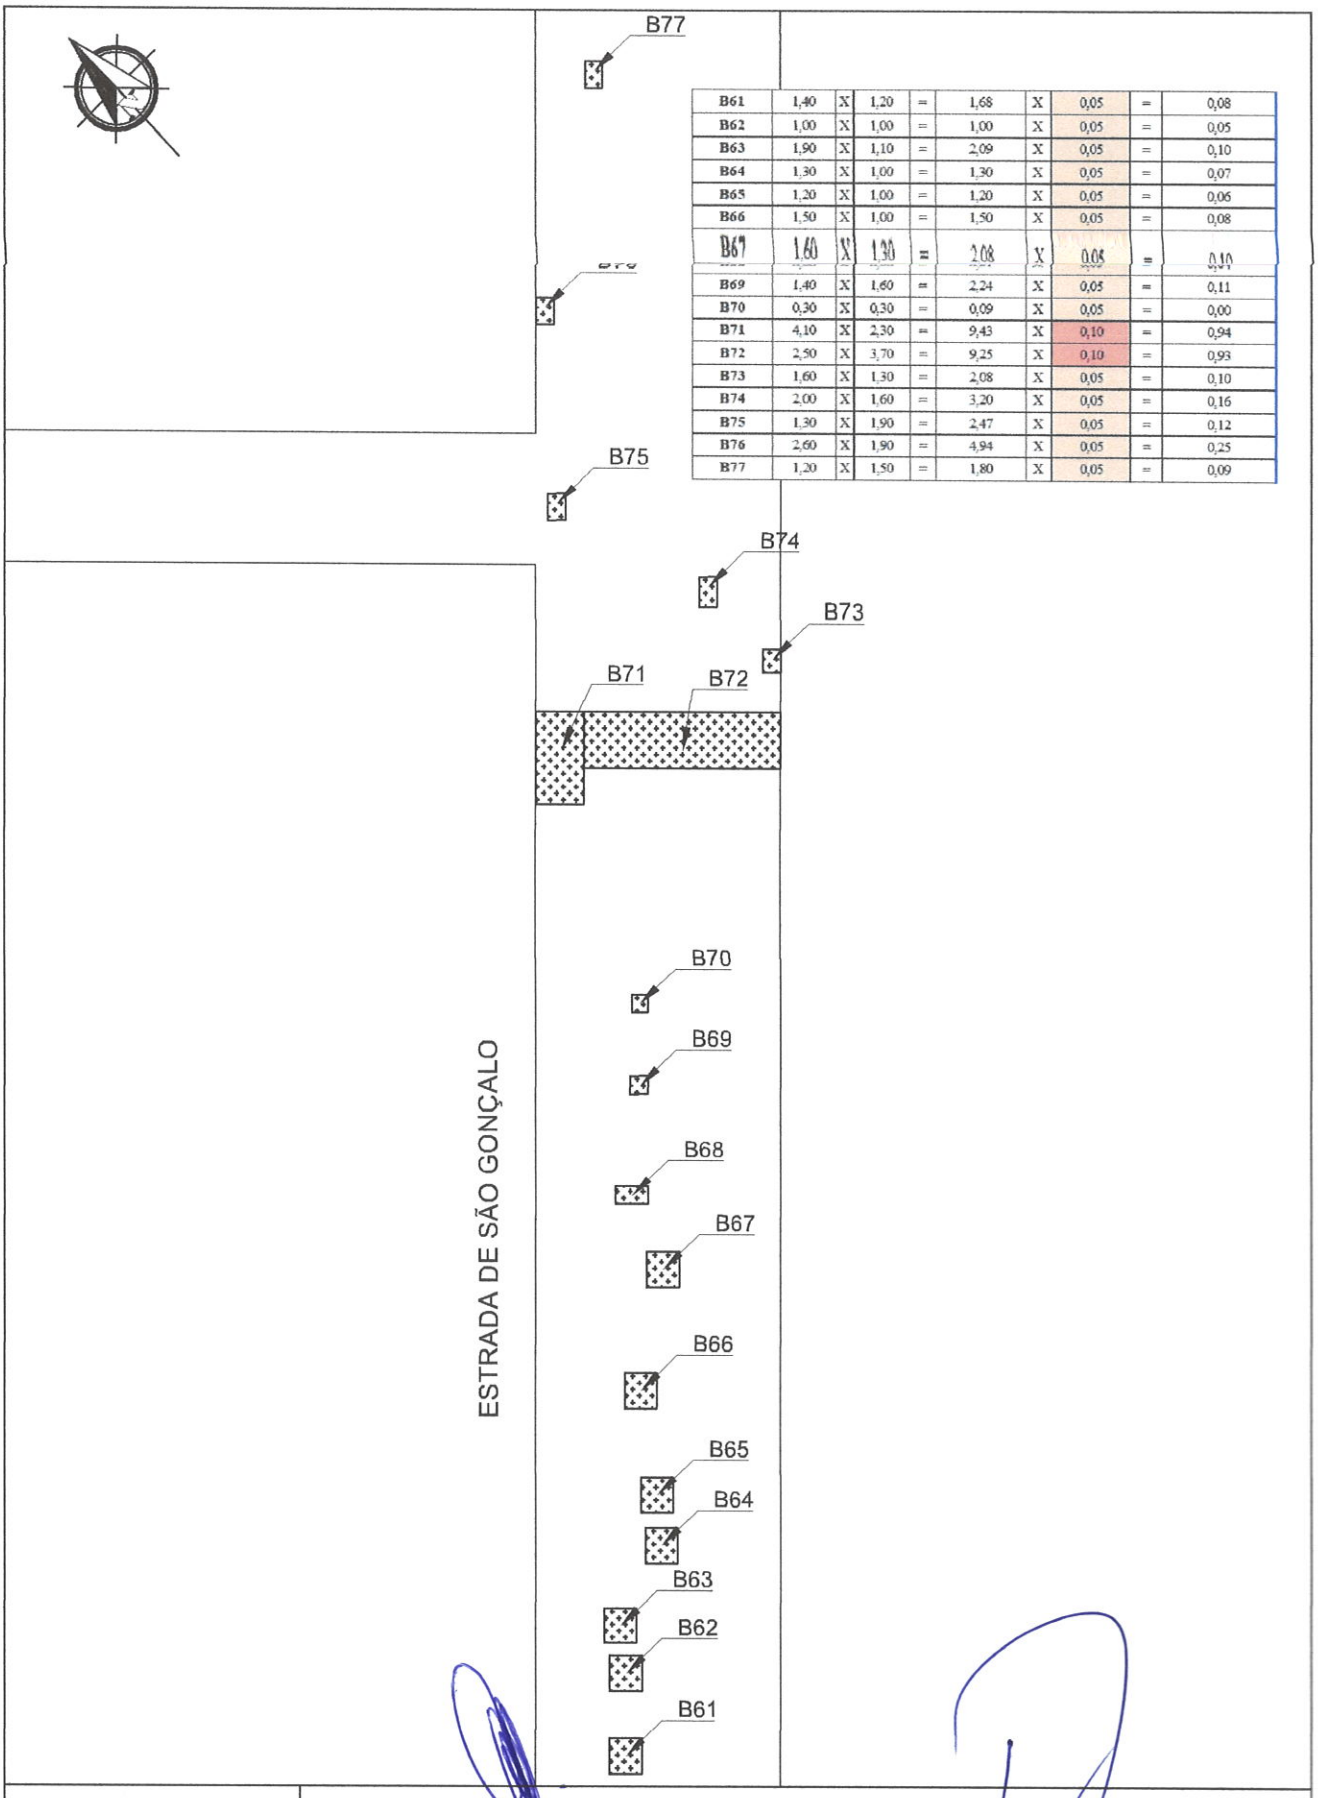

B61	1,40	X	1,20	=	1,68	X	0,05	=	0,08
B62	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05
B63	1,90	X	1,10	=	2,09	X	0,05	=	0,10
B64	1,30	X	1,00	=	1,30	X	0,05	=	0,07
B65	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06
B66	1,50	X	1,00	=	1,50	X	0,05	=	0,08
B67	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
B69	1,40	X	1,60	=	2,24	X	0,05	=	0,11
B70	0,30	X	0,30	=	0,09	X	0,05	=	0,00
B71	4,10	X	2,30	=	9,43	X	0,10	=	0,94
B72	2,50	X	3,70	=	9,25	X	0,10	=	0,93
B73	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
B74	2,00	X	1,60	=	3,20	X	0,05	=	0,16
B75	1,30	X	1,90	=	2,47	X	0,05	=	0,12
B76	2,60	X	1,90	=	4,94	X	0,05	=	0,25
B77	1,20	X	1,50	=	1,80	X	0,05	=	0,09

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 28	**LOCALIDADE:** ESTRADA DE SÃO GONÇALO	**BAIRRO:** CARITÉ	**PRANCHA:** 6/13
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 471070 **LAT.:** 9205876
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

B78	2,30	X	1,00	=	2,30	X	0,05	=	0,12
B79	2,40	X	3,40	=	8,16	X	0,10	=	0,82
B80	2,90	X	2,70	=	7,83	X	0,10	=	0,78
B81	2,70	X	2,60	=	7,02	X	0,05	=	0,35
B82	4,30	X	1,80	=	7,74	X	0,08	=	0,62
B83	2,20	X	1,10	=	2,42	X	0,05	=	0,12

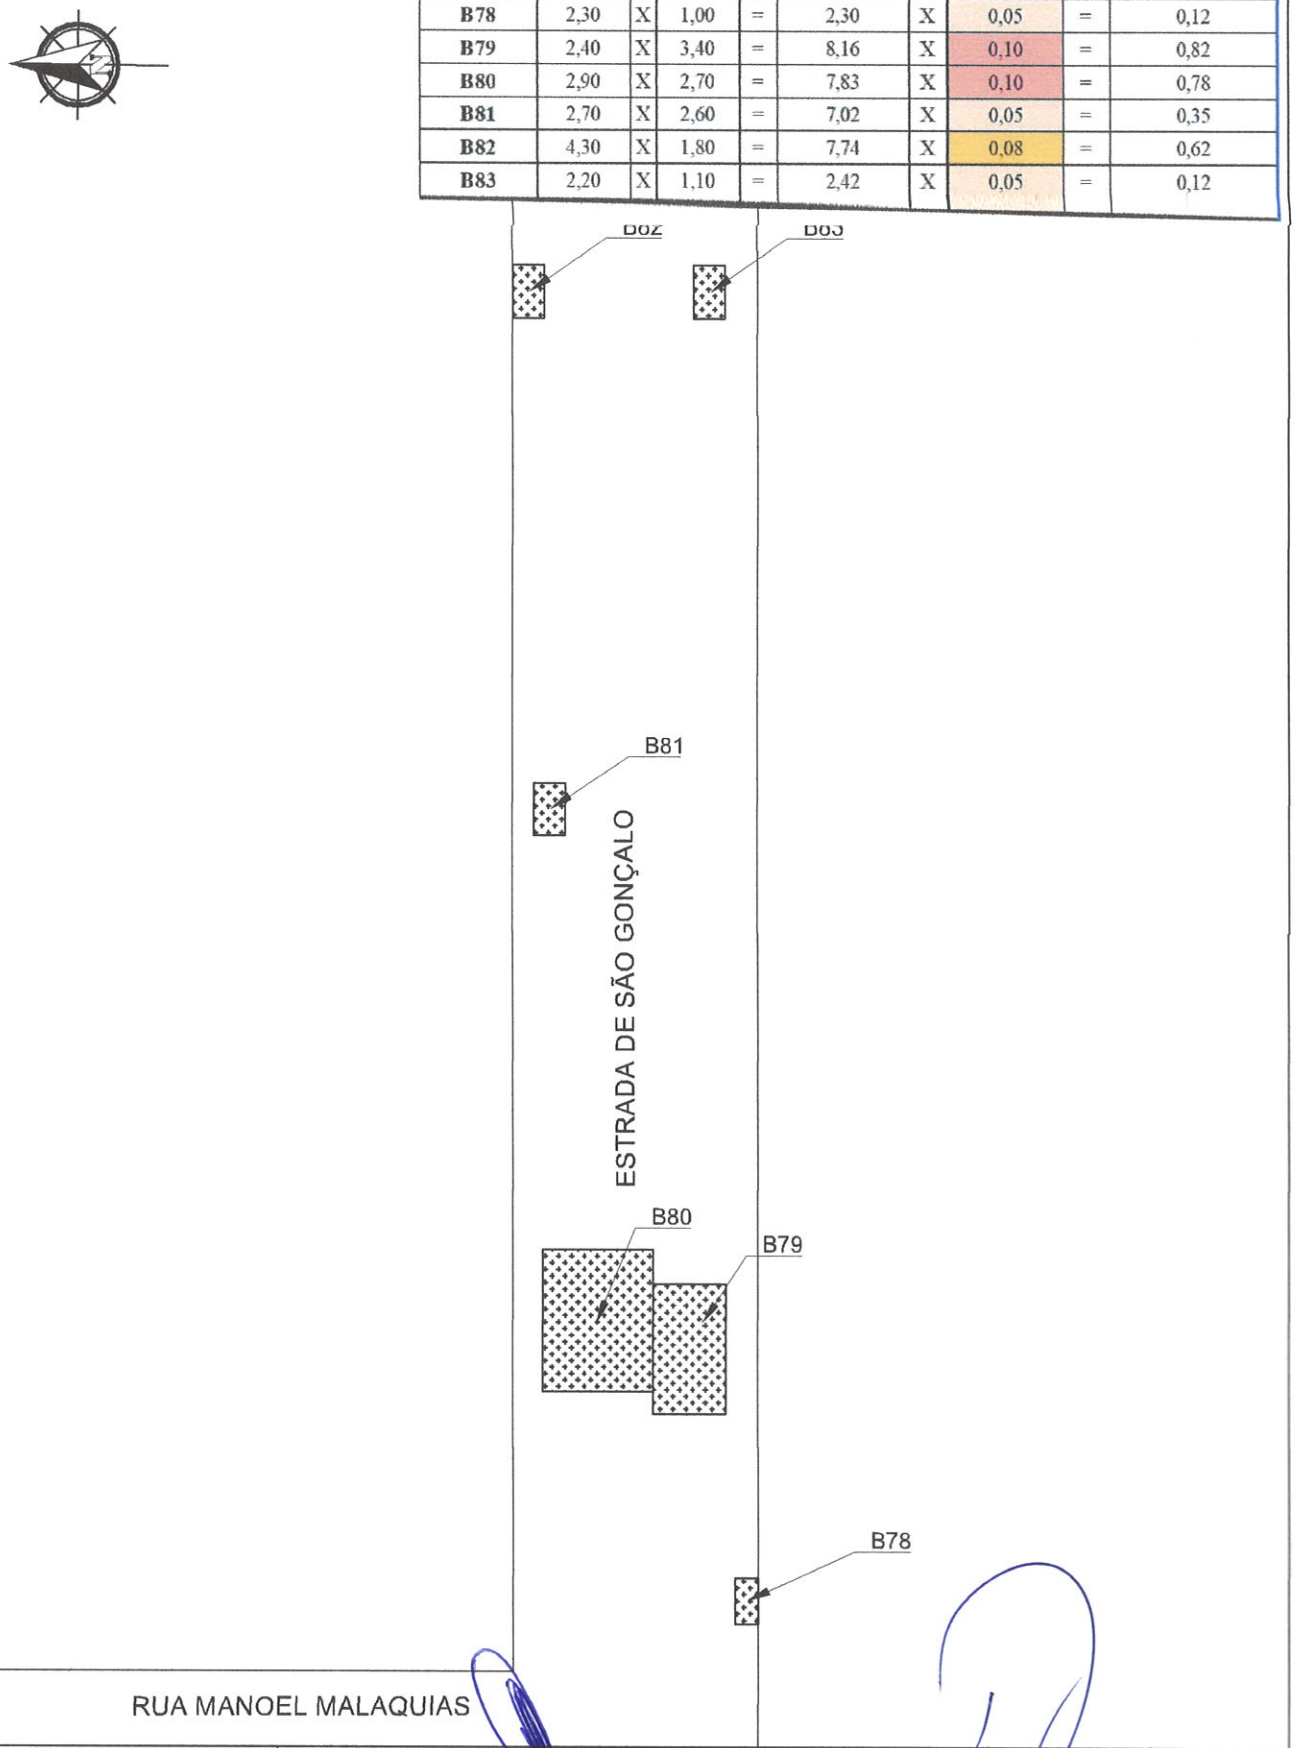

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 28	**LOCALIDADE:** ESTRADA DE SÃO GONÇALO	**BAIRRO:** CARITÉ	**PRANCHA:** 7/13
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 471070 **LAT.:** 9205876
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

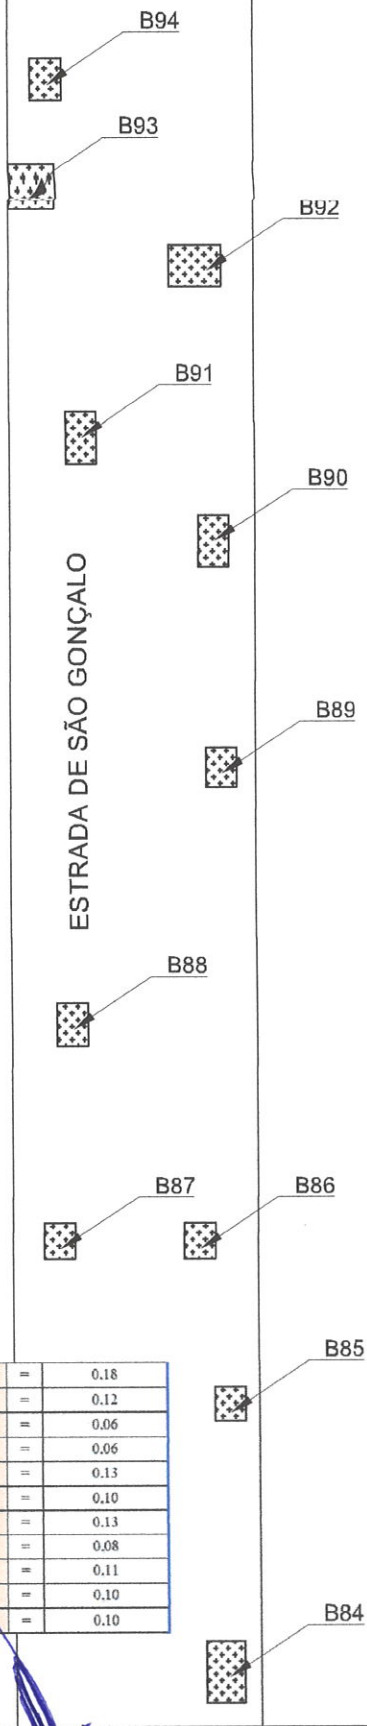

B84	2.60	X	1.40	=	3.64	X	0.05	=	0.18
B85	1.60	X	1.50	=	2.40	X	0.05	=	0.12
B86	1.00	X	1.10	=	1.10	X	0.05	=	0.06
B87	1.00	X	1.20	=	1.20	X	0.05	=	0.06
B88	1.80	X	1.40	=	2.52	X	0.05	=	0.13
B89	1.50	X	1.30	=	1.95	X	0.05	=	0.10
B90	1.70	X	1.50	=	2.55	X	0.05	=	0.13
B91	1.40	X	1.20	=	1.68	X	0.05	=	0.08
B92	1.50	X	1.50	=	2.25	X	0.05	=	0.11
B93	1.60	X	1.30	=	2.08	X	0.05	=	0.10
B94	1.50	X	1.30	=	1.95	X	0.05	=	0.10

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 14979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 28	**LOCALIDADE:** ESTRADA DE SÃO GONÇALO	**BAIRRO:** CARITÉ	**PRANCHA:** 8/13
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 471070 **LAT.:** 9205876
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

B114
B113
B111
B112
B110
B109
B108
B107
B106
B105
B104
B103

SÍTIO JUNCO

ESTRADA DE SÃO GONÇALO

B102
B101
B100
B99
B98
B97
B96
B95

B95	1,70	X	1,40	=	2,38	X	0,05	=	0,12
B96	1,50	X	1,20	=	1,80	X	0,05	=	0,09
B97	1,30	X	1,00	=	1,30	X	0,05	=	0,07
B98	1,70	X	1,50	=	2,55	X	0,05	=	0,13
B99	1,40	X	1,20	=	1,68	X	0,05	=	0,08
B100	1,30	X	1,40	=	1,82	X	0,05	=	0,09
B101	1,60	X	1,60	=	2,56	X	0,05	=	0,13
B102	1,40	X	1,60	=	2,24	X	0,05	=	0,11
B103	1,60	X	1,20	=	1,92	X	0,05	=	0,10
B104	1,70	X	1,40	=	2,38	X	0,05	=	0,12
B105	2,50	X	1,80	=	4,50	X	0,05	=	0,23
B106	2,30	X	1,60	=	3,68	X	0,05	=	0,18
B107	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,05	=	0,06
B108	2,10	X	1,50	=	3,15	X	0,05	=	0,16
B109	2,10	X	1,30	=	2,73	X	0,05	=	0,14
B110	2,80	X	1,30	=	3,64	X	0,05	=	0,18
B111	1,30	X	1,20	=	1,56	X	0,05	=	0,08
B112	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,05	=	0,07
B113	1,40	X	1,60	=	2,24	X	0,05	=	0,11
B114	1,00	X	1,10	=	1,10	X	0,05	=	0,06

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 28	**LOCALIDADE:** ESTRADA DE SÃO GONÇALO	**BAIRRO:** CARITÉ	**PRANCHA:** 9/13
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 471070 **LAT.:** 9205876
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

B115	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06
B116	2,50	X	0,80	=	2,00	X	0,05	=	0,10
B117	2,80	X	0,90	=	2,52	X	0,05	=	0,13
B118	0,90	X	0,90	=	0,81	X	0,05	=	0,04
B119	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,05	=	0,06
B120	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,05	=	0,07
B121	3,40	X	1,20	=	4,08	X	0,05	=	0,20
B122	1,50	X	1,10	=	1,65	X	0,05	=	0,08
B123	1,30	X	1,00	=	1,30	X	0,05	=	0,07
B124	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06
B125	1,40	X	1,00	=	1,40	X	0,05	=	0,07
B126	2,10	X	1,60	=	3,36	X	0,05	=	0,17
B127	1,40	X	1,60	=	2,24	X	0,05	=	0,11

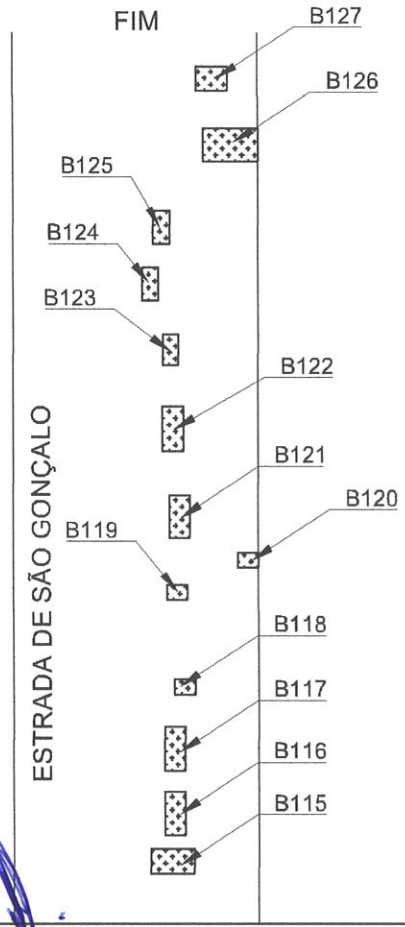

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44879/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 28	**LOCALIDADE:** ESTRADA DE SÃO GONÇALO	**BAIRRO:** CARITÉ	**PRANCHA:** 10/13
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 471070 **LAT.:** 9205876
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

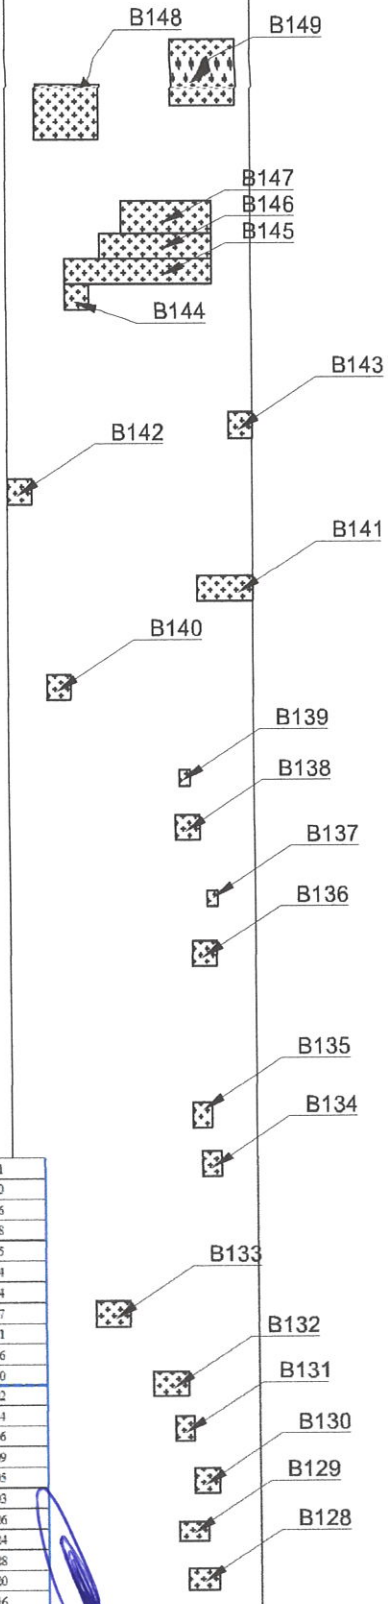

B128	1,70	X	1,30	=	2,21	X	0,05	=	0,11
B129	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
B130	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06
B131	1,50	X	1,10	=	1,65	X	0,05	=	0,08
B132	1,70	X	1,80	=	3,06	X	0,05	=	0,15
B133	1,60	X	1,70	=	2,72	X	0,05	=	0,14
B134	1,90	X	1,50	=	2,85	X	0,05	=	0,14
B135	1,20	X	1,20	=	1,44	X	0,05	=	0,07
B136	1,50	X	1,50	=	2,25	X	0,05	=	0,11
B137	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,05	=	0,06
B138	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
B139	0,70	X	0,70	=	0,49	X	0,05	=	0,02
B140	1,70	X	1,70	=	2,89	X	0,05	=	0,14
B141	1,90	X	1,70	=	3,23	X	0,05	=	0,16
B142	1,70	X	1,10	=	1,87	X	0,05	=	0,09
B143	1,30	X	0,80	=	1,04	X	0,05	=	0,05
B144	0,50	X	1,30	=	0,65	X	0,05	=	0,03
B145	1,40	X	3,70	=	5,18	X	0,05	=	0,26
B146	1,40	X	3,40	=	4,76	X	0,05	=	0,24
B147	1,90	X	2,90	=	5,51	X	0,05	=	0,28
B148	2,20	X	1,80	=	3,96	X	0,05	=	0,20
B149	1,90	X	1,70	=	3,23	X	0,05	=	0,16

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 28	**LOCALIDADE:** ESTRADA DE SÃO GONÇALO	**BAIRRO:** CARITÉ	**PRANCHA:** 11/13
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** LONG.: 471070 LAT.: 9205876
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

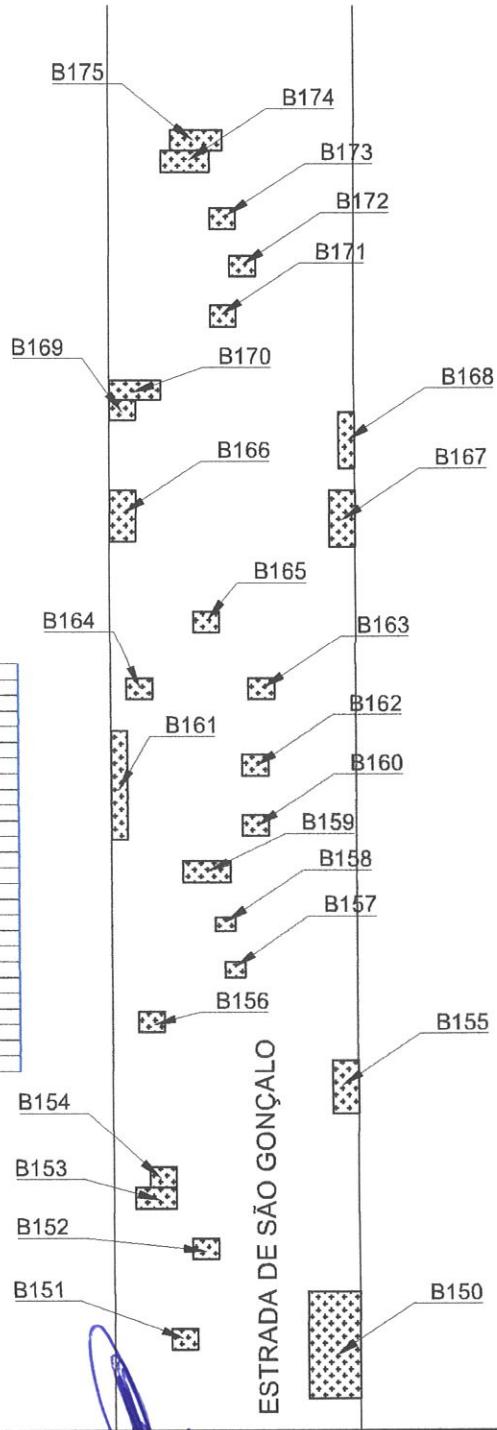

B150	6,30	X	2,30	=	14,49	X	0,08	=	1,16
B151	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06
B152	1,35	X	1,20	=	1,56	X	0,05	=	0,08
B153	1,40	X	2,60	=	3,64	X	0,05	=	0,18
B154	1,20	X	1,30	=	1,56	X	0,05	=	0,08
B155	3,60	X	1,80	=	6,48	X	0,08	=	0,52
B156	1,30	X	1,50	=	1,95	X	0,05	=	0,10
B157	1,30	X	1,30	=	1,69	X	0,05	=	0,08
B158	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05
B159	1,50	X	1,70	=	2,55	X	0,05	=	0,13
B160	1,50	X	1,20	=	1,80	X	0,05	=	0,09
B161	5,80	X	1,10	=	6,38	X	0,08	=	0,51
B162	1,30	X	0,90	=	1,17	X	0,05	=	0,06
B163	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,05	=	0,07
B164	1,30	X	1,00	=	1,30	X	0,05	=	0,07
B165	3,80	X	1,20	=	4,56	X	0,05	=	0,23
B166	4,00	X	1,40	=	5,60	X	0,08	=	0,45
B167	4,50	X	1,10	=	4,95	X	0,08	=	0,40
B168	4,50	X	1,00	=	4,50	X	0,05	=	0,23
B169	1,00	X	2,30	=	2,30	X	0,08	=	0,18
B170	2,10	X	3,70	=	7,77	X	0,08	=	0,62
B171	1,30	X	1,10	=	1,43	X	0,05	=	0,07
B172	0,80	X	1,00	=	0,80	X	0,05	=	0,04
B173	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09
B174	1,90	X	2,40	=	4,56	X	0,08	=	0,36
B175	2,10	X	1,60	=	3,36	X	0,08	=	0,27

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 28	**LOCALIDADE:** ESTRADA DE SÃO GONÇALO	**BAIRRO:** CARITÉ	**PRANCHA:** 12/13
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 471070 **LAT.:** 9205876
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

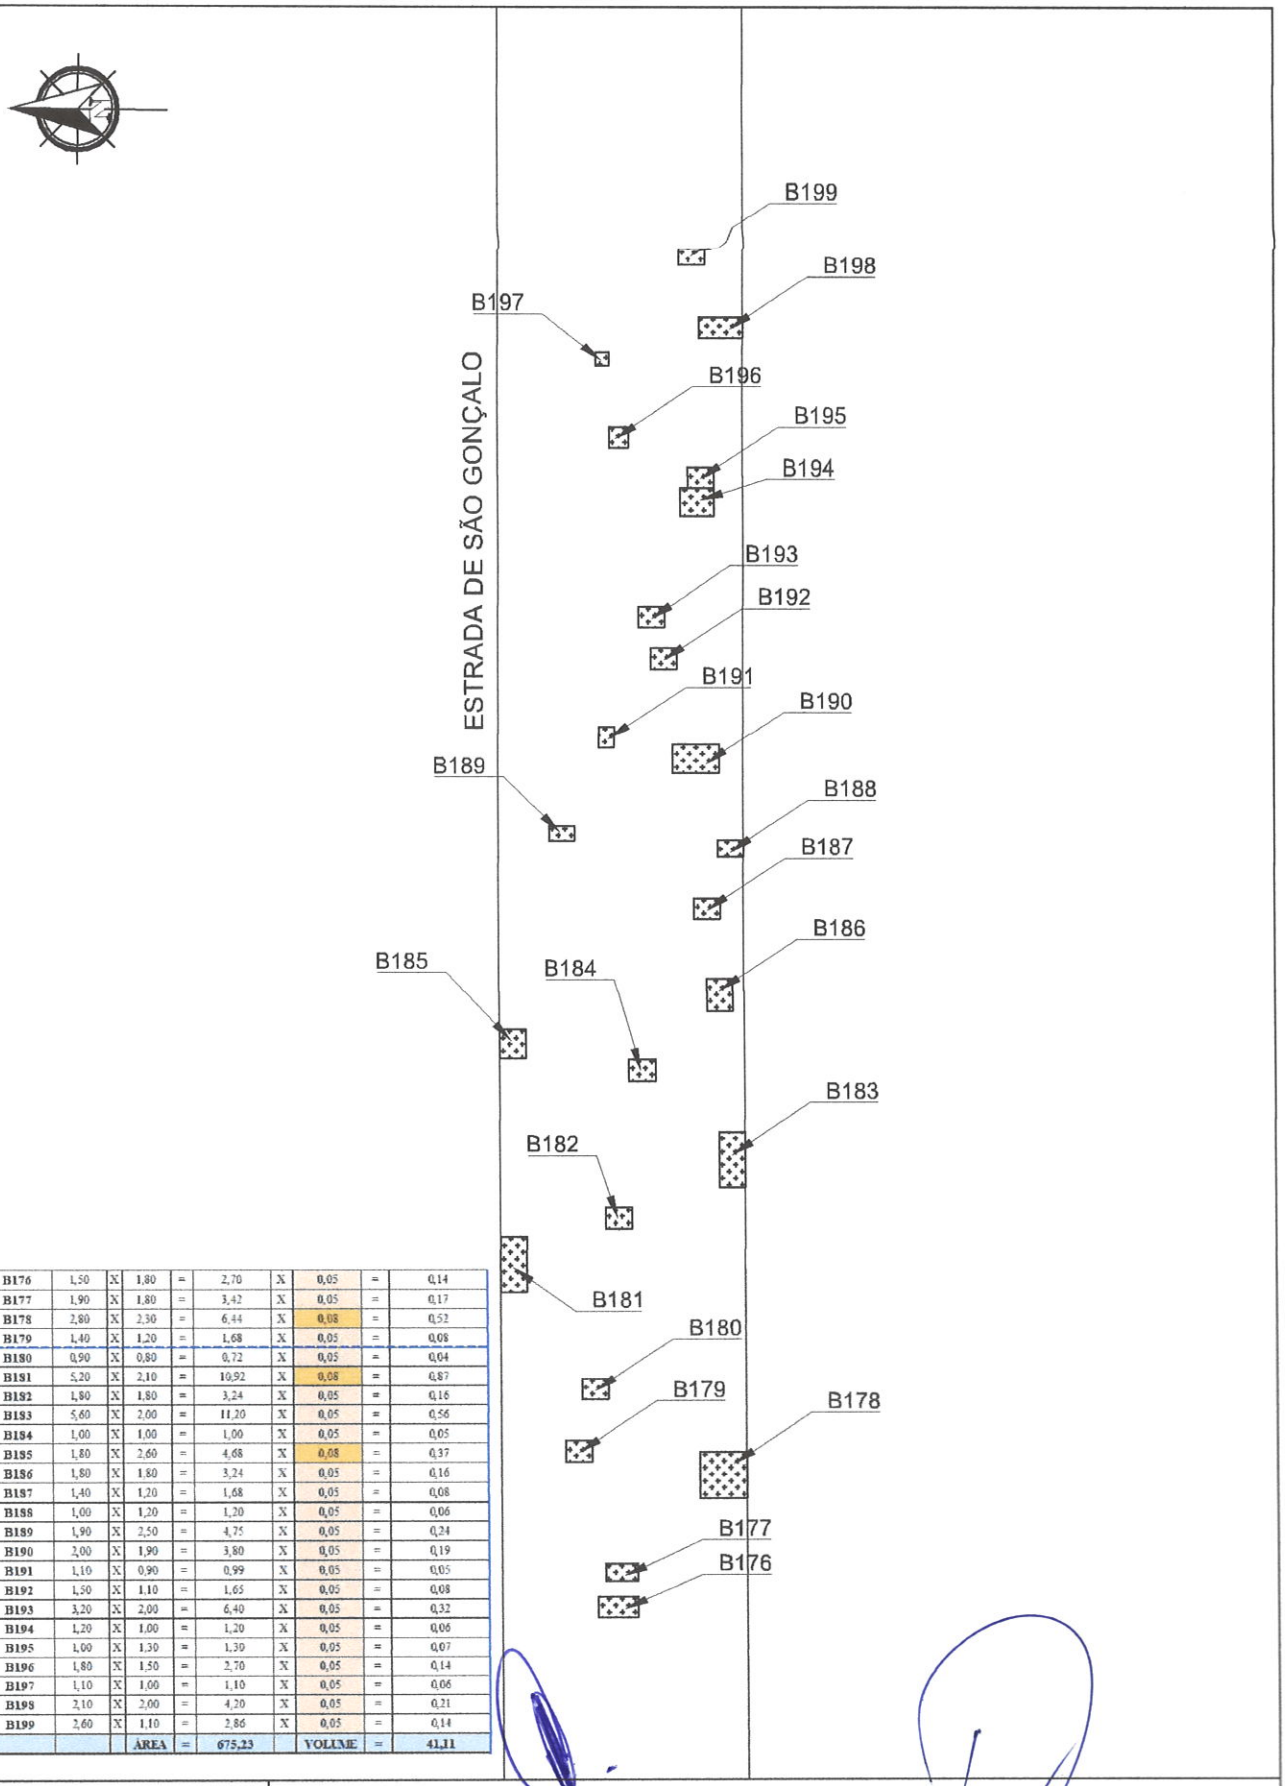

B176	1,50	X	1,80	=	2,70	X	0,05	=	0,14
B177	1,90	X	1,80	=	3,42	X	0,05	=	0,17
B178	2,80	X	2,30	=	6,44	X	0,08	=	0,52
B179	1,40	X	1,20	=	1,68	X	0,05	=	0,08
B180	0,90	X	0,80	=	0,72	X	0,05	=	0,04
B181	5,20	X	2,10	=	10,92	X	0,08	=	0,87
B182	1,80	X	1,80	=	3,24	X	0,05	=	0,16
B183	5,60	X	2,00	=	11,20	X	0,05	=	0,56
B184	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05
B185	1,80	X	2,60	=	4,68	X	0,08	=	0,37
B186	1,80	X	1,80	=	3,24	X	0,05	=	0,16
B187	1,40	X	1,20	=	1,68	X	0,05	=	0,08
B188	1,00	X	1,20	=	1,20	X	0,05	=	0,06
B189	1,90	X	2,50	=	4,75	X	0,05	=	0,24
B190	2,00	X	1,90	=	3,80	X	0,05	=	0,19
B191	1,10	X	0,90	=	0,99	X	0,05	=	0,05
B192	1,50	X	1,10	=	1,65	X	0,05	=	0,08
B193	3,20	X	2,00	=	6,40	X	0,05	=	0,32
B194	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,05	=	0,06
B195	1,00	X	1,30	=	1,30	X	0,05	=	0,07
B196	1,80	X	1,50	=	2,70	X	0,05	=	0,14
B197	1,10	X	1,00	=	1,10	X	0,05	=	0,06
B198	2,10	X	2,00	=	4,20	X	0,05	=	0,21
B199	2,60	X	1,10	=	2,86	X	0,05	=	0,14
			ÁREA	=	675,23		VOLUME	=	41,11

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodoviário Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 14979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 28	**LOCALIDADE:** ESTRADA DE SÃO GONÇALO	**BAIRRO:** CARITÉ	**PRANCHA:** 13/13
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 471070 **LAT.:** 9205876
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
28	ESTRADA DO SÃO GONÇALO	CARITE/ ZONA RURAL

TRECHO

ENTRE A RUA JOSE NILSON DE OLIVEIRA E ATÉ O FIM SENTIDO SÃO GONÇALO

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	20/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	28	ESTRADA DO SÃO GONÇALO				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	675,23	R$ 1,84	R$ 1.242,42
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	41,11	R$ 1.696,15	R$ 69.725,33
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	675,23	R$ 0,33	R$ 222,83
2.4	INS	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,27	R$ 3.062,93	R$ 827,27
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) -	T	6,21	R$ 472,85	R$ 2.938,47
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO -	T	105,29	R$ 30,12	R$ 3.171,42
					TOTAL	R$ 78.127,74

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

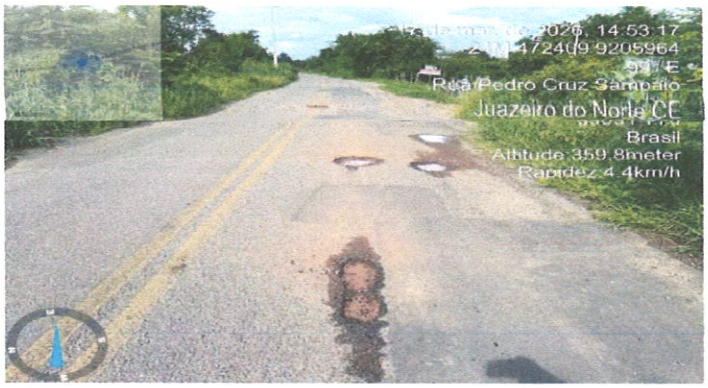

FOTO 01 - ANTES

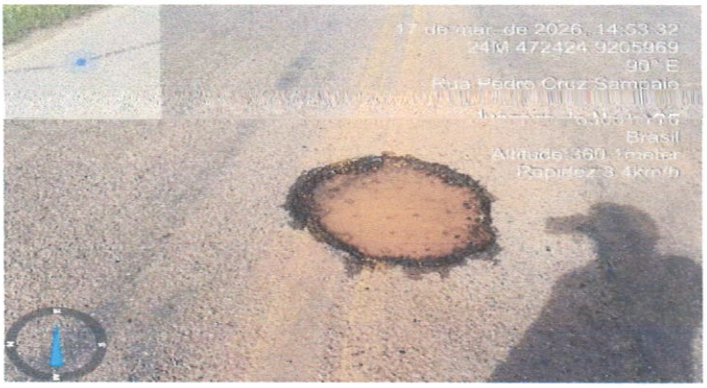

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

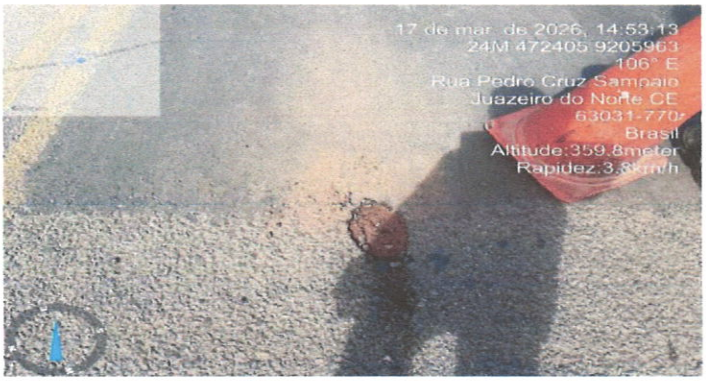

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

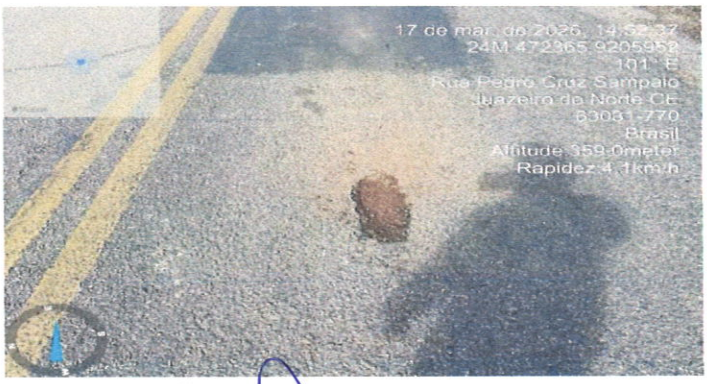

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - ANTES

FOTO 10 - ANTES

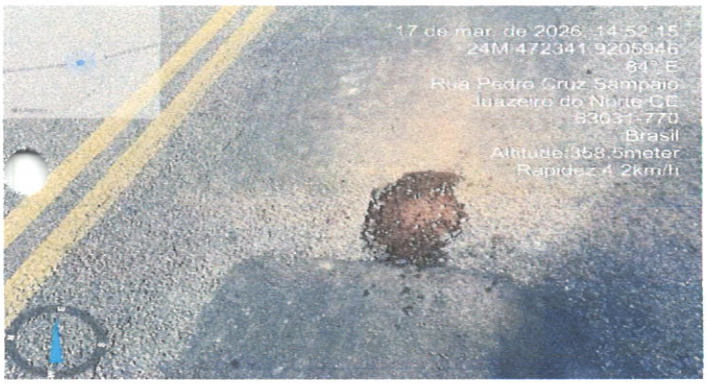

FOTO 11 - ANTES

FOTO 12 - ANTES

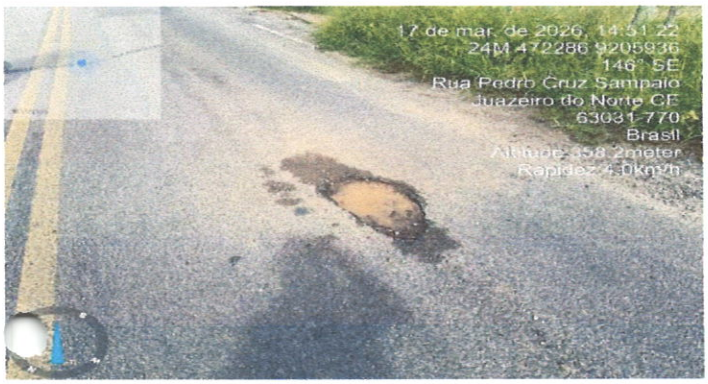

FOTO 13 - ANTES

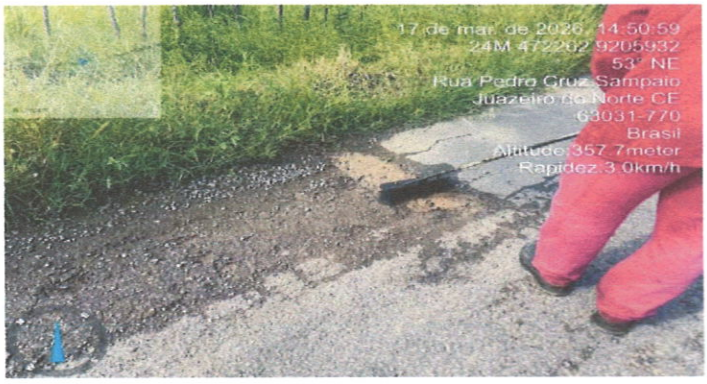

FOTO 14 - ANTES

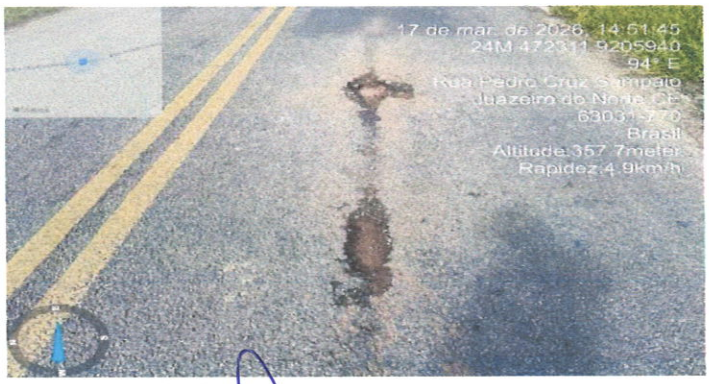

FOTO 15 - ANTES

FOTO 16 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

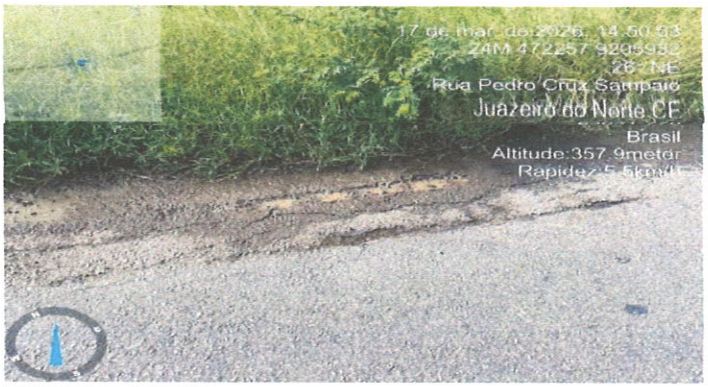

FOTO 17 - ANTES

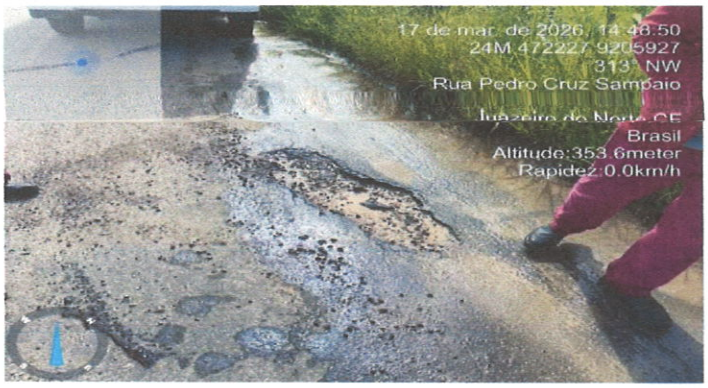

FOTO 18 - ANTES

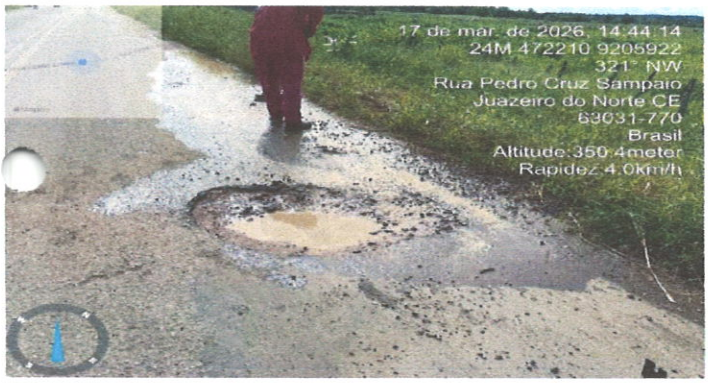

FOTO 19 - ANTES

FOTO 20 - ANTES

FOTO 21 - ANTES

FOTO 22 - ANTES

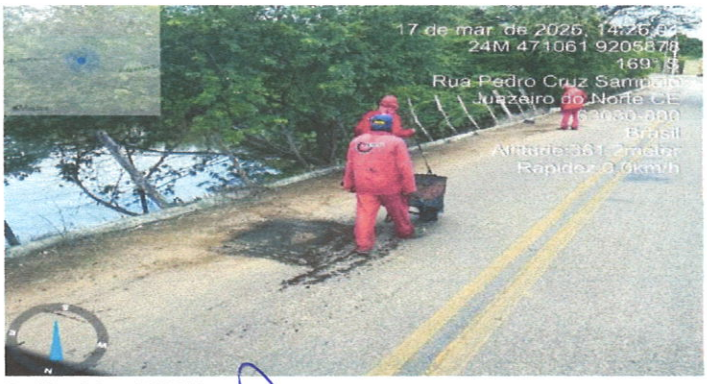

FOTO 23 - ANTES

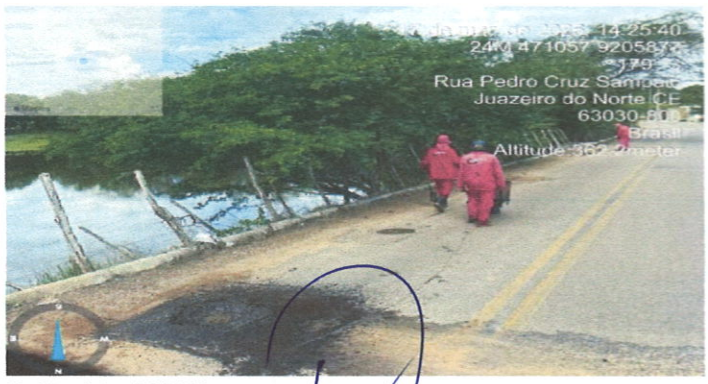

FOTO 24 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

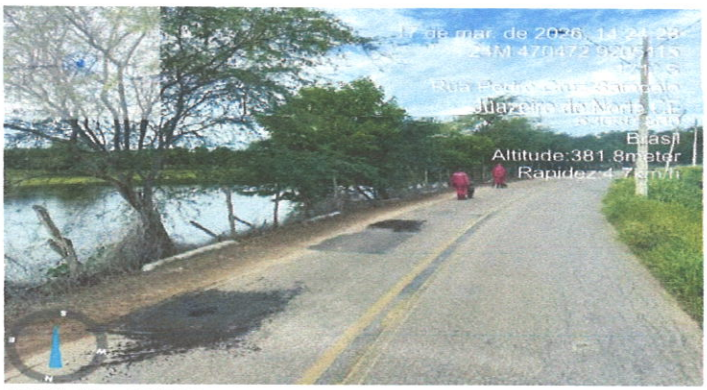

FOTO 25 - ANTES

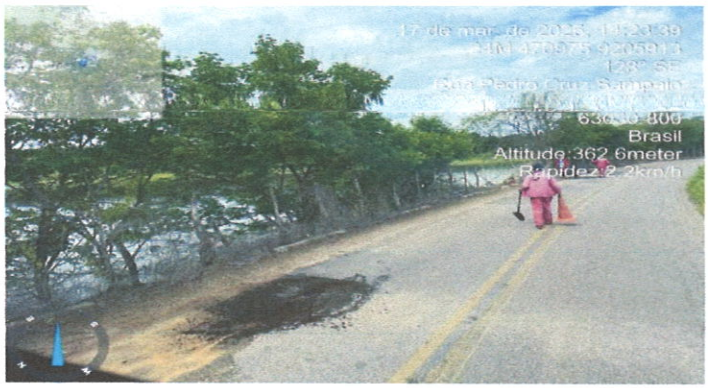

FOTO 26 - ANTES

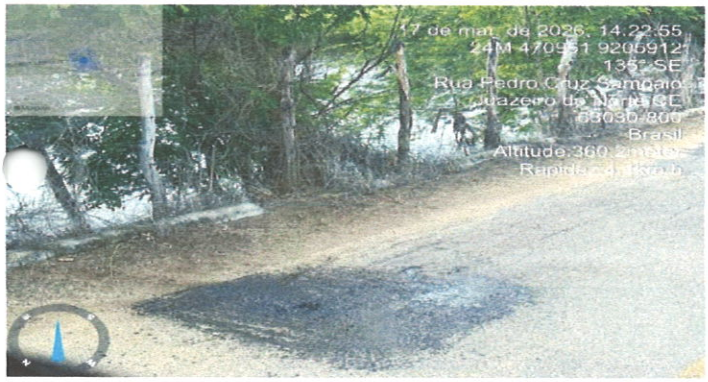

FOTO 27 - ANTES

FOTO 28 - ANTES

FOTO 29 - ANTES

FOTO 30 - ANTES

FOTO 31 - ANTES

FOTO 32 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

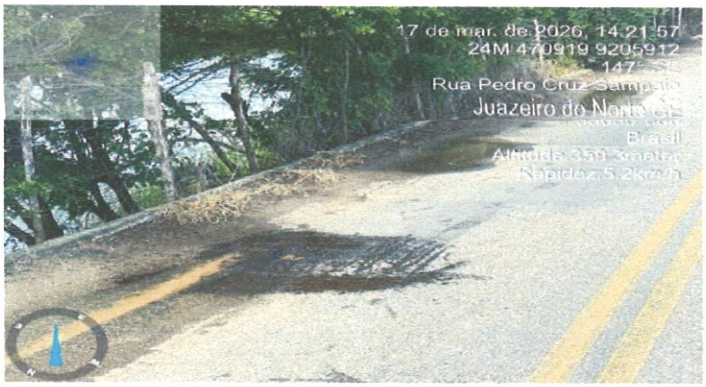

FOTO 33 - ANTES

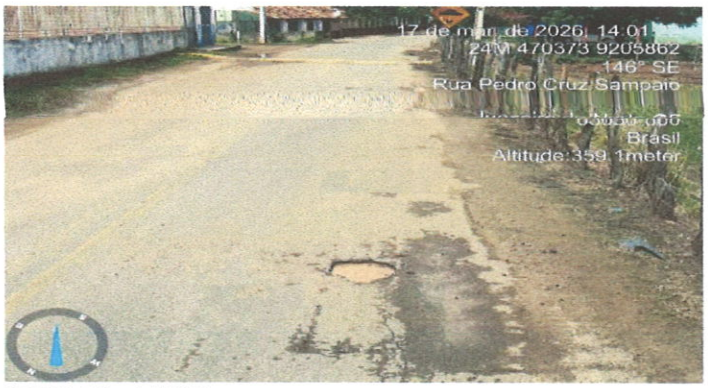

FOTO 34 - ANTES

FOTO 35 - ANTES

FOTO 36 - ANTES

FOTO 37 - ANTES

FOTO 38 - ANTES

FOTO 39 - ANTES

FOTO 40 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 41 - ANTES

FOTO 42 - ANTES

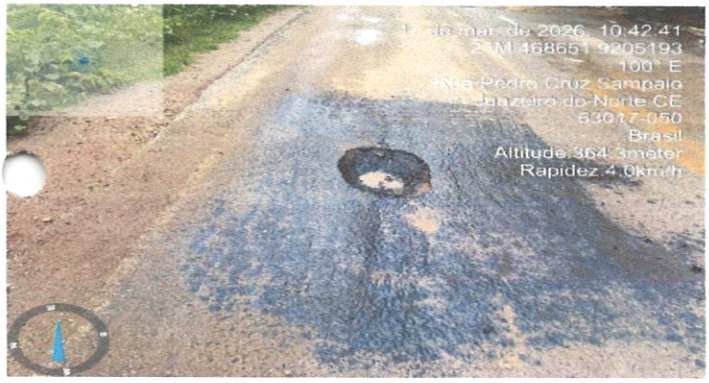

FOTO 43 - ANTES

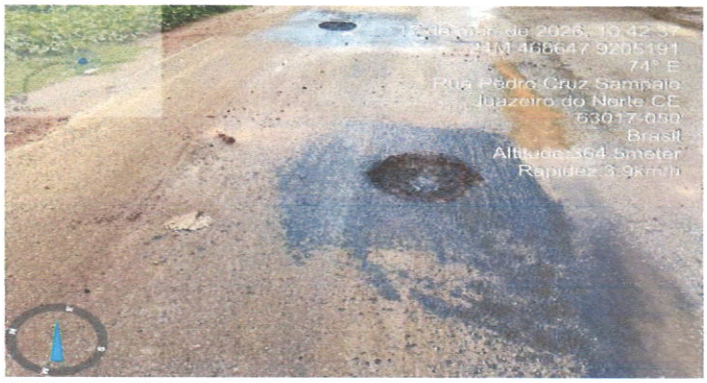

FOTO 44 - ANTES

FOTO 45 - ANTES

FOTO 46 - ANTES

FOTO 47 - ANTES

FOTO 48 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 49 - ANTES

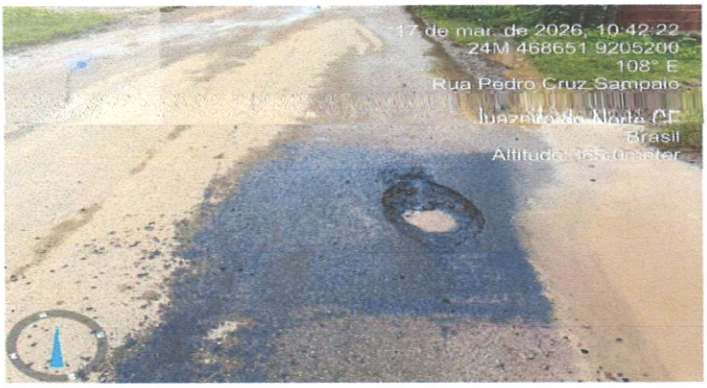

FOTO 50 - ANTES

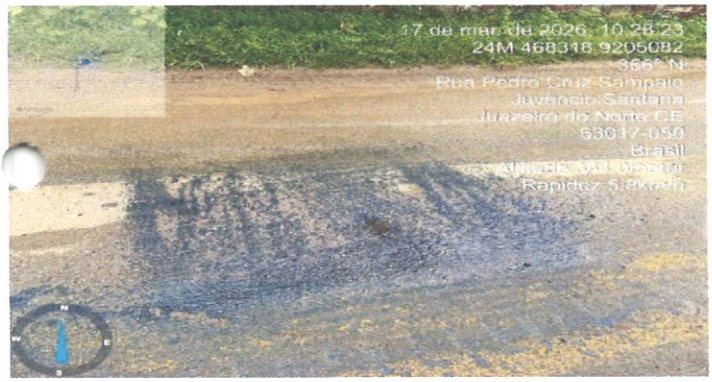

FOTO 51 - ANTES

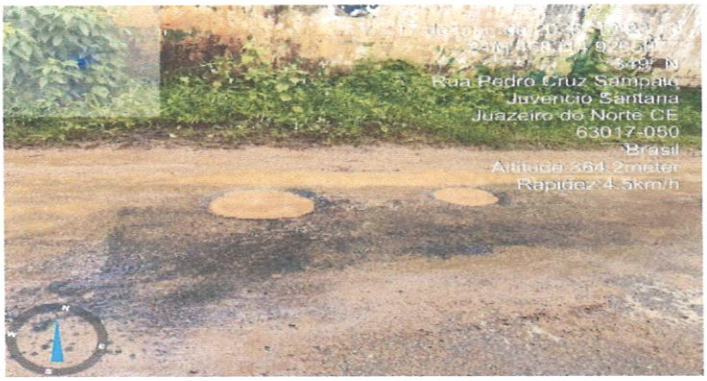

FOTO 52 - ANTES

FOTO 53 - ANTES

FOTO 54 - ANTES

FOTO 55 - ANTES

FOTO 56 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 57 - ANTES

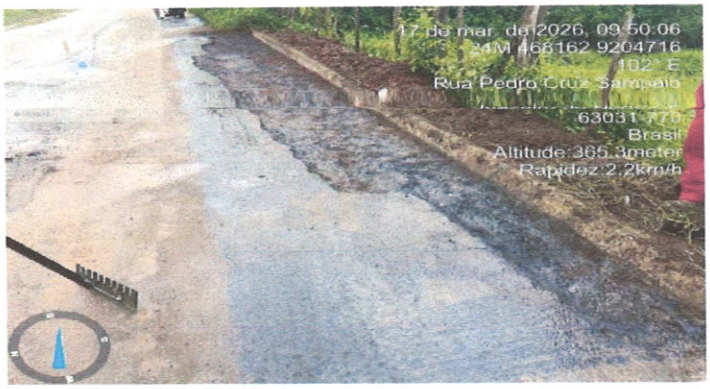

FOTO 58 - ANTES

FOTO 59 - ANTES

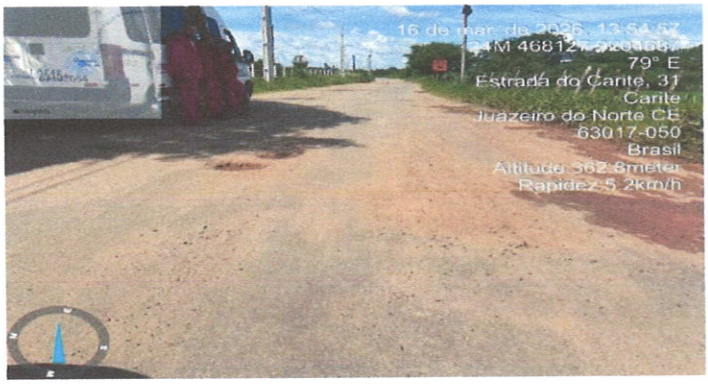

FOTO 60 - ANTES

FOTO 61 - ANTES

FOTO 62 - ANTES

FOTO 63 - ANTES

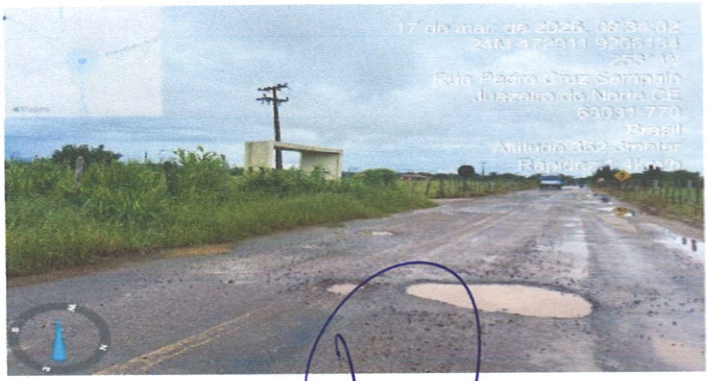

FOTO 64 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 65 - ANTES

FOTO 66 - ANTES

FOTO 67 - ANTES

FOTO 68 - ANTES

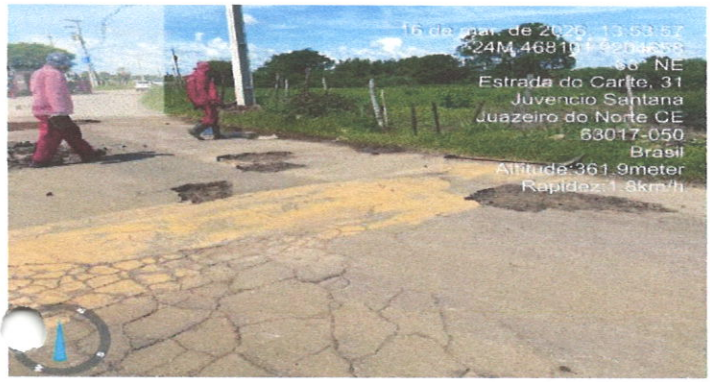

FOTO 69 - ANTES

FOTO 70 - ANTES

FOTO 71 - ANTES

FOTO 72 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 73 - ANTES

FOTO 74 - ANTES

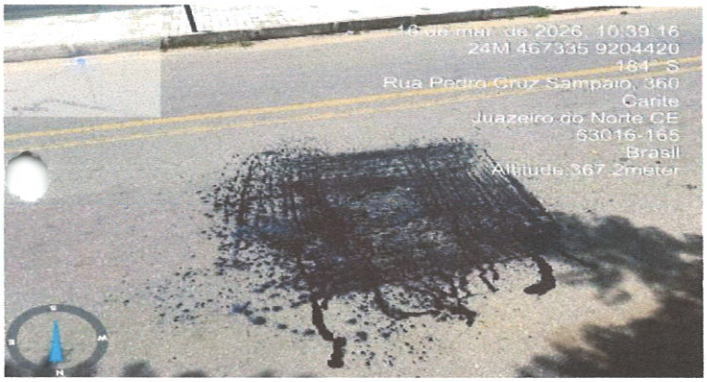

FOTO 75 - ANTES

FOTO 76 - ANTES

FOTO 77 - ANTES

FOTO 78 - ANTES

FOTO 79 - ANTES

FOTO 80 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 81 - ANTES

FOTO 82 - ANTES

FOTO 83 - ANTES

FOTO 84 - ANTES

FOTO 85 - ANTES

FOTO 86 - ANTES

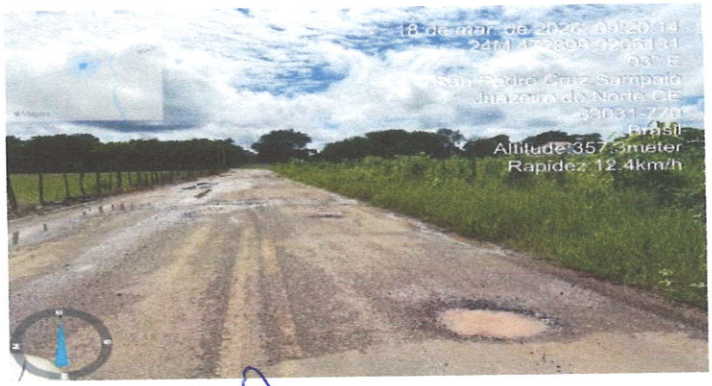

FOTO 87 - ANTES

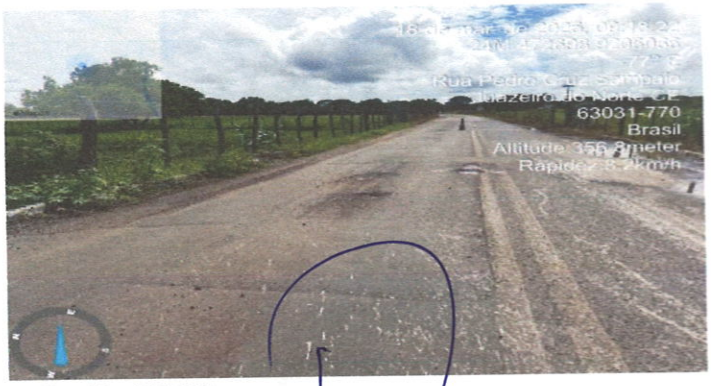

FOTO 88 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

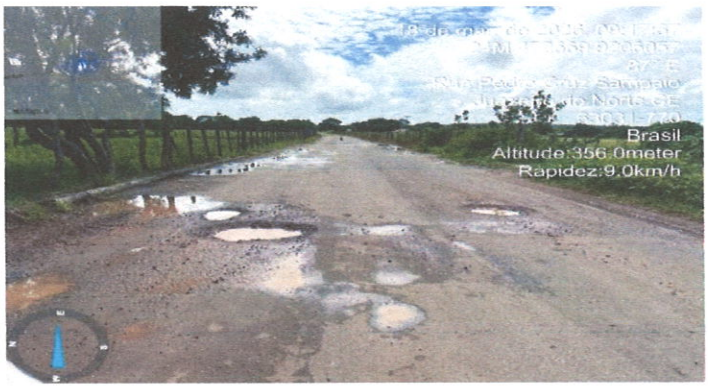

FOTO 89 - ANTES

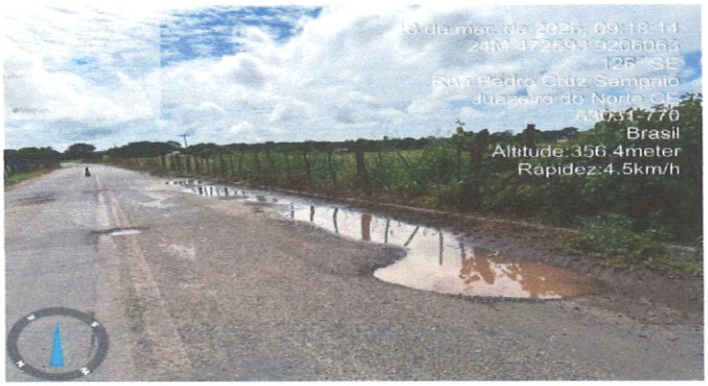

FOTO 90 - ANTES

FOTO 91 - ANTES

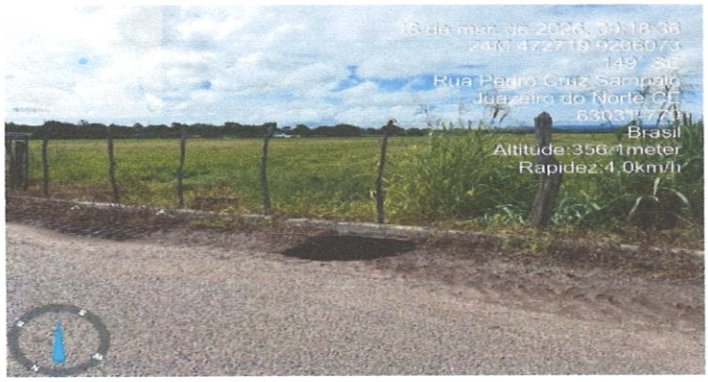

FOTO 92 - ANTES

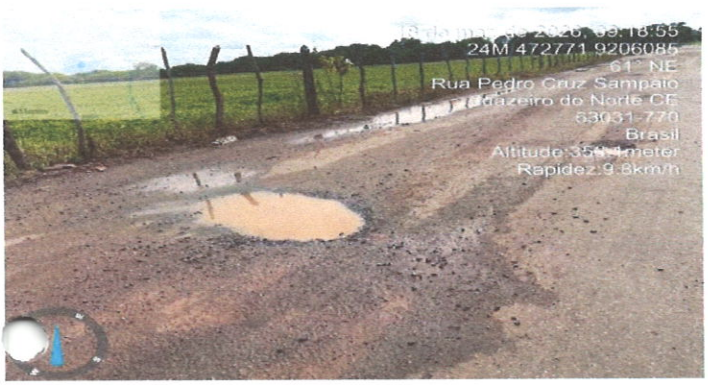

FOTO 93 - ANTES

FOTO 94 - ANTES

FOTO 95 - ANTES

FOTO 96 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 97 - ANTES

FOTO 98 - ANTES

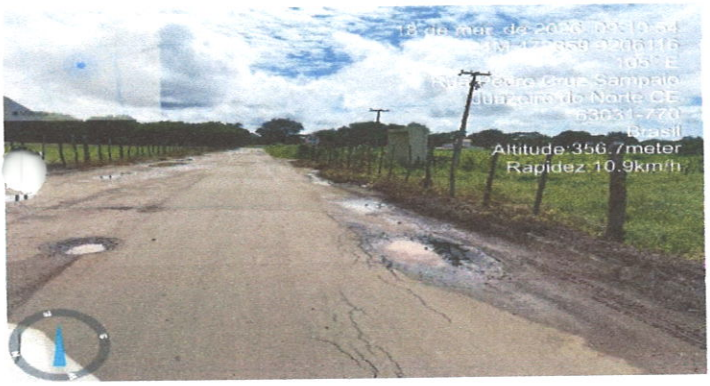

FOTO 99 - ANTES

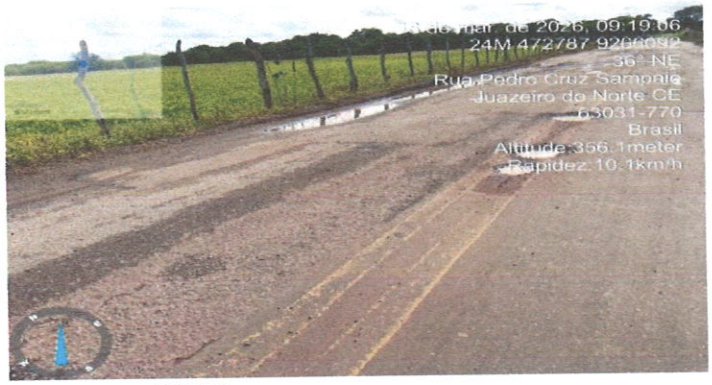

FOTO 100 - ANTES

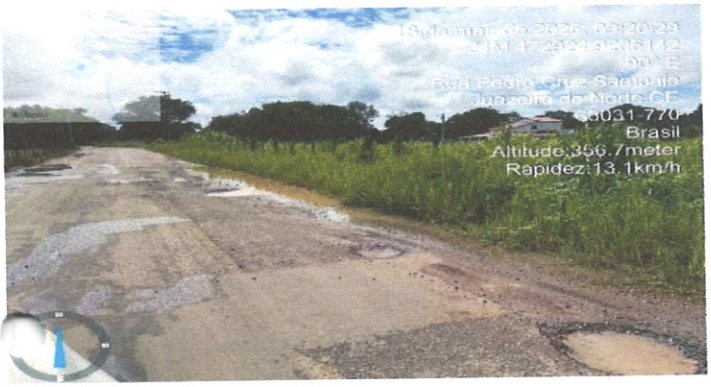

FOTO 101 - ANTES

FOTO 102 - ANTES

FOTO 103 - ANTES

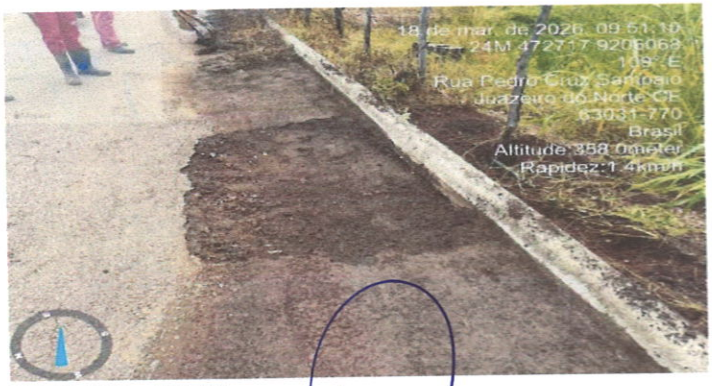

FOTO 104 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44879/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 105 - ANTES

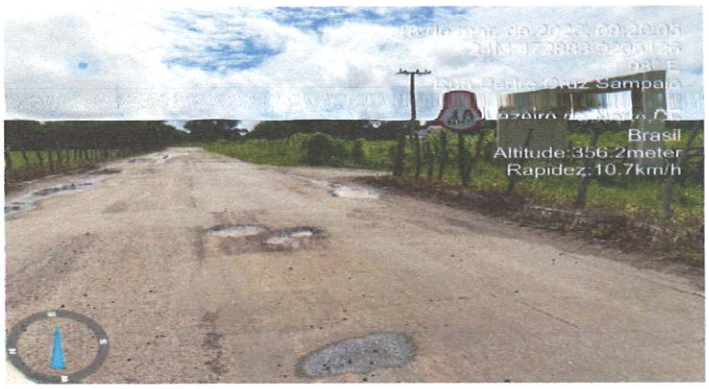

FOTO 106 - ANTES

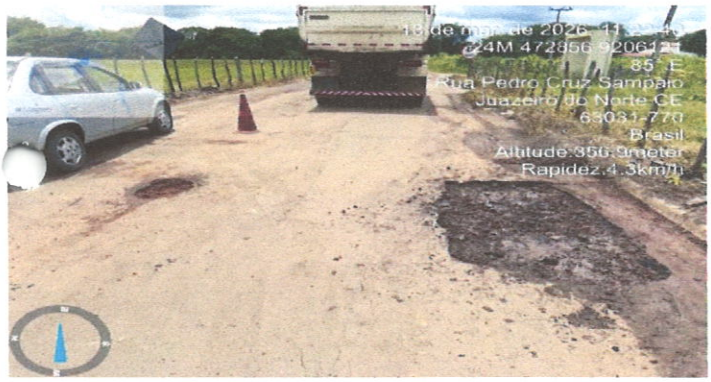

FOTO 107 - ANTES

FOTO 108 - ANTES

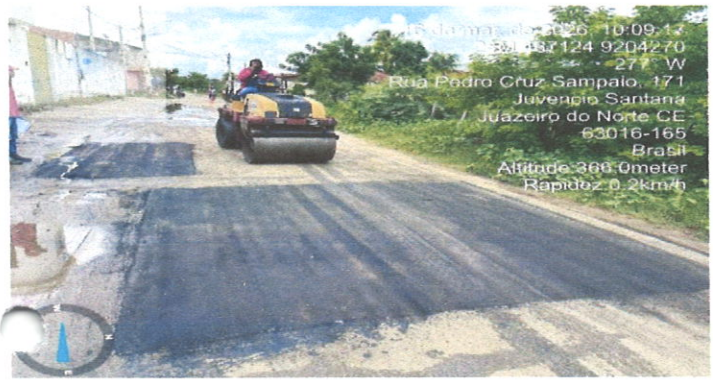

FOTO 109 - B1 E B2

FOTO 110 - B3 E 4

FOTO 111 - B5 E B6

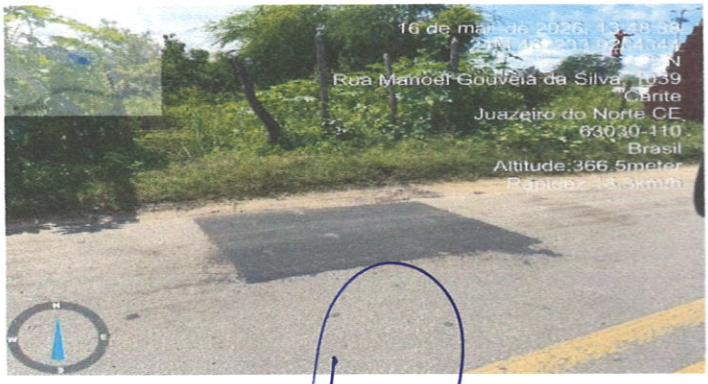

FOTO 112 - B7

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

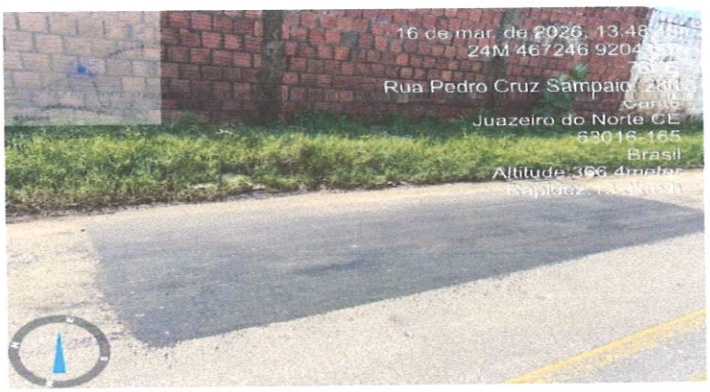

FOTO 113 - B8

FOTO 114 - B9

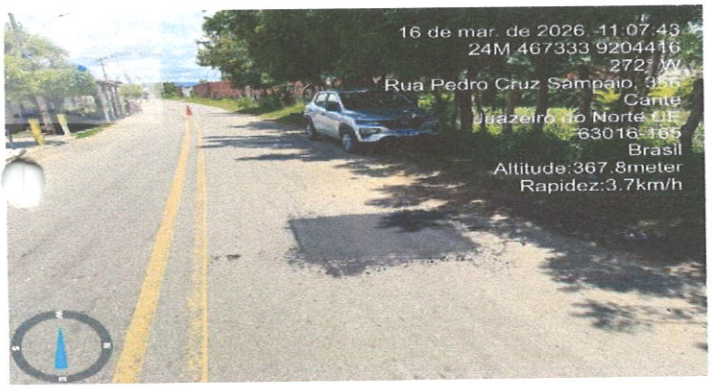

FOTO 115 - B10

FOTO 116 - B10.

FOTO 117 - B11 E 12

FOTO 118 - B13

FOTO 119 - B14 E 15

FOTO 120 - B16

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

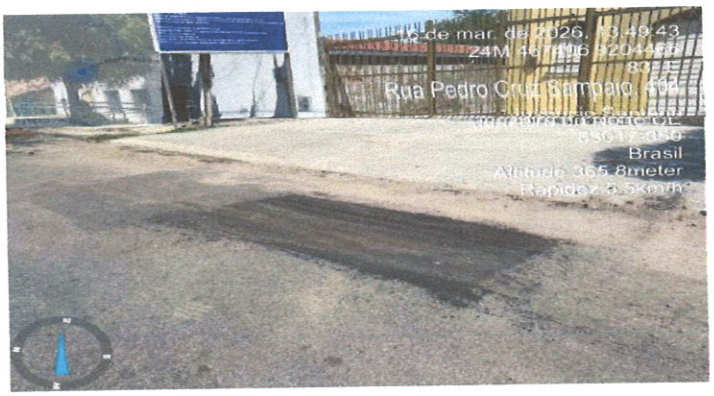

FOTO 121 - B17

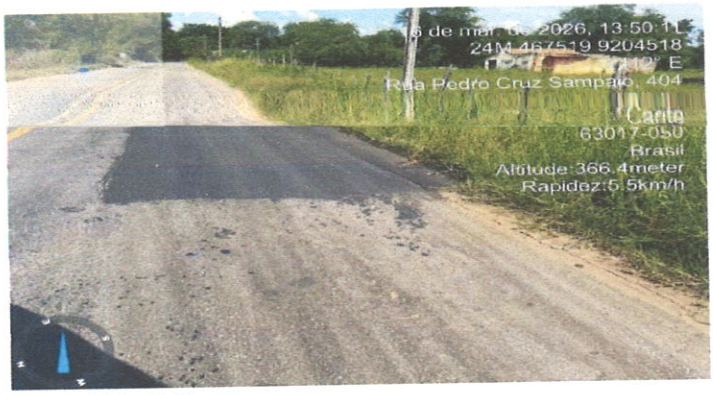

FOTO 122 - B18

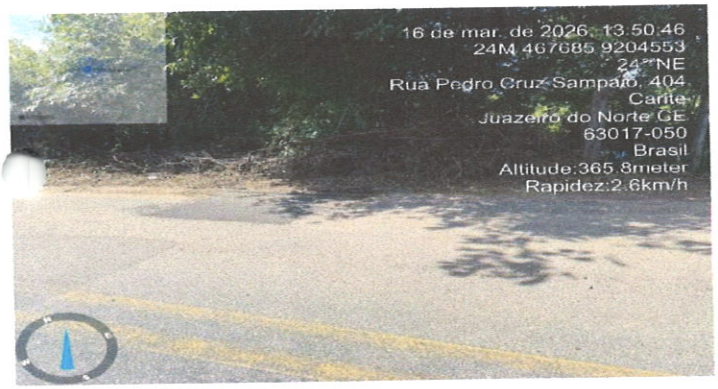

FOTO 123 - B19

FOTO 124 - B20

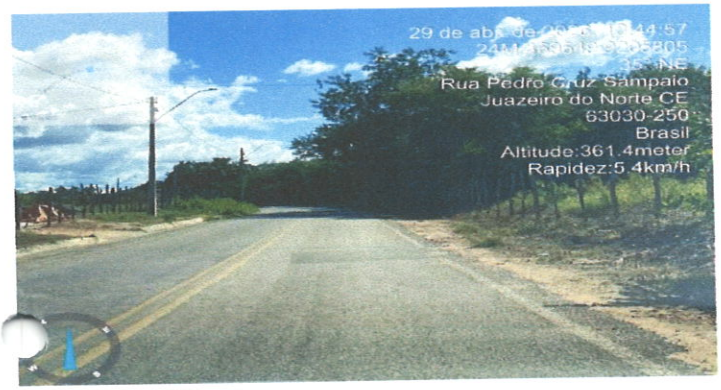

FOTO 125 - B21

FOTO 126 - B22 E B23

FOTO 127 - B24

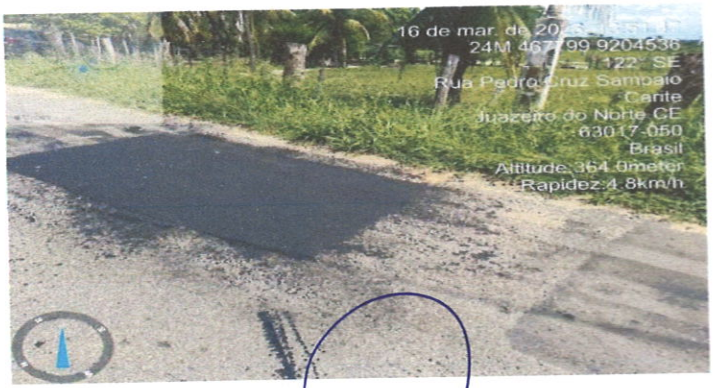

FOTO 128 - B25

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 129 - B26

FOTO 130 - B27 E B28

FOTO 131 - B29

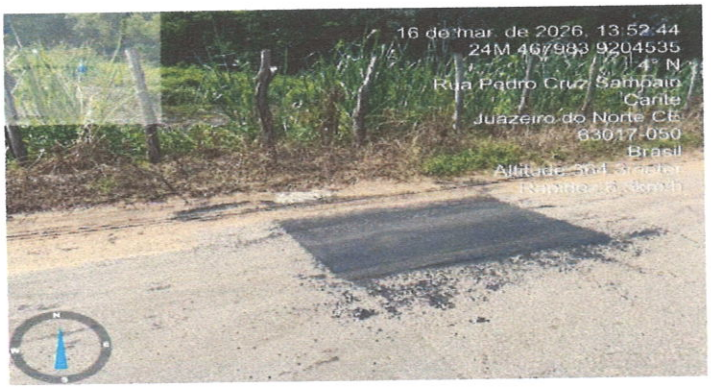

FOTO 132 - B30

FOTO 133 - B31 E B32

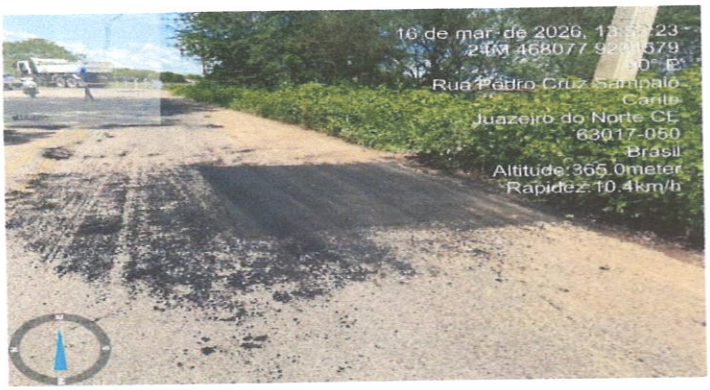

FOTO 134 - B33

FOTO 135 - B34

FOTO 136 - B35

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

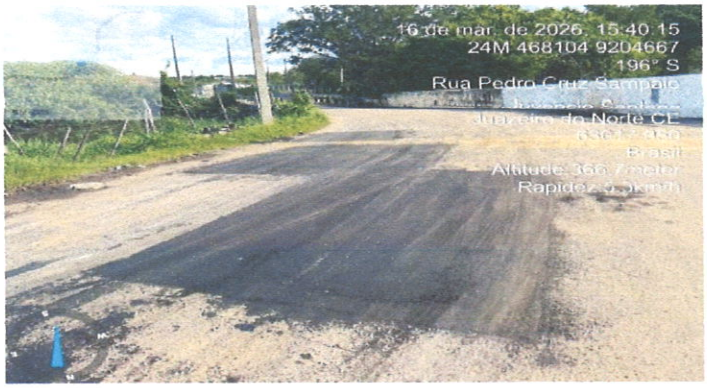

FOTO 137 - B36 A B38

FOTO 138 - B39

FOTO 139 - B40 A B45

FOTO 140 - B46 E B47

FOTO 141 - B48

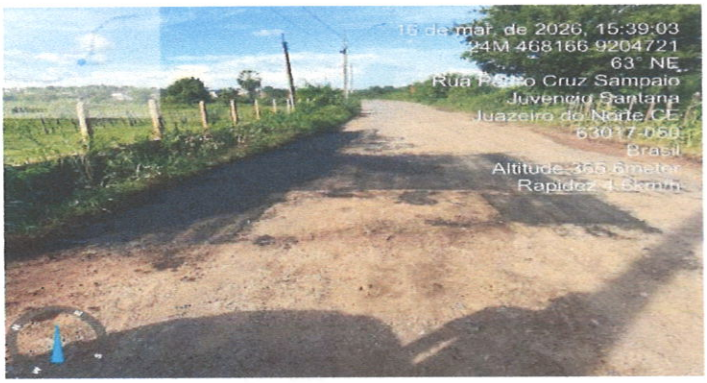

FOTO 142 - B49 A B51

FOTO 143 - B52

FOTO 144 - B53

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

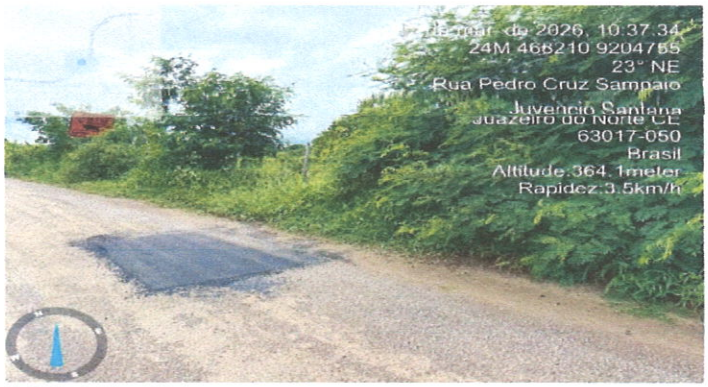

FOTO 145 - B54

FOTO 146 - B55

FOTO 147 - B56

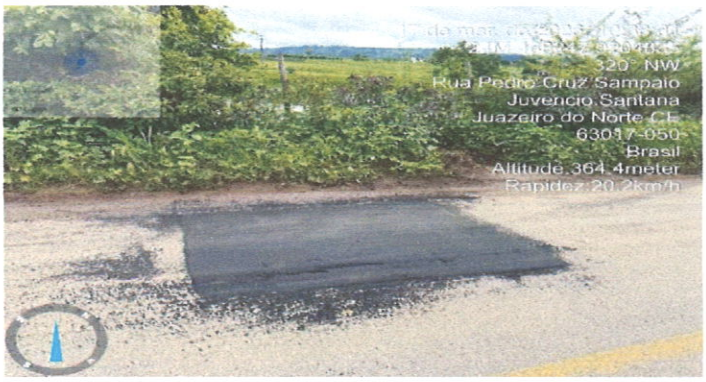

FOTO 148 - B57

FOTO 149 - B58

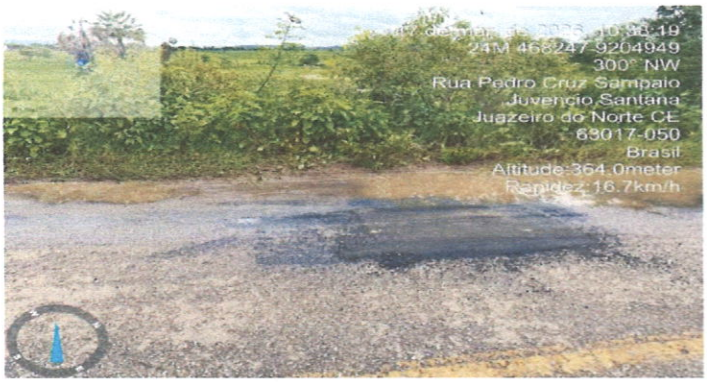

FOTO 150 - B59

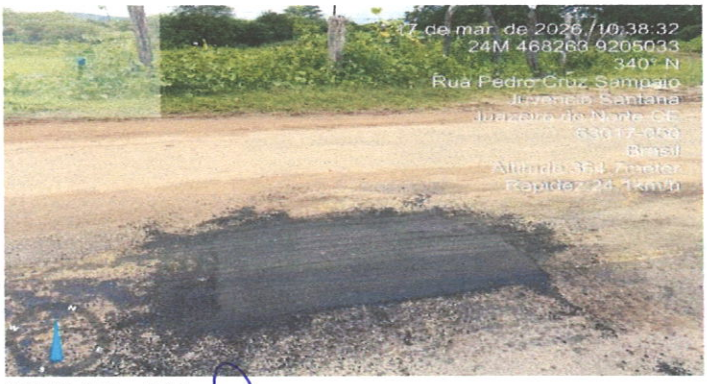

FOTO 151 - B60

FOTO 152 - B61 E B62

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 153 - B63

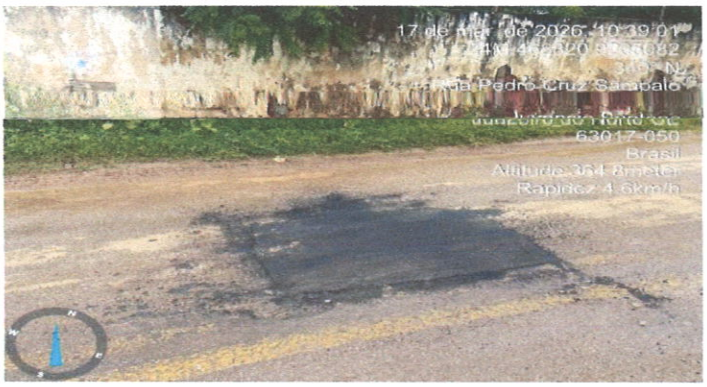

FOTO 154 - B64

FOTO 155 - B65

FOTO 156 - B66

FOTO 157 - B67 A B69

FOTO 158 - B70

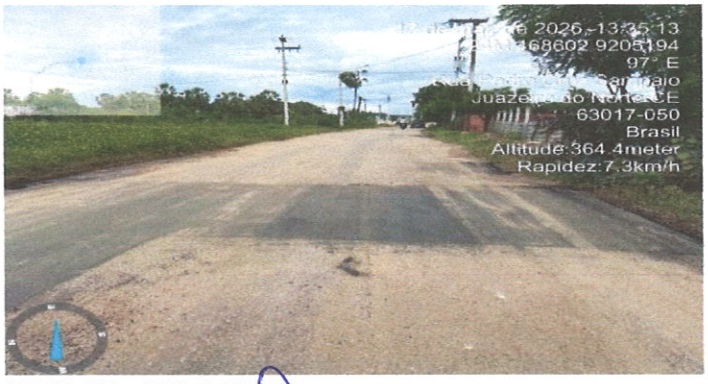

FOTO 159 - B71 A 73

FOTO 160 - B74

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 161 - B75 E B76

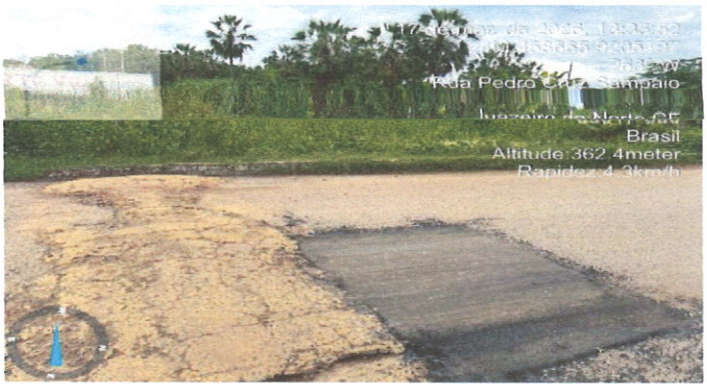

FOTO 162 - B77

FOTO 163 - B78

FOTO 164 - B79 E B80

FOTO 165 - B81

FOTO 166 - B82

FOTO 167 - B83

FOTO 168 - B84

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

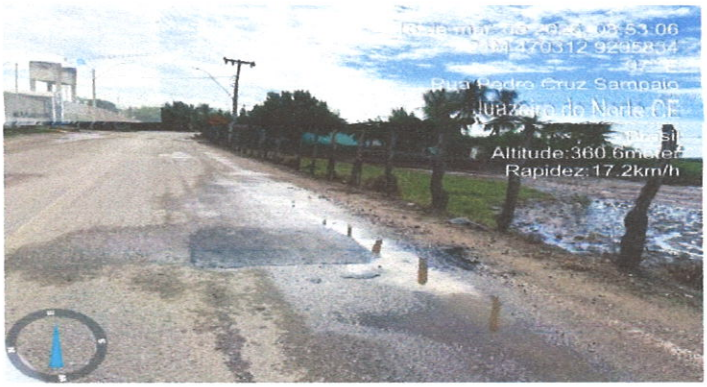

FOTO 169 - B85

FOTO 170 - B86

FOTO 171 - B87

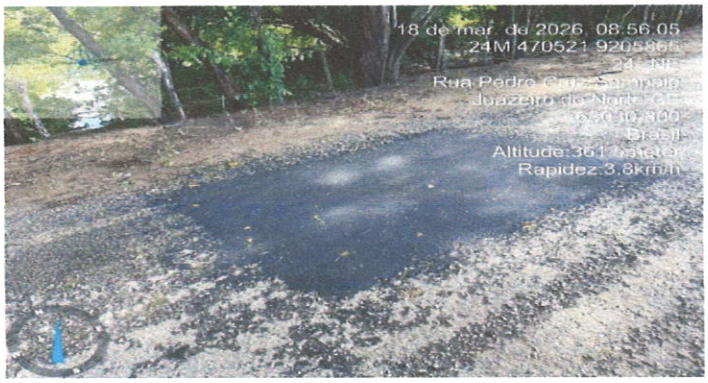

FOTO 172 - B88

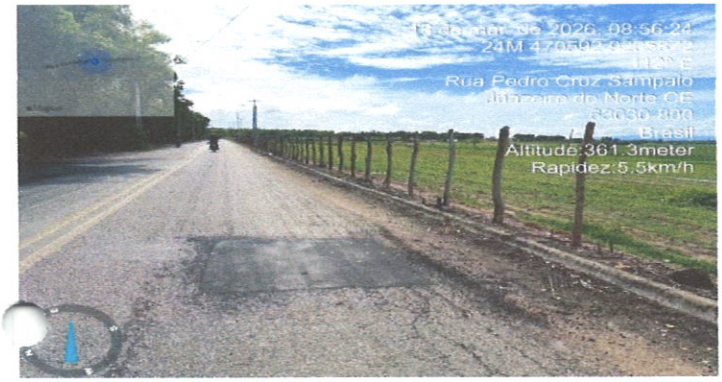

FOTO 173 - B89

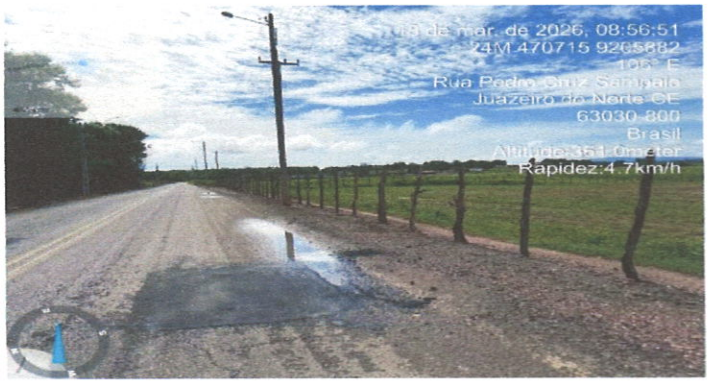

FOTO 174 - B90

FOTO 175 - B91

FOTO 176 - B92

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

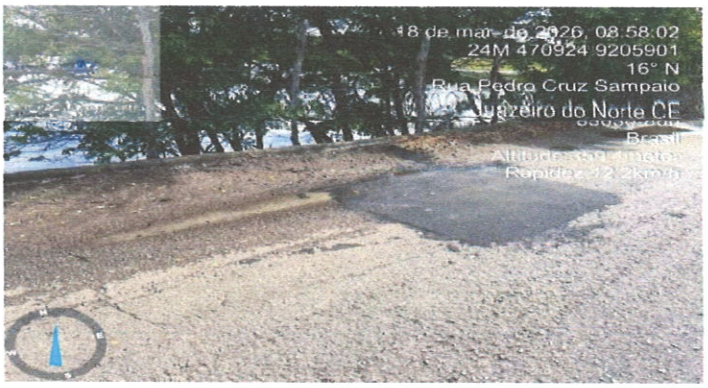

FOTO 177 - B93

FOTO 178 - B94

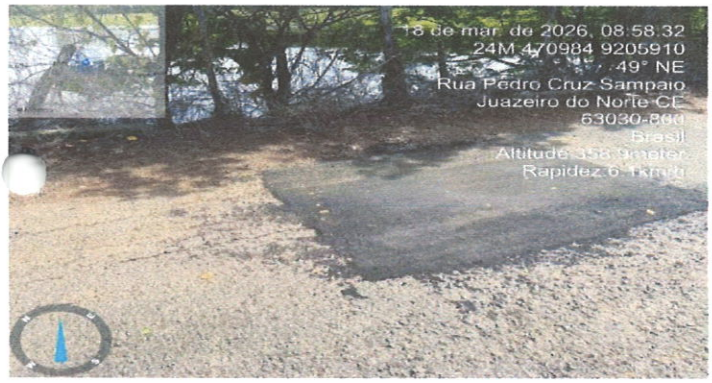

FOTO 179 - B95

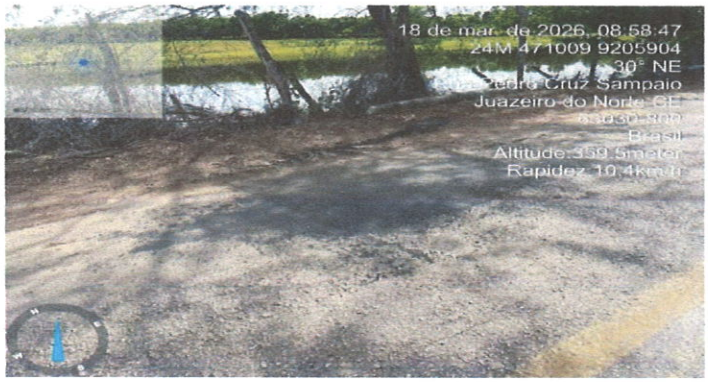

FOTO 180 - B96

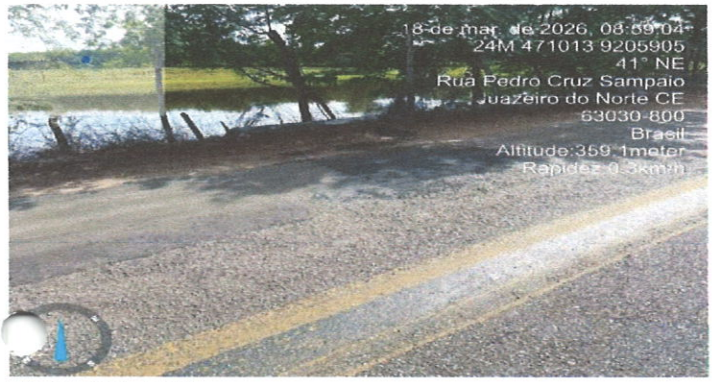

FOTO 181 - B97

FOTO 182 - B98

FOTO 183 - B99

FOTO 184 - B100

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

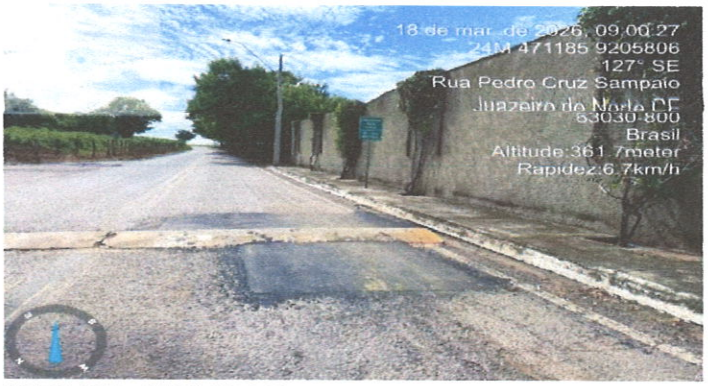

FOTO 185 - B101 E B102

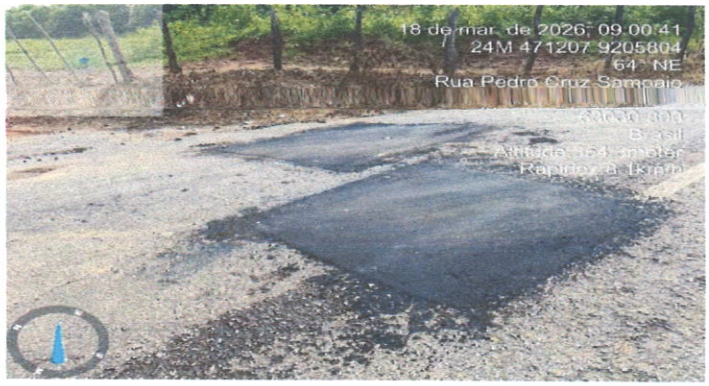

FOTO 186 - B103 E B104

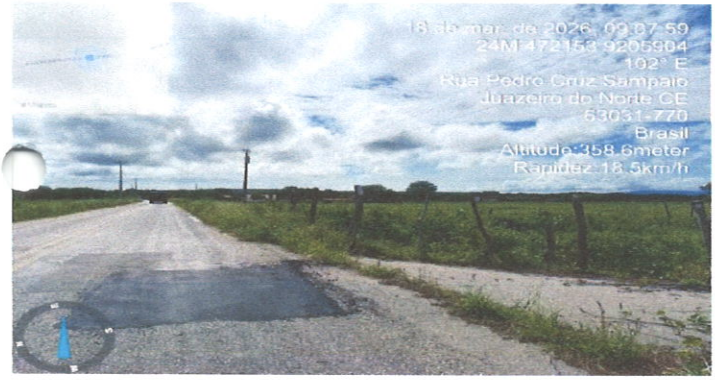

FOTO 187 - B105

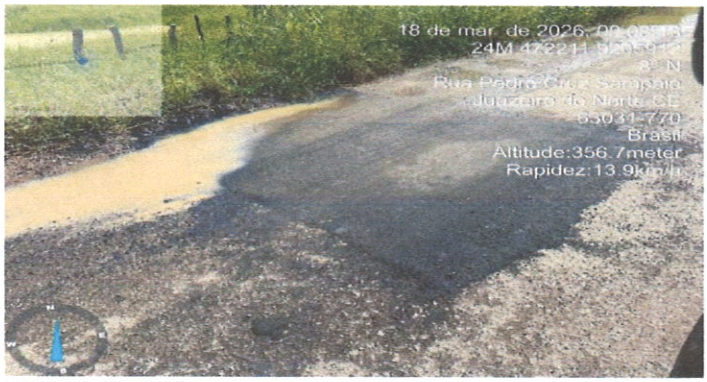

FOTO 188 - B106

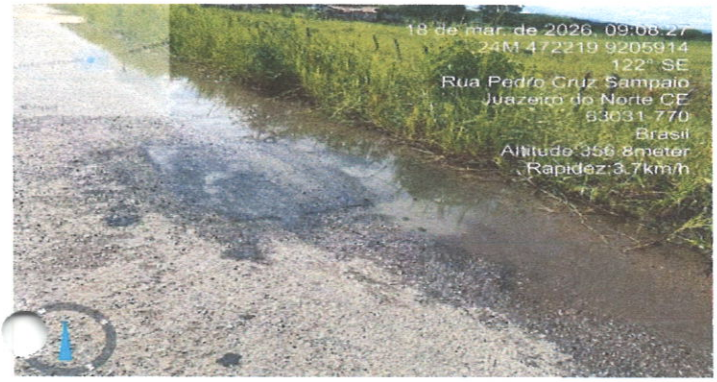

FOTO 189 - B107

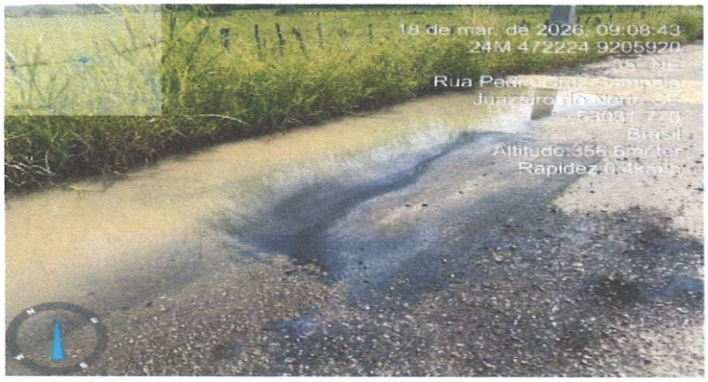

FOTO 190 - B108

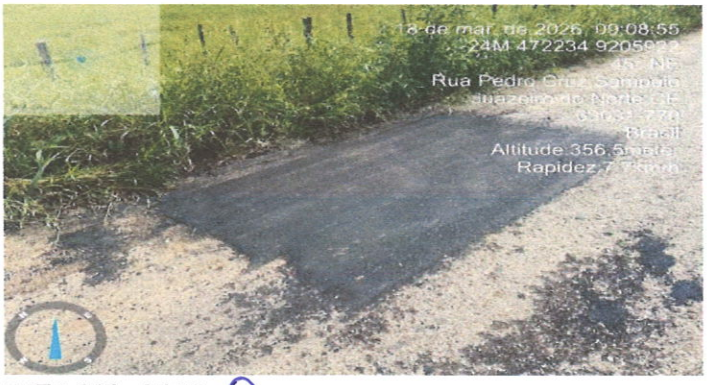

FOTO 191 - B109

FOTO 192 - B110

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 193 - B111

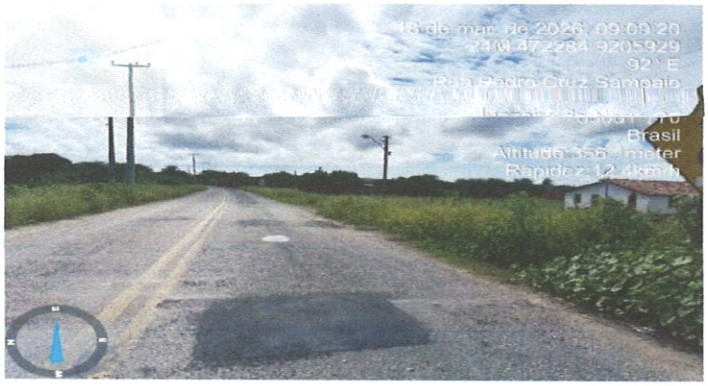

FOTO 194 - B112 A B114

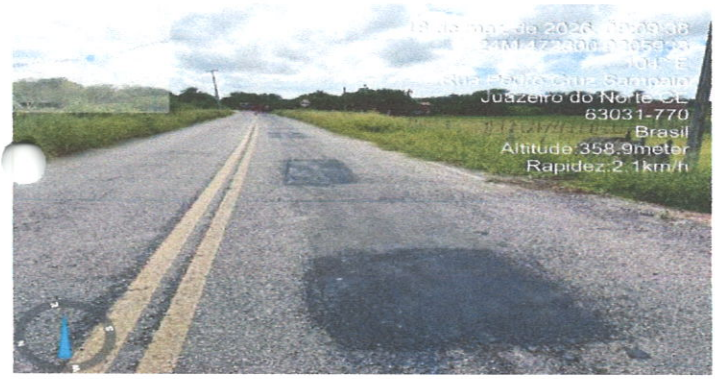

FOTO 195 - B115 A B116

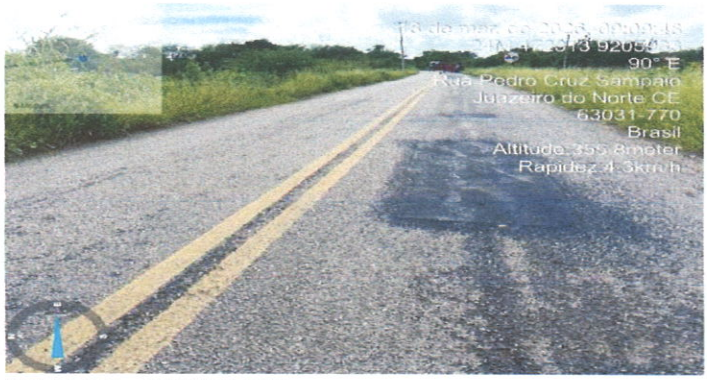

FOTO 196 - B117 E B118

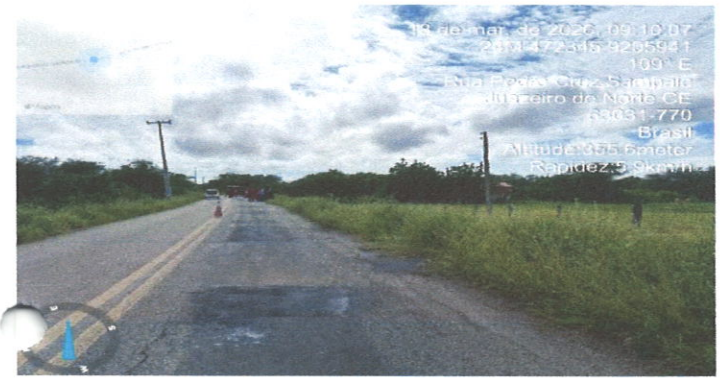

FOTO 197 - B119 A B121

FOTO 198 - B122 E B123

FOTO 199 - B124

FOTO 200 - B125

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 40879/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

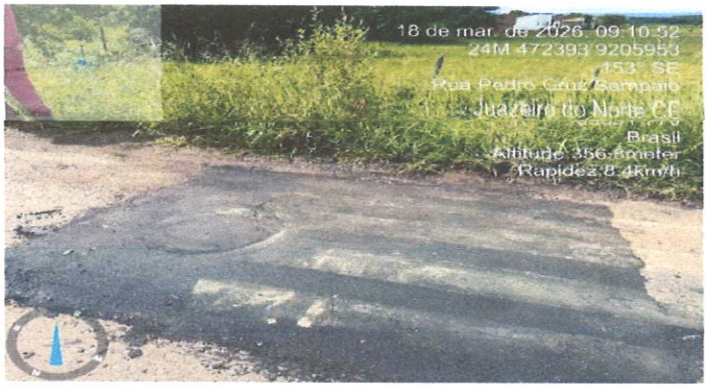

FOTO 201 - B126

FOTO 202 - B127

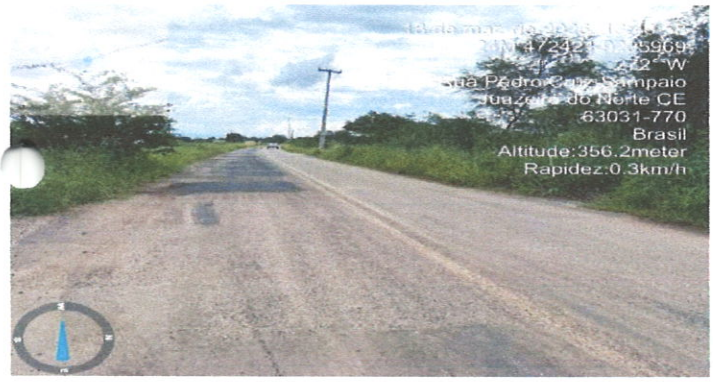

FOTO 203 - B128 A B132

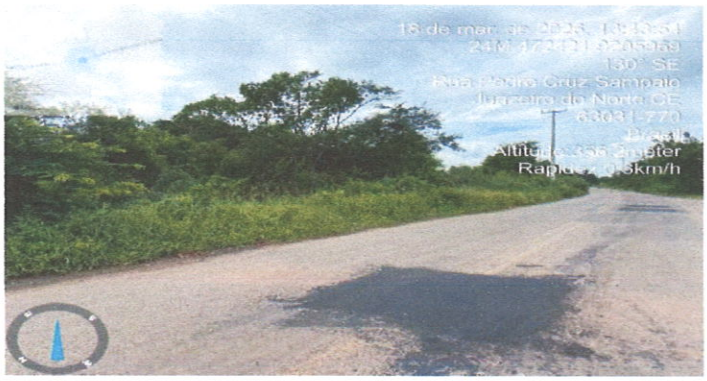

FOTO 204 - B133 A B135

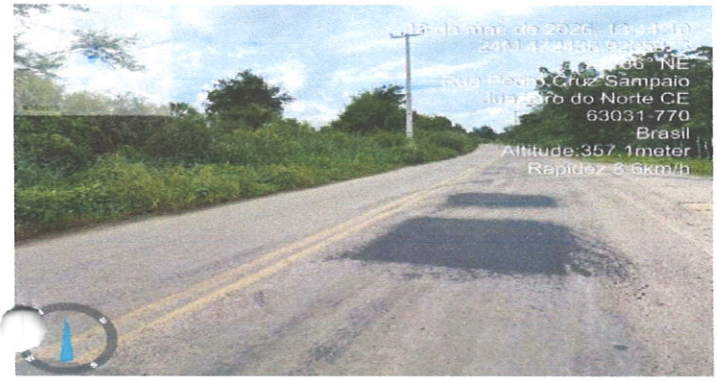

FOTO 205 - B136 E B137

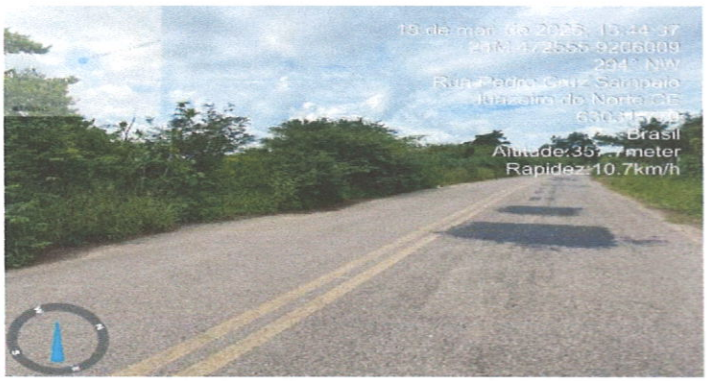

FOTO 206 - B138 E B139

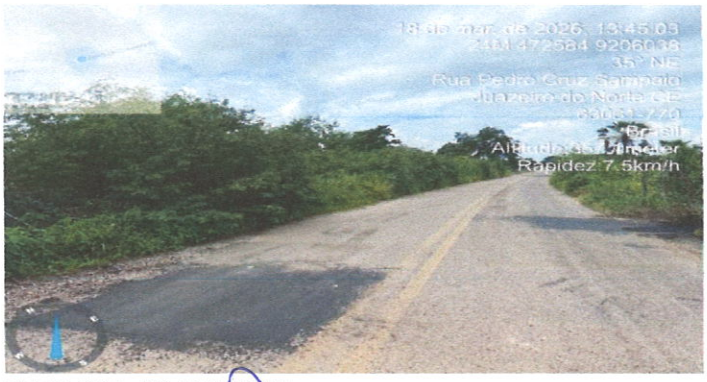

FOTO 207 - B140 E B141

FOTO 208 - B142 A B147

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

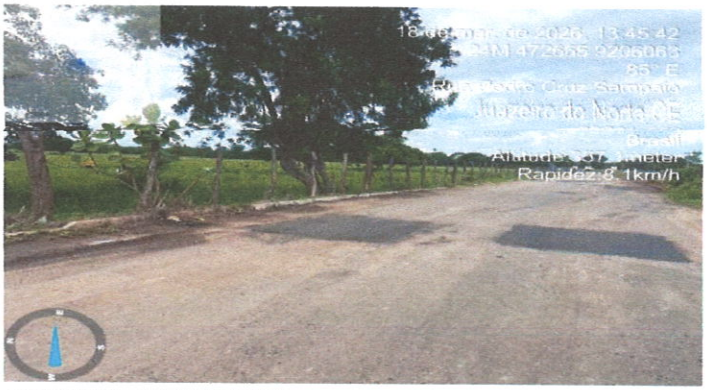

FOTO 209 - B148 E B149

FOTO 210 - B150 E B151

FOTO 211 - B152 A B154

FOTO 212 - B155

FOTO 213 - B156

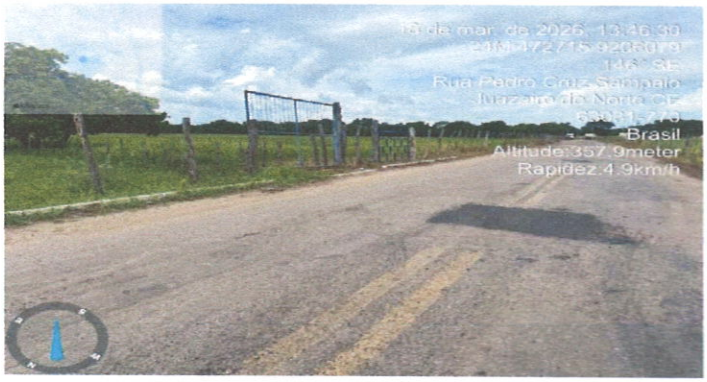

FOTO 214 - B157

FOTO 215 - B158

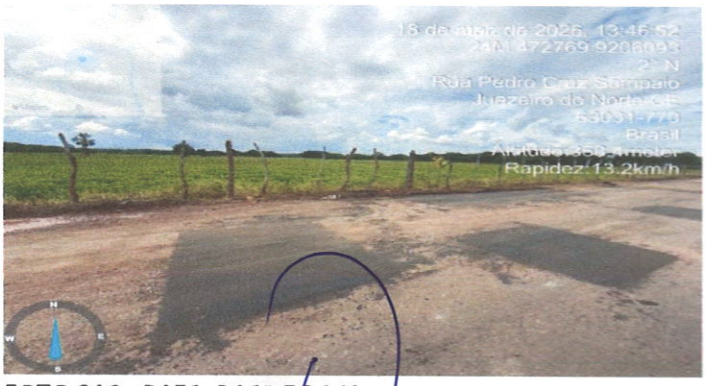

FOTO 216 - B159, B160 E B162

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 217 - B161

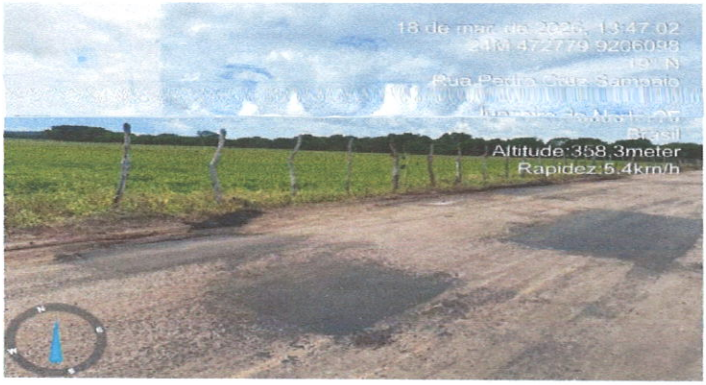

FOTO 218 - B163 E B164

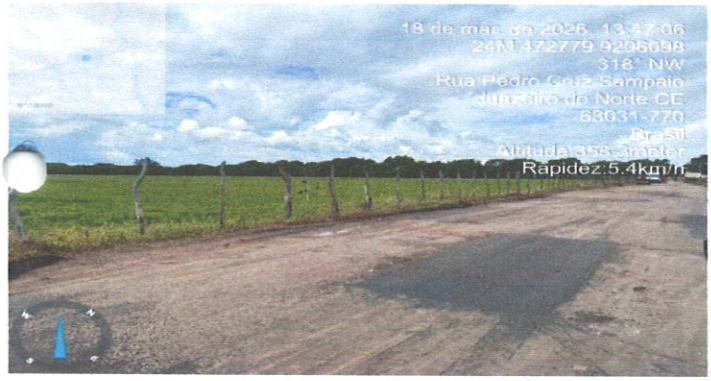

FOTO 219 - B165



FOTO 220 - B166

FOTO 221 - B167

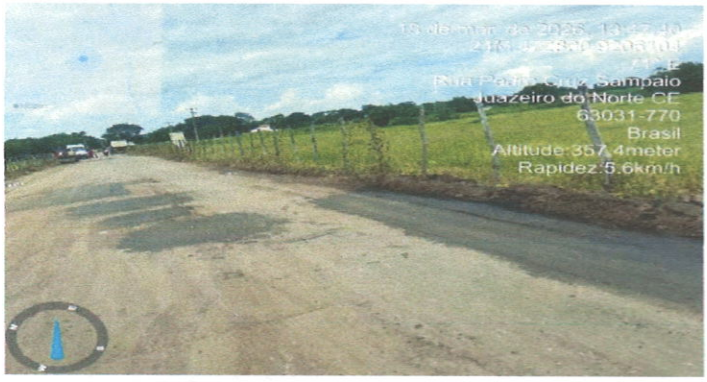

FOTO 222 - B168, B171 A B175

FOTO 223 - B169 E B170

FOTO 224 - B176 A B177

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44879/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 225 - B178 A B180

FOTO 226 - B181

FOTO 227 - B182 E B183

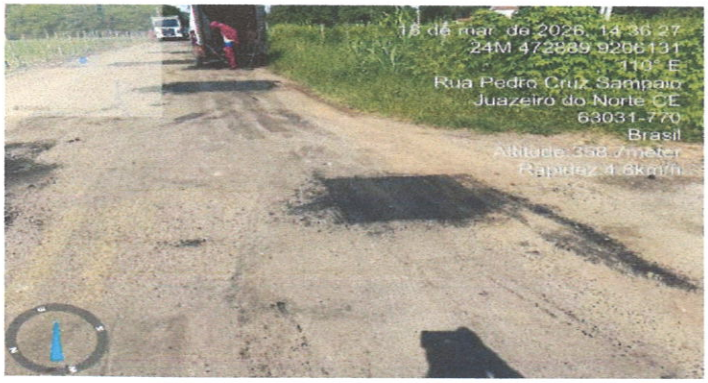

FOTO 228 - B184

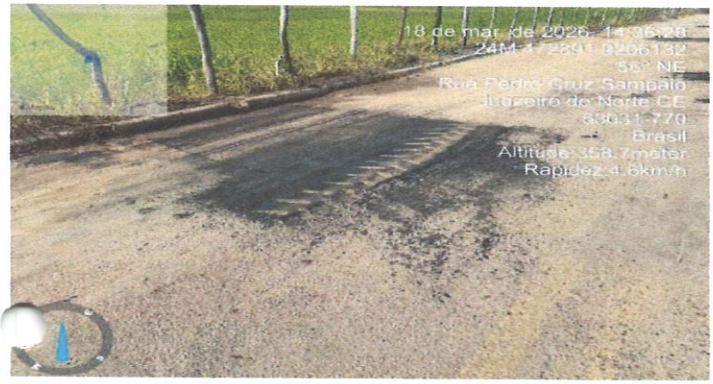

FOTO 229 - B185

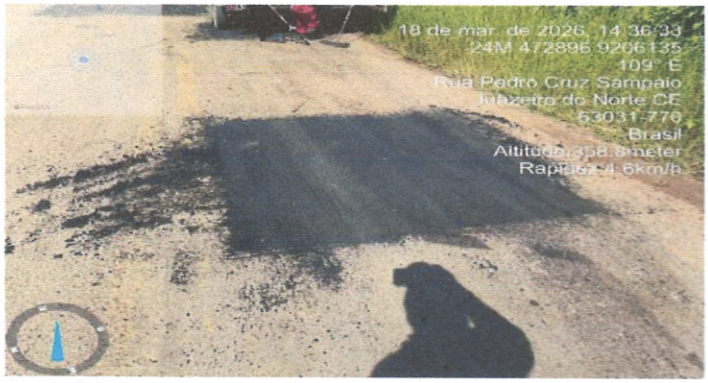

FOTO 230 - B186

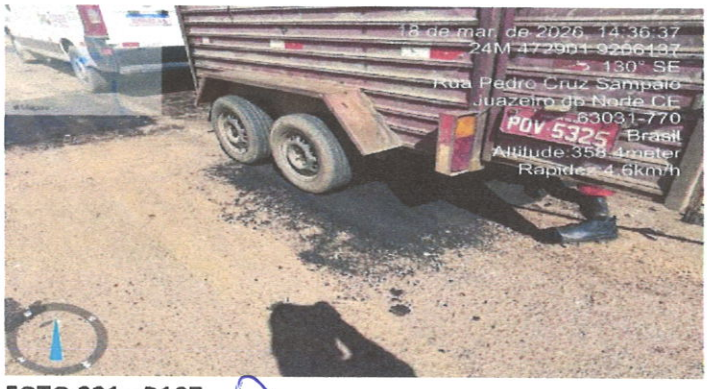

FOTO 231 - B187

FOTO 232 - B188

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 233 - B189

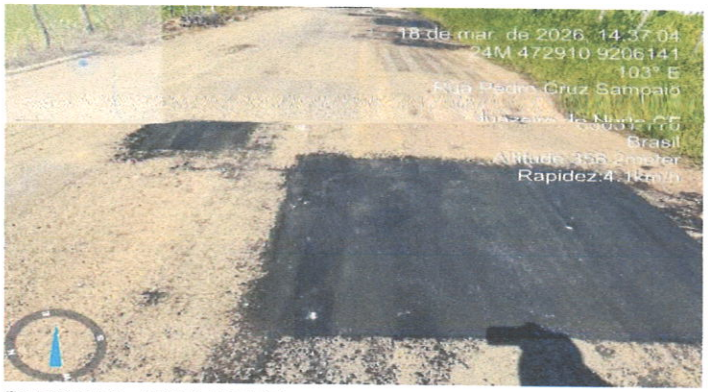

FOTO 234 - B190 E B191

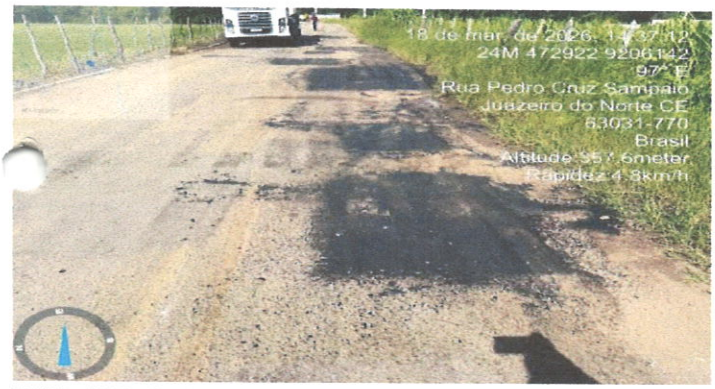

FOTO 235 - B192 E B193

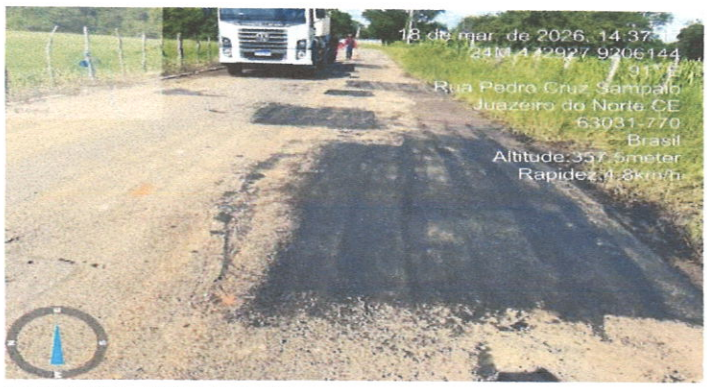

FOTO 236 - B194 A B196

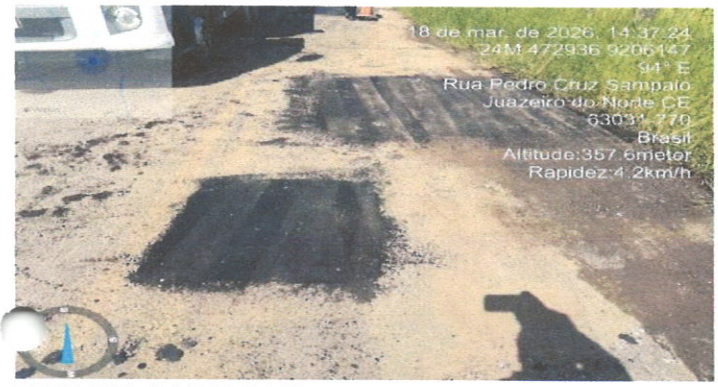

FOTO 237 - B197 A B198

FOTO 238 - B199

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 18.03.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA LEÃO XIII.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 18 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

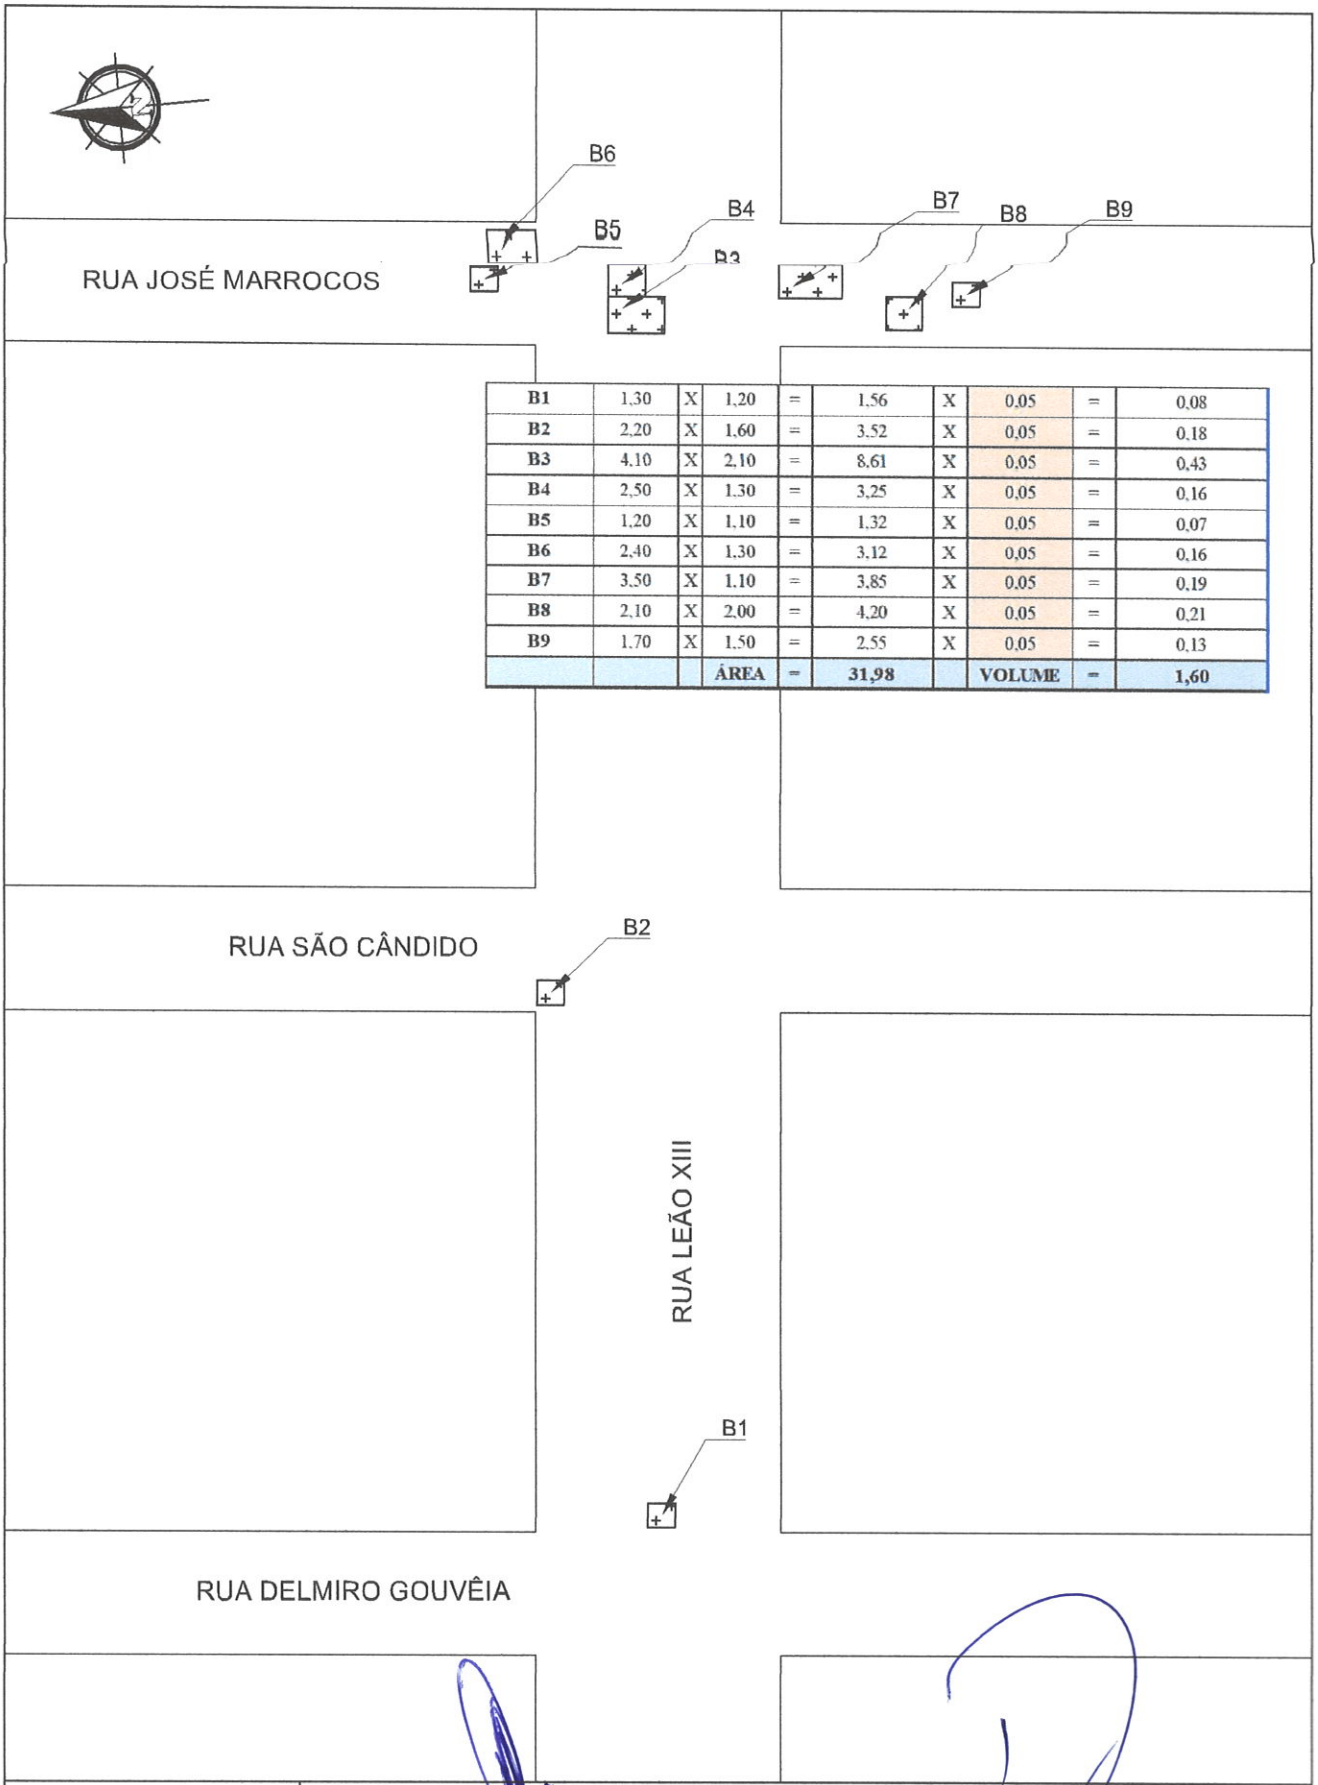

B1	1,30	X	1,20	=	1,56	X	0,05	=	0,08
B2	2,20	X	1,60	=	3,52	X	0,05	=	0,18
B3	4,10	X	2,10	=	8,61	X	0,05	=	0,43
B4	2,50	X	1,30	=	3,25	X	0,05	=	0,16
B5	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,05	=	0,07
B6	2,40	X	1,30	=	3,12	X	0,05	=	0,16
B7	3,50	X	1,10	=	3,85	X	0,05	=	0,19
B8	2,10	X	2,00	=	4,20	X	0,05	=	0,21
B9	1,70	X	1,50	=	2,55	X	0,05	=	0,13
			ÁREA	=	**31,98**		**VOLUME**	=	**1,60**

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 29	**LOCALIDADE:** RUA LEÃO XIII	**BAIRRO:** SALESIANOS	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 18/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	**LONG.:** 464738 **LAT.:** 9202708

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
29	RUA LEÃO XIII	SALESIANOS

TRECHO

ENTRE A RUA DELMIRO GOUVEIA E A RUA JOSE MARROCOS

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO

PHILIPPE E FRANKLIM

DATA MEDIÇÃO

18/03/2026

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	29	RUA LEÃO XIII				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	31,98	R$ 1,84	R$ 58,84
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	1,60	R$ 1.696,15	R$ 2.712,14
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	31,98	R$ 0,33	R$ 10,55
2.4	INS	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,01	R$ 3.062,93	R$ 39,18
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) -	T	0,24	R$ 472,85	R$ 115,38
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO -	T	4,10	R$ 30,12	R$ 123,43
					TOTAL	R$ 3.059,52

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - B1

FOTO 07 - B2

FOTO 08 - B3 A B9

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO**
18.03.2026-02	CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO	**DATA DO CONTRATO**
2025.09.02-0002	02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A)	
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO:	
AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF	**N° DO TELEFONE/FAX**
07.195.191/0001-33	(85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA PADRE CÍCERO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO**
12 (DOZE) MESES	12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 18 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

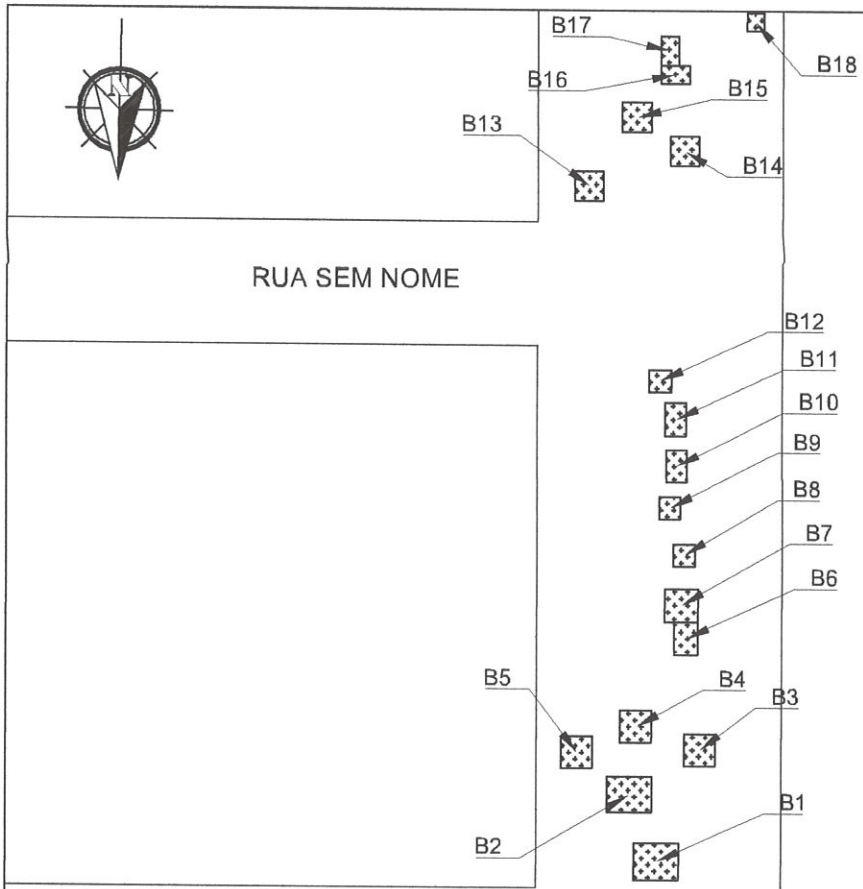

B1	1,80	X	1,60	=	2,88	X	0,05	=	0,14
B2	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,05	=	0,06
B3	0,90	X	0,80	=	0,72	X	0,05	=	0,04
B4	0,30	X	0,30	=	0,09	X	0,05	=	0,00
B5	0,40	X	0,30	=	0,12	X	0,05	=	0,01
B6	2,40	X	1,40	=	3,36	X	0,05	=	0,17
B7	2,50	X	1,80	=	4,50	X	0,05	=	0,23
B8	1,30	X	1,20	=	1,56	X	0,05	=	0,08
B9	1,50	X	1,20	=	1,80	X	0,05	=	0,09
B10	3,30	X	0,90	=	2,97	X	0,05	=	0,15
B11	1,80	X	1,10	=	1,98	X	0,05	=	0,10
B12	0,60	X	0,50	=	0,30	X	0,05	=	0,02
B13	0,70	X	0,50	=	0,35	X	0,05	=	0,02
B14	0,90	X	0,80	=	0,72	X	0,05	=	0,04
B15	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09
B16	2,40	X	1,00	=	2,40	X	0,05	=	0,12
B17	1,90	X	1,10	=	2,09	X	0,05	=	0,10
B18	0,80	X	0,80	=	0,64	X	0,05	=	0,03

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 30	**LOCALIDADE:** RUA PADRE CÍCERO	**BAIRRO:** CENTRO	**PRANCHA:** 1/3
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO		**COORDENADAS UTM**	
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	**LONG.:** 465002 **LAT.:** 9204299

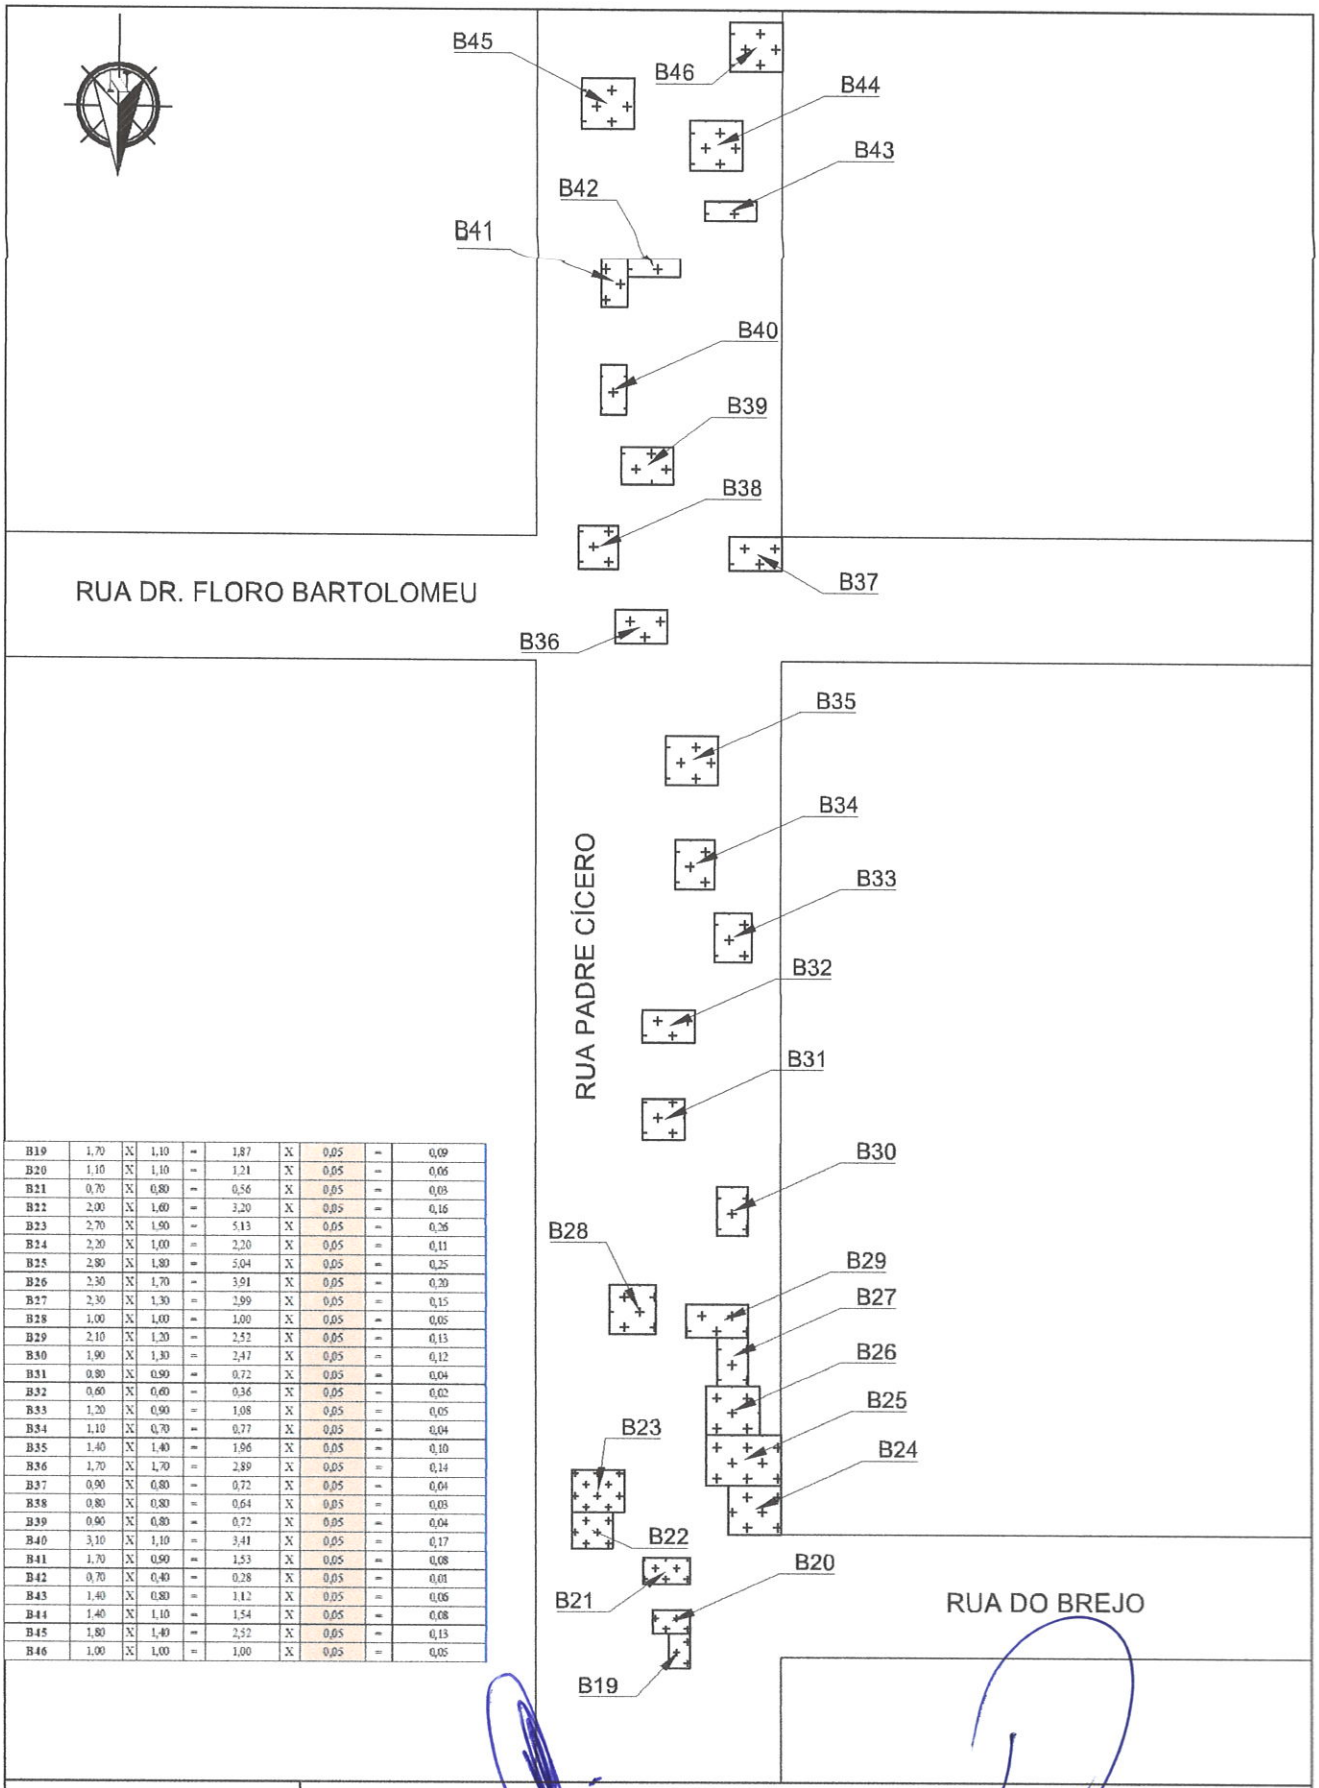

B19	1,70	X	1,10	=	1,87	X	0,05	=	0,09
B20	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,05	=	0,06
B21	0,70	X	0,80	=	0,56	X	0,05	=	0,03
B22	2,00	X	1,60	=	3,20	X	0,05	=	0,16
B23	2,70	X	1,90	=	5,13	X	0,05	=	0,26
B24	2,20	X	1,00	=	2,20	X	0,05	=	0,11
B25	2,80	X	1,80	=	5,04	X	0,05	=	0,25
B26	2,30	X	1,70	=	3,91	X	0,05	=	0,20
B27	2,30	X	1,30	=	2,99	X	0,05	=	0,15
B28	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05
B29	2,10	X	1,20	=	2,52	X	0,05	=	0,13
B30	1,90	X	1,30	=	2,47	X	0,05	=	0,12
B31	0,80	X	0,90	=	0,72	X	0,05	=	0,04
B32	0,60	X	0,60	=	0,36	X	0,05	=	0,02
B33	1,20	X	0,90	=	1,08	X	0,05	=	0,05
B34	1,10	X	0,70	=	0,77	X	0,05	=	0,04
B35	1,40	X	1,40	=	1,96	X	0,05	=	0,10
B36	1,70	X	1,70	=	2,89	X	0,05	=	0,14
B37	0,90	X	0,80	=	0,72	X	0,05	=	0,04
B38	0,80	X	0,80	=	0,64	X	0,05	=	0,03
B39	0,90	X	0,80	=	0,72	X	0,05	=	0,04
B40	3,10	X	1,10	=	3,41	X	0,05	=	0,17
B41	1,70	X	0,90	=	1,53	X	0,05	=	0,08
B42	0,70	X	0,40	=	0,28	X	0,05	=	0,01
B43	1,40	X	0,80	=	1,12	X	0,05	=	0,06
B44	1,40	X	1,10	=	1,54	X	0,05	=	0,08
B45	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,05	=	0,13
B46	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 30	**LOCALIDADE:** RUA PADRE CÍCERO	**BAIRRO:** CENTRO	**PRANCHA:** 2/3
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465002 **LAT.:** 9204299
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

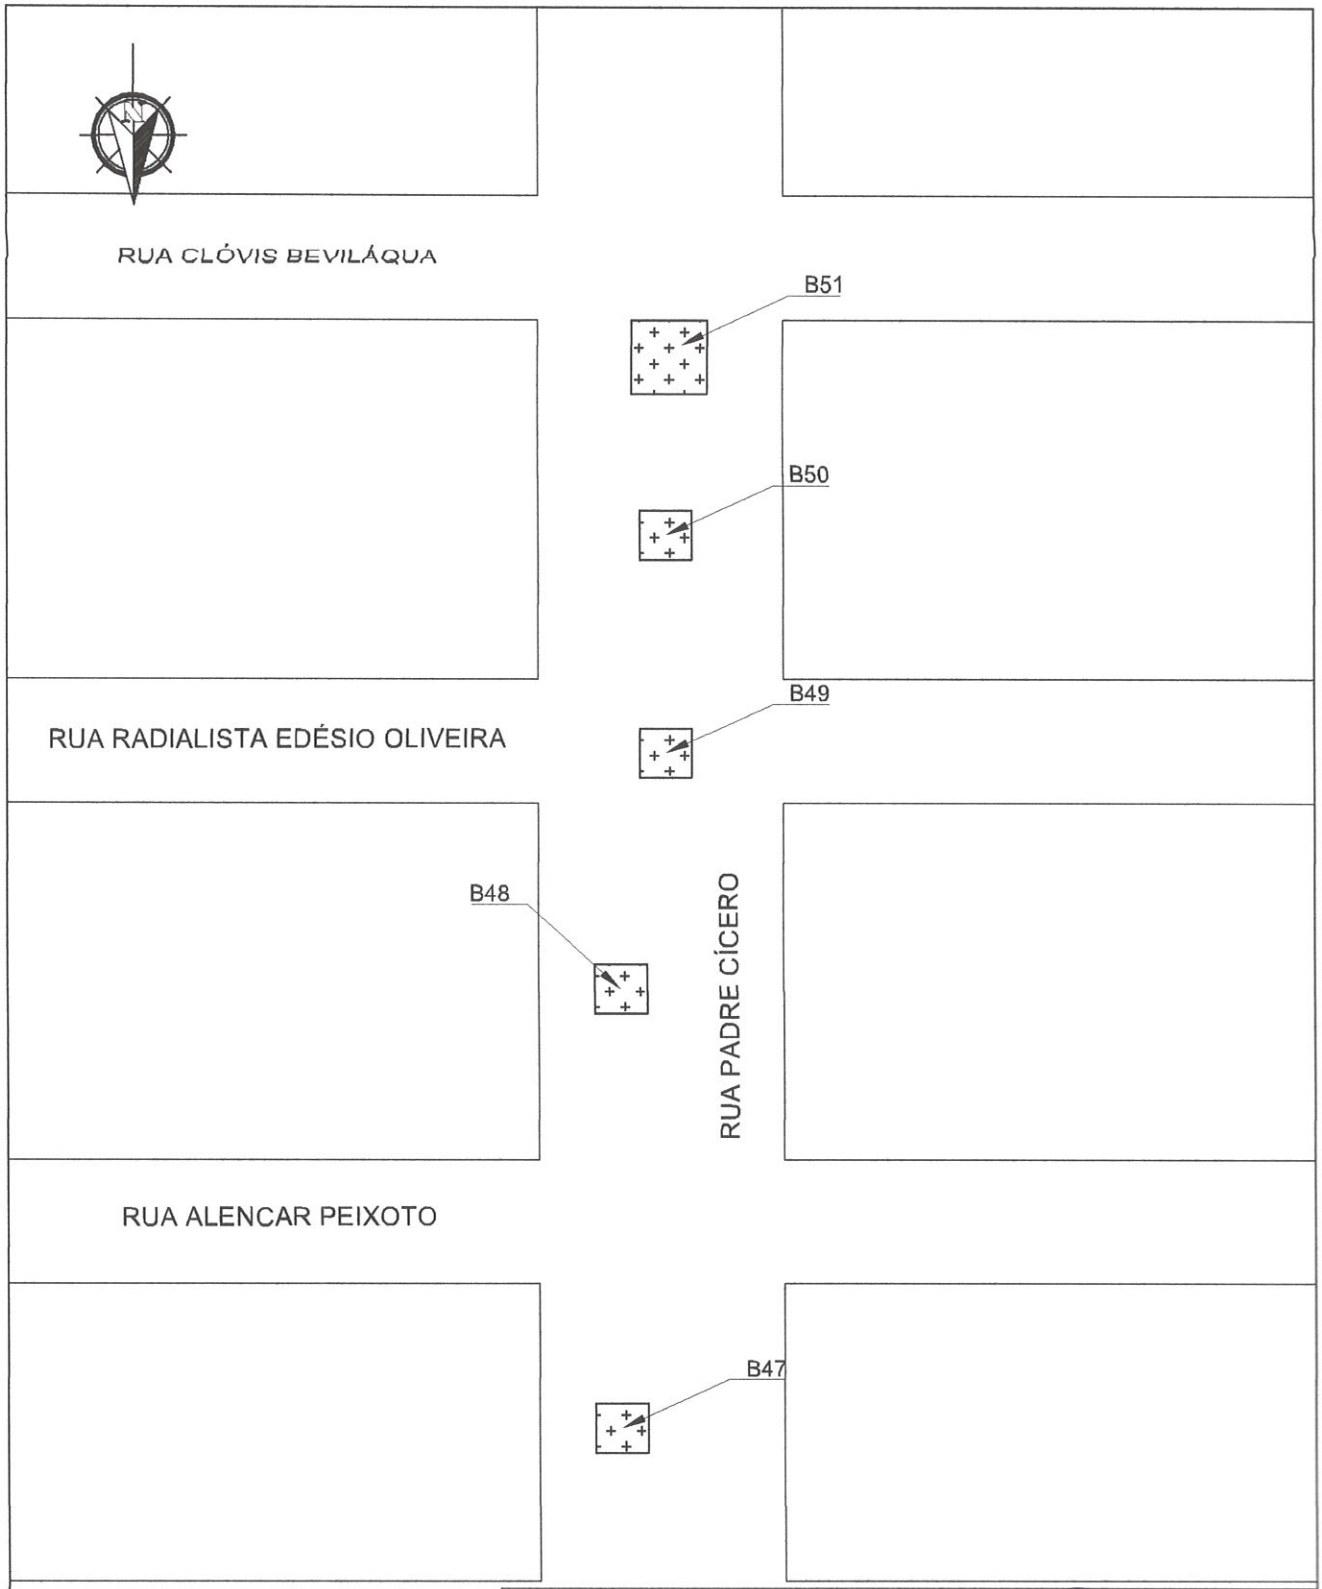

B47	2,50	X	1,20	=	3,00	X	0,05	=	0,15
B48	1,70	X	1,60	=	2,72	X	0,05	=	0,14
B49	2,50	X	1,50	=	3,75	X	0,05	=	0,19
B50	1,30	X	1,30	=	1,69	X	0,05	=	0,08
B51	3,00	X	3,00	=	9,00	X	0,05	=	0,45
			ÁREA	=	**103,03**		**VOLUME**	=	**5,15**

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 30	**LOCALIDADE:** RUA PADRE CÍCERO	**BAIRRO:** CENTRO	**PRANCHA:** 3/3
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465002 **LAT.:** 9204299
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
30	RUA PADRE CÍCERO	CENTRO

TRECHO

ENTRE A RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ E A RUA CLOVIS BEVILAQUA

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	20/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	30	RUA PADRE CÍCERO						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I		P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	103,03	R$	1,84	R$	189,58
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM						
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	5,15	R$	1.696,15	R$	8.737,72
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/ TRANSP)	M2	103,03	R$	0,33	R$	34,00
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,04	R$	3.062,93	R$	126,23
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,79	R$	472,85	R$	371,72
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	13,20	R$	30,12	R$	397,65
					TOTAL		R$	9.856,90

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

FOTO 07 - ANTES

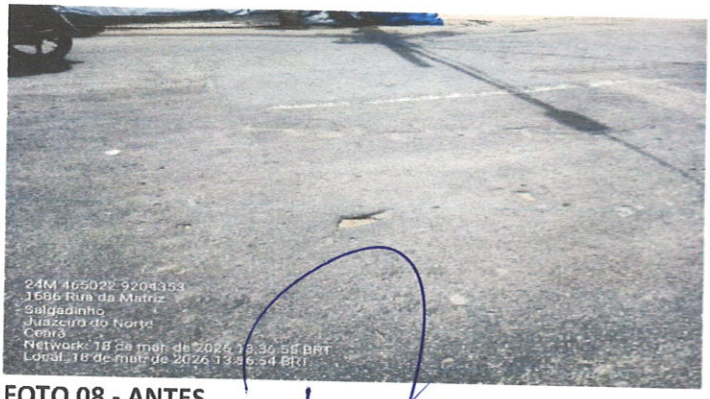

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 64979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - ANTES

FOTO 10 - ANTES

FOTO 11 - ANTES

FOTO 12 - ANTES

FOTO 13 - ANTES

FOTO 14 - ANTES

FOTO 15 - ANTES

FOTO 16 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 17 - ANTES

FOTO 18 - ANTES

FOTO 19 - ANTES

FOTO 20 - ANTES

FOTO 21 - ANTES

FOTO 22 - ANTES

FOTO 23 - ANTES

FOTO 24 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 25 - ANTES

FOTO 26 - ANTES

FOTO 27 - ANTES

FOTO 28 - ANTES

FOTO 29 - ANTES

FOTO 30 - ANTES

FOTO 31 - ANTES

FOTO 32 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 33 - ANTES

FOTO 34 - ANTES

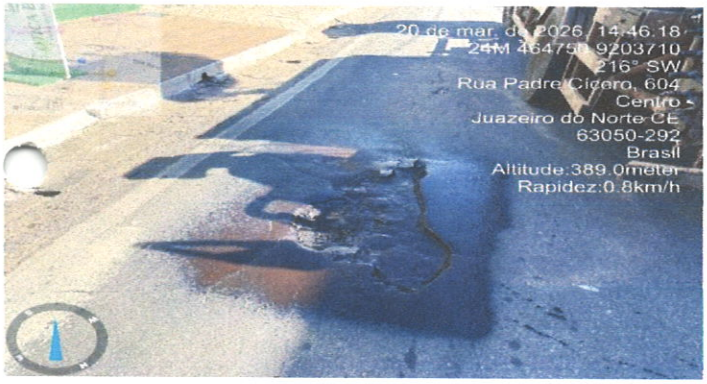

FOTO 35 - ANTES

FOTO 36 - ANTES

FOTO 37 - ANTES

FOTO 38 - B1

FOTO 39 - B2 A B5

FOTO 40 - B6 E B7

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 41 - B8

FOTO 42 - B9

FOTO 43 - B10

FOTO 44 - B11 E B12

FOTO 45 - B13

FOTO 46 - B14

FOTO 47 - B15

FOTO 48 - B16 E B17

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 49 - B18

FOTO 50 - B19 E B20

FOTO 51 - B21

FOTO 52 - B22 E B23

FOTO 53 - B24, B25, B26, B27 E B29

FOTO 54 - B28

FOTO 55 - B30

FOTO 56 - B31

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 57 - B32

FOTO 58 - B33

FOTO 59 - B34

FOTO 60 - B35

FOTO 61 - B36

FOTO 62 - B37

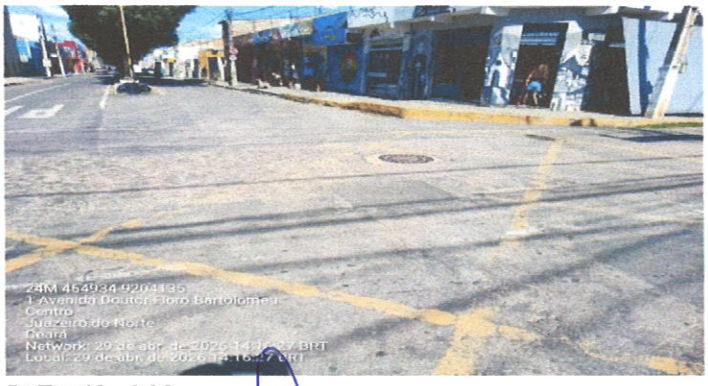

FOTO 63 - B38

FOTO 64 - B39

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 65 - B40

FOTO 66 - B41 E B42

FOTO 67 - B43

FOTO 68 - B44

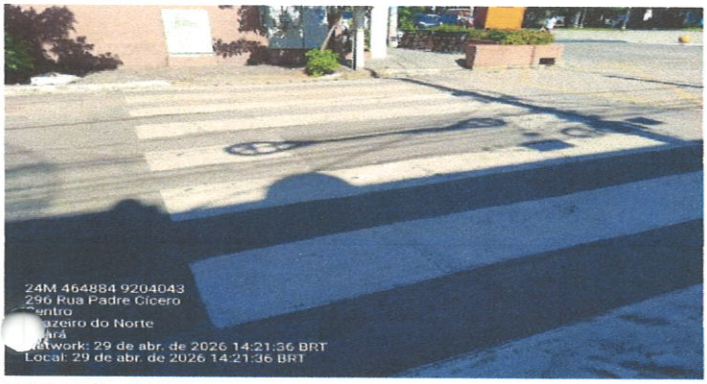

FOTO 69 - B45

FOTO 70 - B46

FOTO 71 - B47

FOTO 72 - B48

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 73 - B49

FOTO 74 - B50

FOTO 75 - B51

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodoviário Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 18.03.2026-03	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA DO CRUZEIRO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 18 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

B1	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05
B2	2,20	X	1,10	=	2,42	X	0,05	=	0,12
			ÁREA	=	**3,42**		**VOLUME**	=	**0,17**

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 31	**LOCALIDADE:** RUA DO CRUZEIRO	**BAIRRO:** CENTRO	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	**LONG.:** 464814 **LAT.:** 9204053

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID: 31

ENDEREÇO: RUA DO CRUZEIRO

BAIRRO: CENTRO

TRECHO: CRUZAMENTO COM A RUA SÃO JOSE

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM

DATA MEDIÇÃO: 20/03/2026

EMPRESA EXECUTORA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO: N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	31	RUA DO CRUZEIRO				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3,42	R$ 1,84	R$ 6,29
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	0,17	R$ 1.696,15	R$ 290,04
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3,42	R$ 0,33	R$ 1,13
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,00	R$ 3.062,93	R$ 4,19
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,03	R$ 472,85	R$ 12,34
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	0,44	R$ 30,12	R$ 13,20
					TOTAL	R$ 327,19

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - B1 E B2

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 18.03.2026-04	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) AVENIDA LEANDRO BEZERRA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 18 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

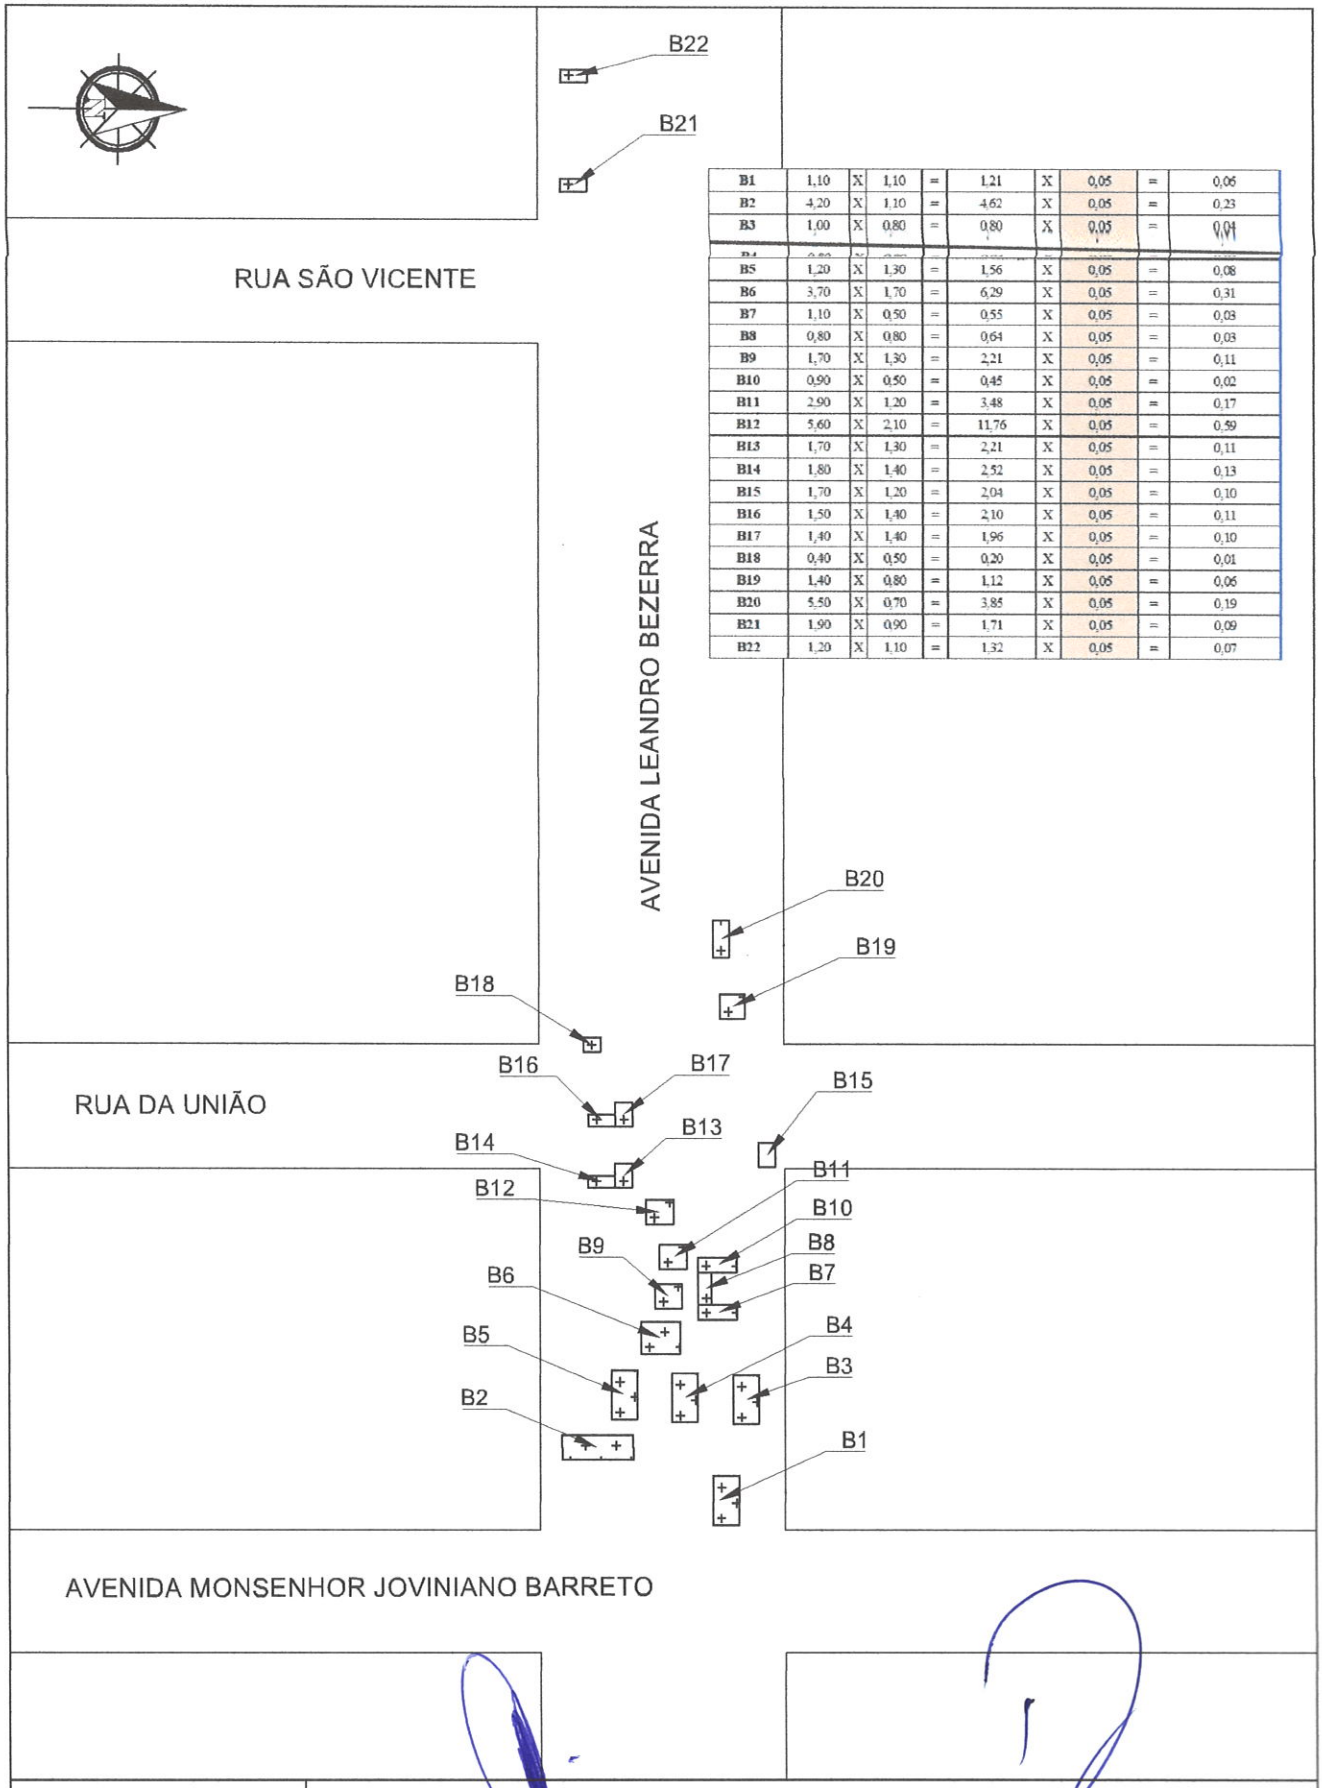

B1	1,10	X	1,10	=	1,21	X	0,05	=	0,06
B2	4,20	X	1,10	=	4,62	X	0,05	=	0,23
B3	1,00	X	0,80	=	0,80	X	0,05	=	0,04
B4									
B5	1,20	X	1,30	=	1,56	X	0,05	=	0,08
B6	3,70	X	1,70	=	6,29	X	0,05	=	0,31
B7	1,10	X	0,50	=	0,55	X	0,05	=	0,03
B8	0,80	X	0,80	=	0,64	X	0,05	=	0,03
B9	1,70	X	1,30	=	2,21	X	0,05	=	0,11
B10	0,90	X	0,50	=	0,45	X	0,05	=	0,02
B11	2,90	X	1,20	=	3,48	X	0,05	=	0,17
B12	5,60	X	2,10	=	11,76	X	0,05	=	0,59
B13	1,70	X	1,30	=	2,21	X	0,05	=	0,11
B14	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,05	=	0,13
B15	1,70	X	1,20	=	2,04	X	0,05	=	0,10
B16	1,50	X	1,40	=	2,10	X	0,05	=	0,11
B17	1,40	X	1,40	=	1,96	X	0,05	=	0,10
B18	0,40	X	0,50	=	0,20	X	0,05	=	0,01
B19	1,40	X	0,80	=	1,12	X	0,05	=	0,06
B20	5,50	X	0,70	=	3,85	X	0,05	=	0,19
B21	1,90	X	0,90	=	1,71	X	0,05	=	0,09
B22	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,05	=	0,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes G Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 32	**LOCALIDADE:** AVENIDA LEANDRO BEZERRA	**BAIRRO:** SOCORRO	**PRANCHA:** 1/2
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** LONG.: 464504 LAT.: 9204058
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	

B23	2,30	X	1,30	=	2,99	X	0,05	=	0,15
B24	2,00	X	1,00	=	2,00	X	0,05	=	0,10
B25	2,00	X	0,70	=	1,40	X	0,05	=	0,07
B26	1,10	X	0,70	=	0,77	X	0,05	=	0,04
B27	1,40	X	0,60	=	0,84	X	0,05	=	0,04
B28	2,40	X	2,10	=	5,04	X	0,05	=	0,25
B29	0,80	X	0,60	=	0,48	X	0,05	=	0,02
			ÁREA	=				=	

AVENIDA LEANDRO BEZERRA



FINAL

RUA MONSENHOR JOVINIANO BARRETO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 32	**LOCALIDADE:** RUA LEANDRO BEZERRA	**BAIRRO:** SOCORRO	**PRANCHA:** 2/2
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	**LONG.:** 464504 **LAT.:** 9204058

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
32	AVENIDA LEANDRO BEZERRA	SOCORRO

TRECHO

ENTRE A AV. MONSENHOR JUVENIANO BARRETO E O ANEL VIARIO

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	20/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ÇAMENTO

ID:	32	AVENIDA LEANDRO BEZERRA				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	66,76	R$ 1,84	R$ 122,84
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	3,34	R$ 1.696,15	R$ 5.661,75
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/ TRANSP)	M2	66,76	R$ 0,33	R$ 22,03
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,03	R$ 3.062,93	R$ 81,79
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,51	R$ 472,85	R$ 240,86
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	8,55	R$ 30,12	R$ 257,67
					TOTAL	R$ 6.386,94

MAPA DE SITUAÇÃO

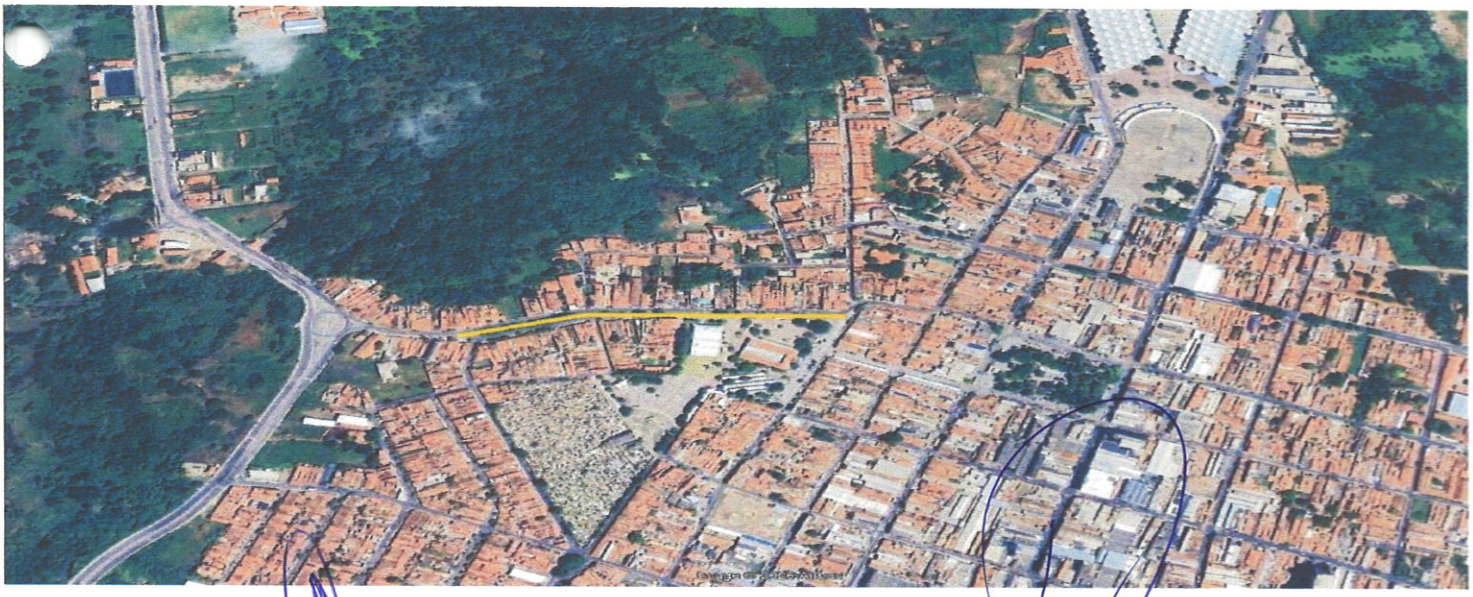

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 14979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - ANTES

FOTO 10 - ANTES

FOTO 11 - ANTES

FOTO 12 - ANTES

FOTO 13 - ANTES

FOTO 14 - ANTES

FOTO 15 - ANTES

FOTO 16 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44978/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 17 - ANTES

FOTO 18 - ANTES

FOTO 19 - ANTES

FOTO 20 - ANTES

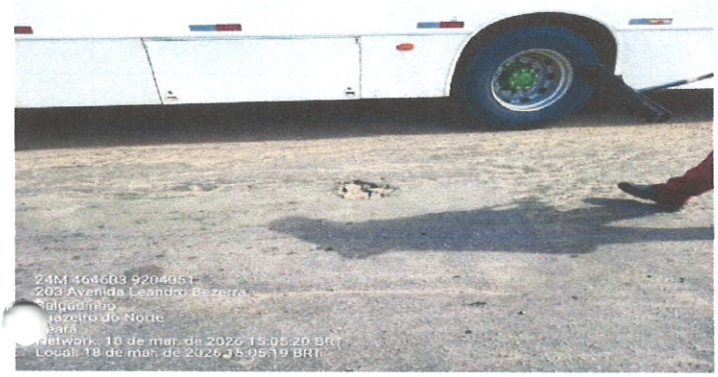

FOTO 21 - ANTES

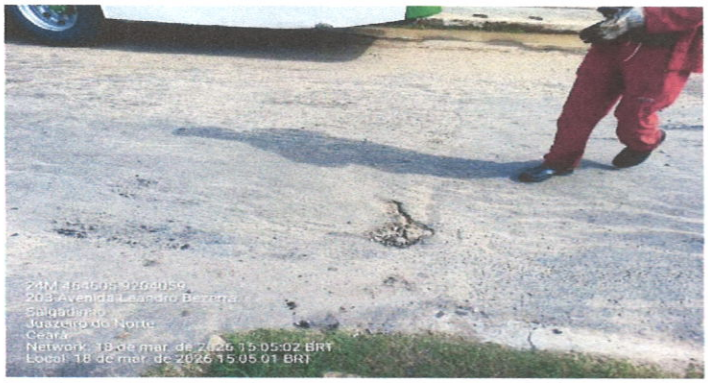

FOTO 22 - ANTES

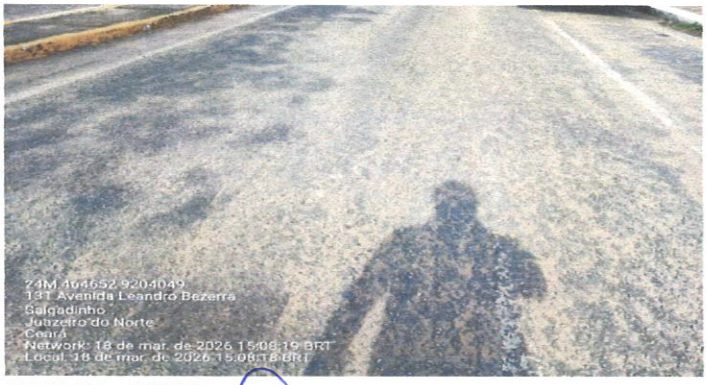

FOTO 23 - ANTES

FOTO 24 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 25 - ANTES

FOTO 26 - B1

FOTO 27 - B2

FOTO 28 - B3 E B4

FOTO 29 - B5

FOTO 30 - B6

FOTO 31 - B7, B8 E B10

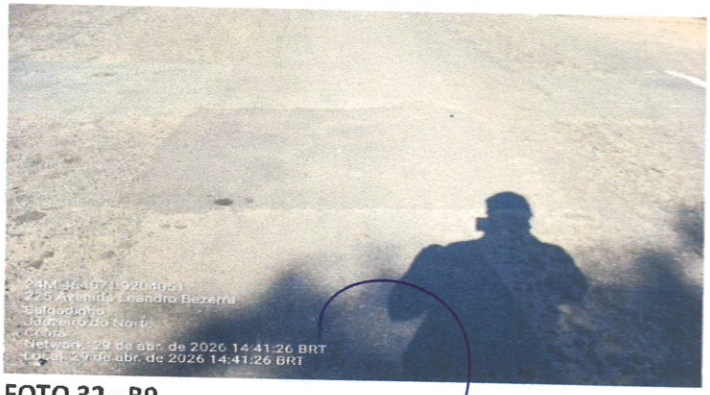

FOTO 32 - B9

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 33 - B11

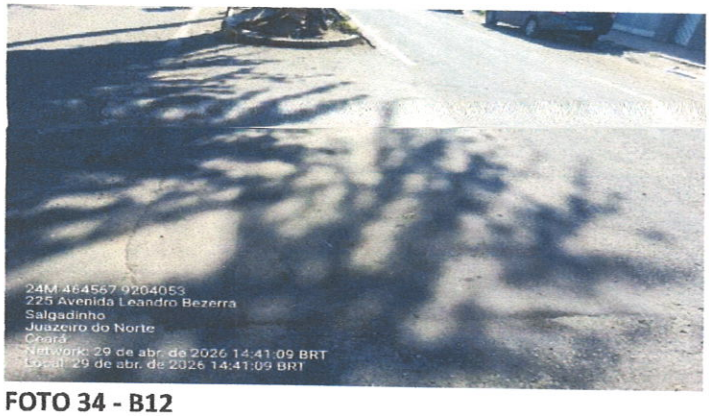

FOTO 34 - B12

FOTO 35 - B13 E B14

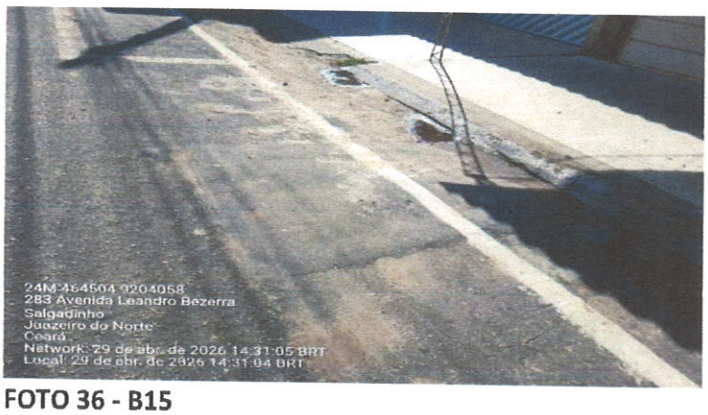

FOTO 36 - B15

FOTO 37 - B16 E B17

FOTO 38 - B18

FOTO 39 - B19

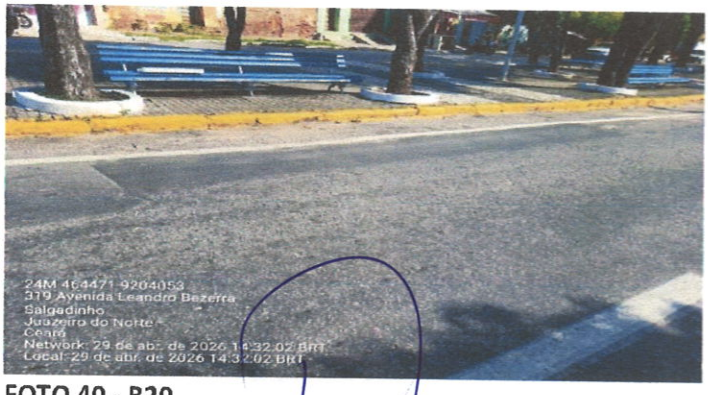

FOTO 40 - B20

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

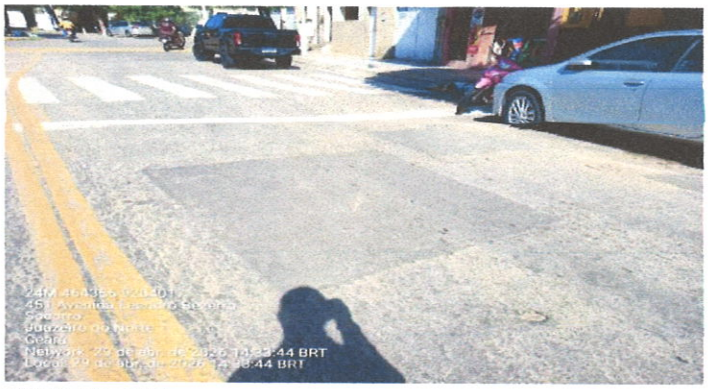

FOTO 41 - B21

FOTO 42 - B22

FOTO 43 - B23

FOTO 44 - B24

FOTO 45 - B25 A B27

FOTO 46 - B28

FOTO 47 - B29

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 18.03.2026-05	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA PADRE ANTÔNIO ALMEIDA AGRA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 18 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

RUA ODETE MATOS DE ALENCAR

RUA PADRE ANTÔNIO ALMEIDA AGRA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA:
140,00m X 8,45m X 0,05m

RUA GENÁRIO DE OLIVEIRA

RUA ARNÓBIO BARCELAR CANECA

B1	140,00	X	8,45	=	1183,00	X	0,05	=	59,15
			ÁREA	=	**1183,00**		**VOLUME**	=	**59,15**

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 33	**LOCALIDADE:** RUA PADRE ANTONIO ALMEIDA AGRA	**BAIRRO:** LAGOA SECA	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 464193 **LAT.:** 9198438
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID
33

ENDEREÇO
RUA PADRE ANTÔNIO ALMEIDA AGRA

BAIRRO
LAGOA SECA

TRECHO
ENTRE A RUA ODETE MATOS E A RUA ARNOBIO BACELAR CANECA

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO
HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO
20/03/2026

EMPRESA EXECUTORA
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO
N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	33	RUA PADRE ANTÔNIO ALMEIDA AGRA						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I		P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1183,00	R$	1,84	R$	2.176,72
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM						
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	59,15	R$	1.696,15	R$	100.327,27
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/ TRANSP)	M2	1183,00	R$	0,33	R$	390,39
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,47	R$	3.062,93	R$	1.449,38
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	9,03	R$	472,85	R$	4.268,13
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	151,59	R$	30,12	R$	4.565,88
						TOTAL	R$	113.177,77

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

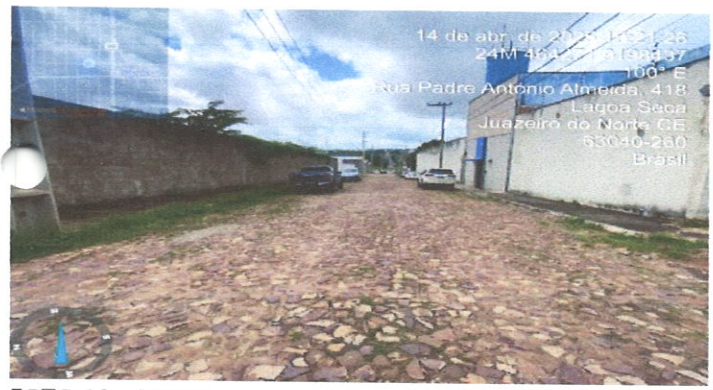

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - DEPOIS (1)

FOTO 06 - DEPOIS (2)

FOTO 07 - DEPOIS (3)

FOTO 08 - DEPOIS (4)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - DEPOIS (5)

FOTO 10 - DEPOIS (6)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 20.03.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 20 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



B1	2,40	X	2,40	=	5,76	X	0,05	=	0,29
B2	3,10	X	1,50	=	4,65	X	0,05	=	0,23
B3	1,70	X	1,70	=	2,89	X	0,05	=	0,14
B4	5,80	X	2,30	=	13,34	X	0,05	=	0,67
B5	1,10	X	1,40	=	1,54	X	0,05	=	0,08
B6	1,30	X	1,40	=	1,82	X	0,05	=	0,09
B7	5,00	X	2,80	=	14,00	X	0,05	=	0,70
B8	1,40	X	0,80	=	1,12	X	0,05	=	0,06
B9	2,90	X	1,30	=	3,77	X	0,05	=	0,19
B10	1,50	X	1,50	=	2,25	X	0,05	=	0,11
B11	3,70	X	2,60	=	9,62	X	0,05	=	0,48
B12	1,90	X	1,20	=	2,28	X	0,05	=	0,11
B13	5,00	X	2,10	=	10,50	X	0,05	=	0,53
B14	3,20	X	2,10	=	6,72	X	0,05	=	0,34
			ÁREA	=	80,26		VOLUME	=	4,01

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 34	**LOCALIDADE:** AVENIDA ANTONIO PEREIRA DA SILVA	**BAIRRO:** JOSÉ GERALDO DA CRUZ	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 466076 **LAT.:** 9201166
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID: 34

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA

BAIRRO: JOSE GERALDO DA CRUZ

TRECHO: ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM

DATA MEDIÇÃO: 20/03/2026

EMPRESA EXECUTORA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO: N° 2025.09.02-0002

ÇAMENTO

ID:	34	AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	80,26	R$ 1,84	R$ 147,68
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	4,01	R$ 1.696,15	R$ 6.806,65
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/ TRANSP)	M2	80,26	R$ 0,33	R$ 26,49
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,03	R$ 3.062,93	R$ 98,33
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,61	R$ 472,85	R$ 289,57
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	10,28	R$ 30,12	R$ 309,77
					TOTAL	R$ 7.678,49

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

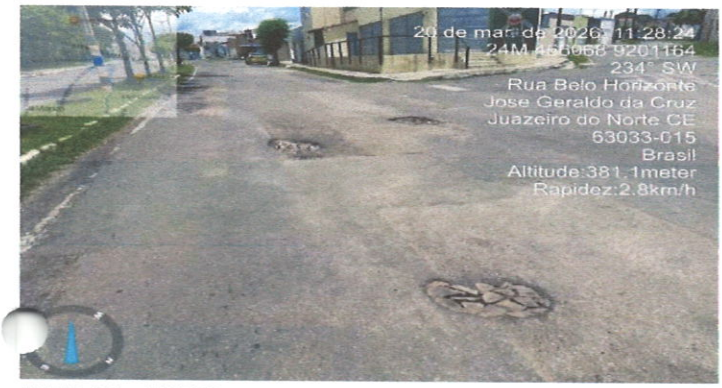

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

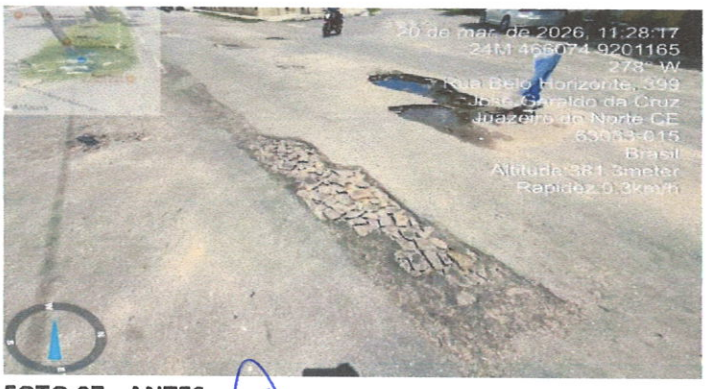

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

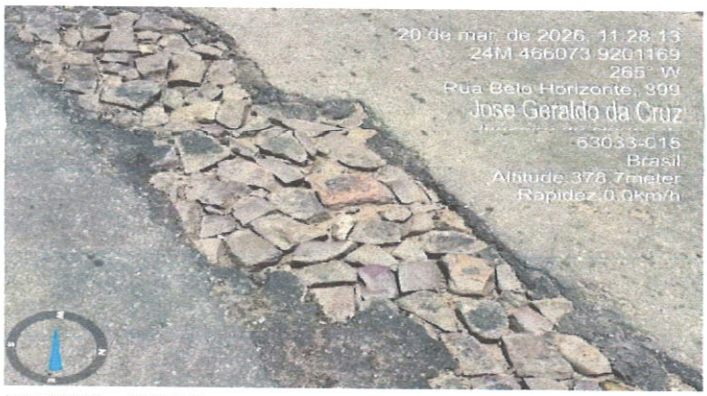

FOTO 09 - ANTES

FOTO 10 - B1 A B3

FOTO 11 - B4 A B5

FOTO 12 - B6 A B12

FOTO 13 - B13

FOTO 14 - B14

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodoviaria Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 20.03.2026-02	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA SANTO AGOSTINHO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 20 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

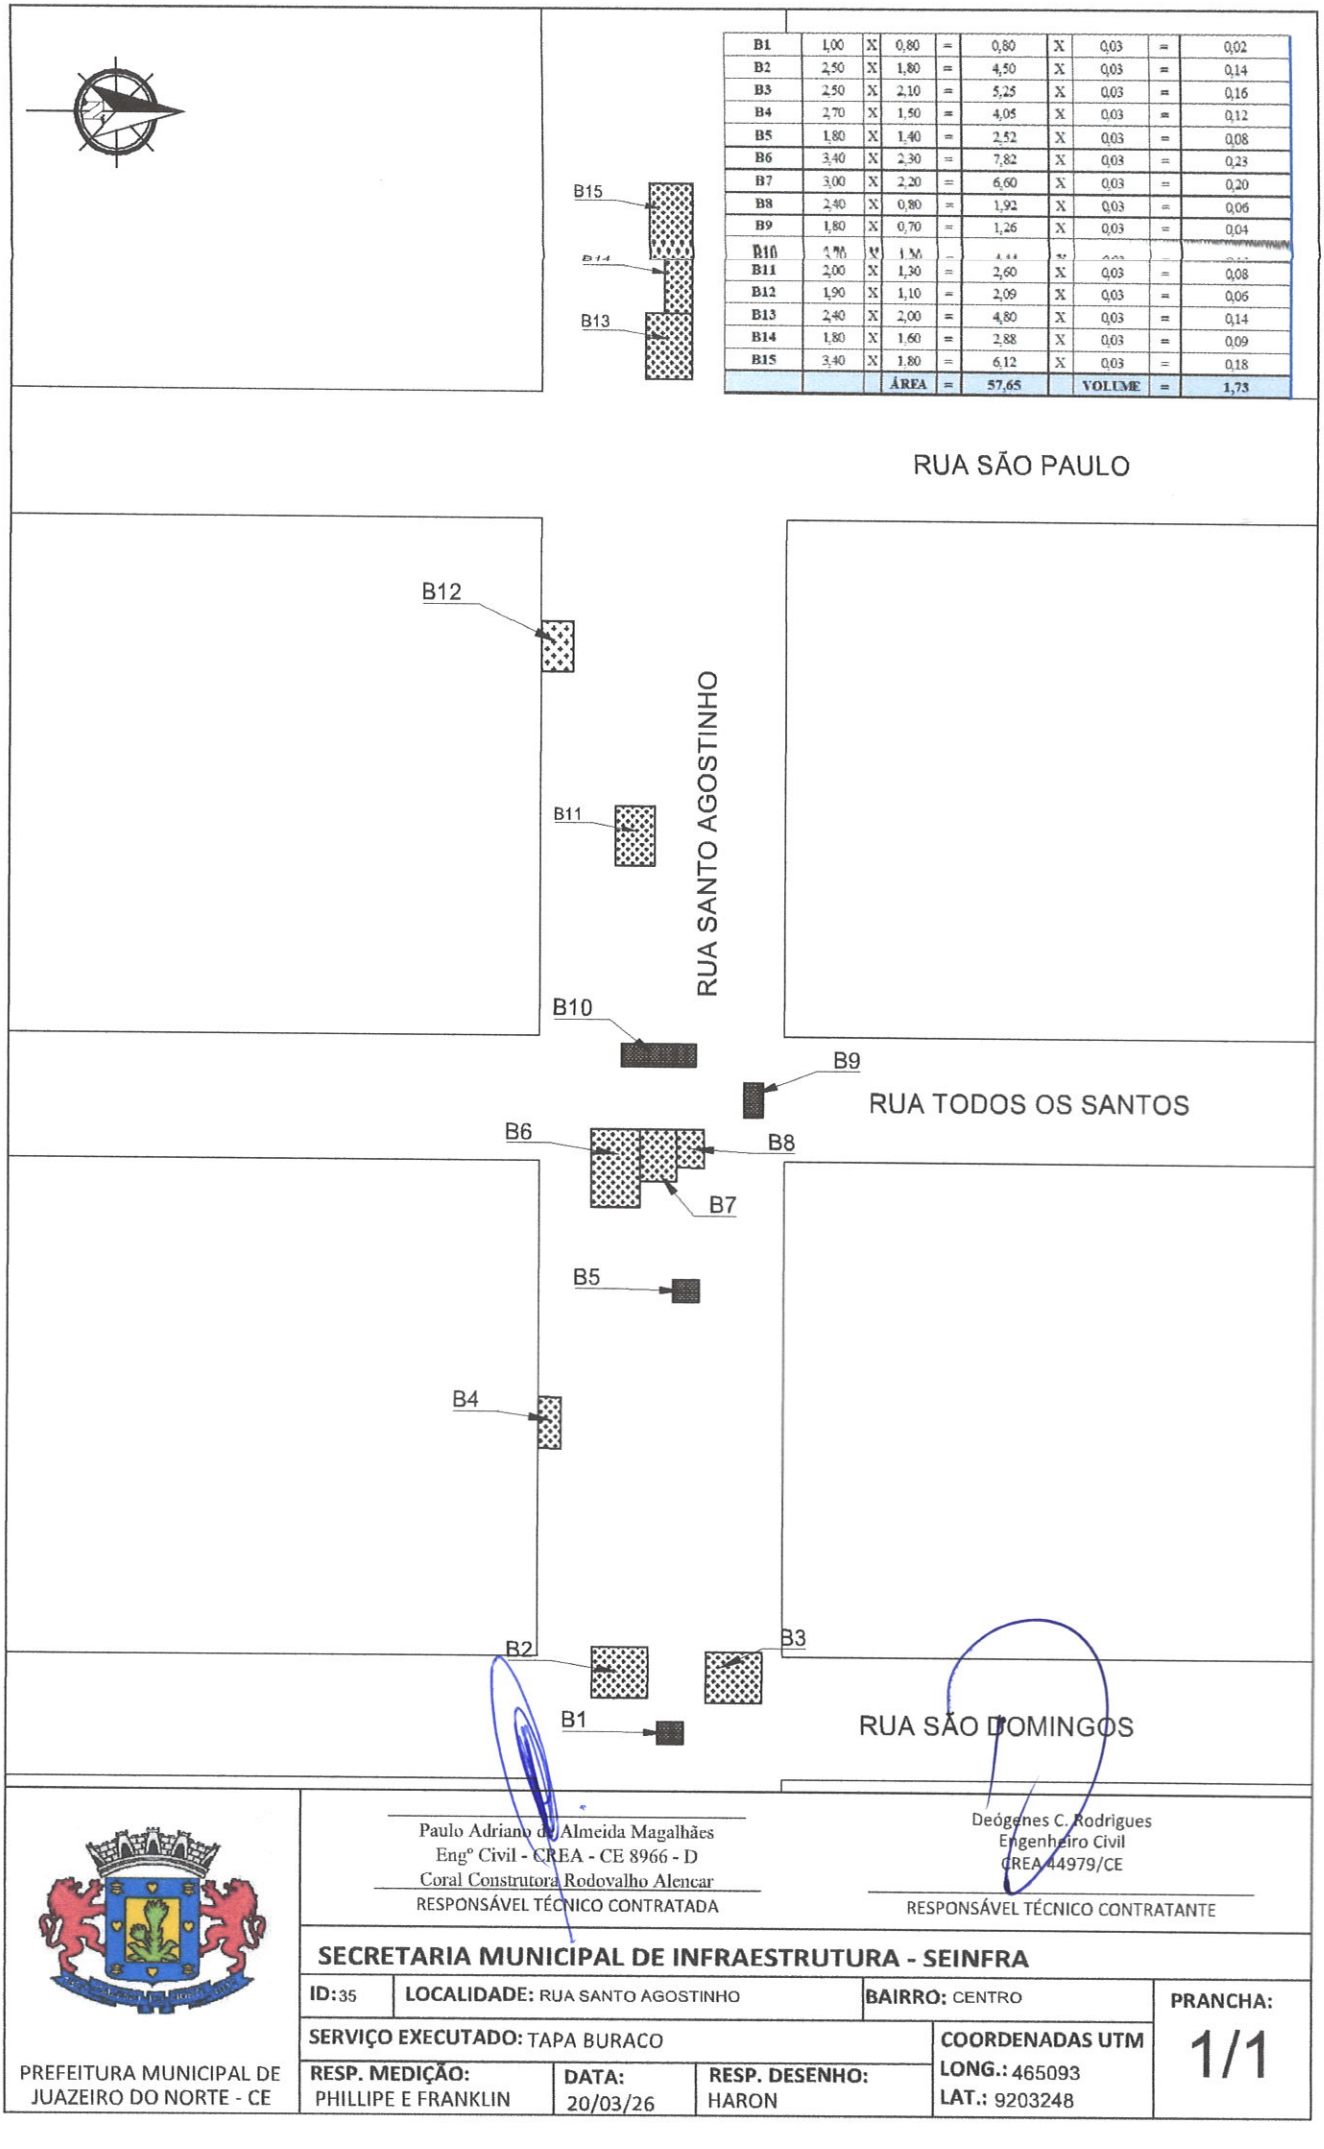

B1	1,00	X	0,80	=	0,80	X	0,03	=	0,02
B2	2,50	X	1,80	=	4,50	X	0,03	=	0,14
B3	2,50	X	2,10	=	5,25	X	0,03	=	0,16
B4	2,70	X	1,50	=	4,05	X	0,03	=	0,12
B5	1,80	X	1,40	=	2,52	X	0,03	=	0,08
B6	3,40	X	2,30	=	7,82	X	0,03	=	0,23
B7	3,00	X	2,20	=	6,60	X	0,03	=	0,20
B8	2,40	X	0,80	=	1,92	X	0,03	=	0,06
B9	1,80	X	0,70	=	1,26	X	0,03	=	0,04
B10	1,70	X	1,30	=	4,41	X	0,03	=	0,13
B11	2,00	X	1,30	=	2,60	X	0,03	=	0,08
B12	1,90	X	1,10	=	2,09	X	0,03	=	0,06
B13	2,40	X	2,00	=	4,80	X	0,03	=	0,14
B14	1,80	X	1,60	=	2,88	X	0,03	=	0,09
B15	3,40	X	1,80	=	6,12	X	0,03	=	0,18
			ÁREA	=	57,65		VOLUME	=	1,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 35	**LOCALIDADE:** RUA SANTO AGOSTINHO	**BAIRRO:** CENTRO	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 20/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON	**LONG.:** 465093 **LAT.:** 9203248

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID: 35

ENDEREÇO: RUA SANTO AGOSTINHO

BAIRRO: CENTRO

TRECHO: ENTRE A RUA SÃO DOMINGOS E A RUA SÃO PAULO

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM

DATA MEDIÇÃO: 20/03/2026

EMPRESA EXECUTORA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO: N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	35	RUA SANTO AGOSTINHO				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	57,65	R$ 1,84	R$ 106,08
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	1,73	R$ 1.696,15	R$ 2.933,49
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S TRANSP)	M2	57,65	R$ 0,33	R$ 19,02
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,02	R$ 3.062,93	R$ 70,63
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,27	R$ 472,85	R$ 129,16
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	4,44	R$ 30,12	R$ 133,78
					TOTAL	R$ 3.392,16

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

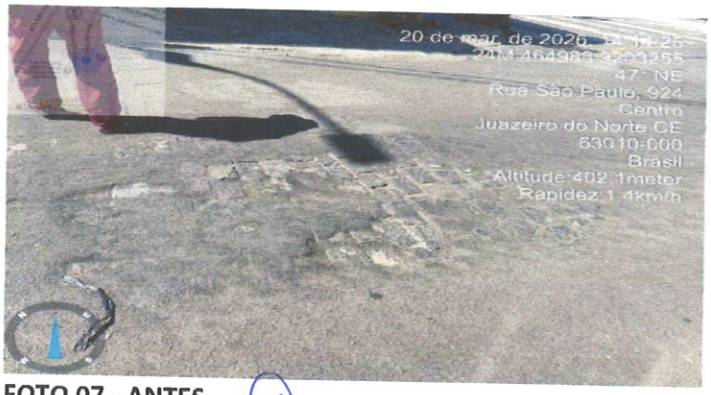

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - B1 A B3

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - B4

FOTO 10 - B5 A B9

FOTO 11 - B10

FOTO 12 - B11 E B12

FOTO 13 - B13 A B15

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 23.03.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RODOVIA MIGUEL HOMEM.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 23 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

RUA JOSÉ NERY ROCHA

B15

B14

B13

B12

B11

B10

B9

RODOVIA MIGUEL HOMEM DA COSTA

B1	3,50	X	2,40	=	8,40	X	0,08	=	0,67
B2	3,20	X	3,00	=	9,60	X	0,08	=	0,77
B3	2,80	X	1,90	=	5,32	X	0,08	=	0,43
B4	1,60	X	1,40	=	2,24	X	0,08	=	0,18
B5	2,30	X	1,70	=	3,91	X	0,08	=	0,31
B6	2,60	X	0,90	=	2,34	X	0,08	=	0,19
B7	2,10	X	1,80	=	3,78	X	0,08	=	0,30
B8	1,90	X	1,60	=	3,04	X	0,08	=	0,24
B9	4,10	X	2,70	=	11,07	X	0,08	=	0,89
B10	4,70	X	3,30	=	15,51	X	0,08	=	1,24
B11	3,30	X	2,20	=	7,26	X	0,08	=	0,58
B12	4,90	X	4,60	=	22,54	X	0,08	=	1,80
B13	3,80	X	2,60	=	9,88	X	0,08	=	0,79
B14	3,70	X	2,40	=	8,88	X	0,08	=	0,71
B15	0,90	X	0,80	=	0,72	X	0,08	=	0,06

OBS.: UTILIZADO SOLO BRITA COM ESPESSURA DE 10cm

B8

B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

CE 060

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 36	**LOCALIDADE:** RODOVIA MIGUEL HOMEM DA COSTA	**BAIRRO:** VILA TRÊS MARIA	**PRANCHA:** 1/5
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO		**COORDENADAS UTM**	
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 23/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON	**LONG.:** 465789 **LAT.:** 9206259

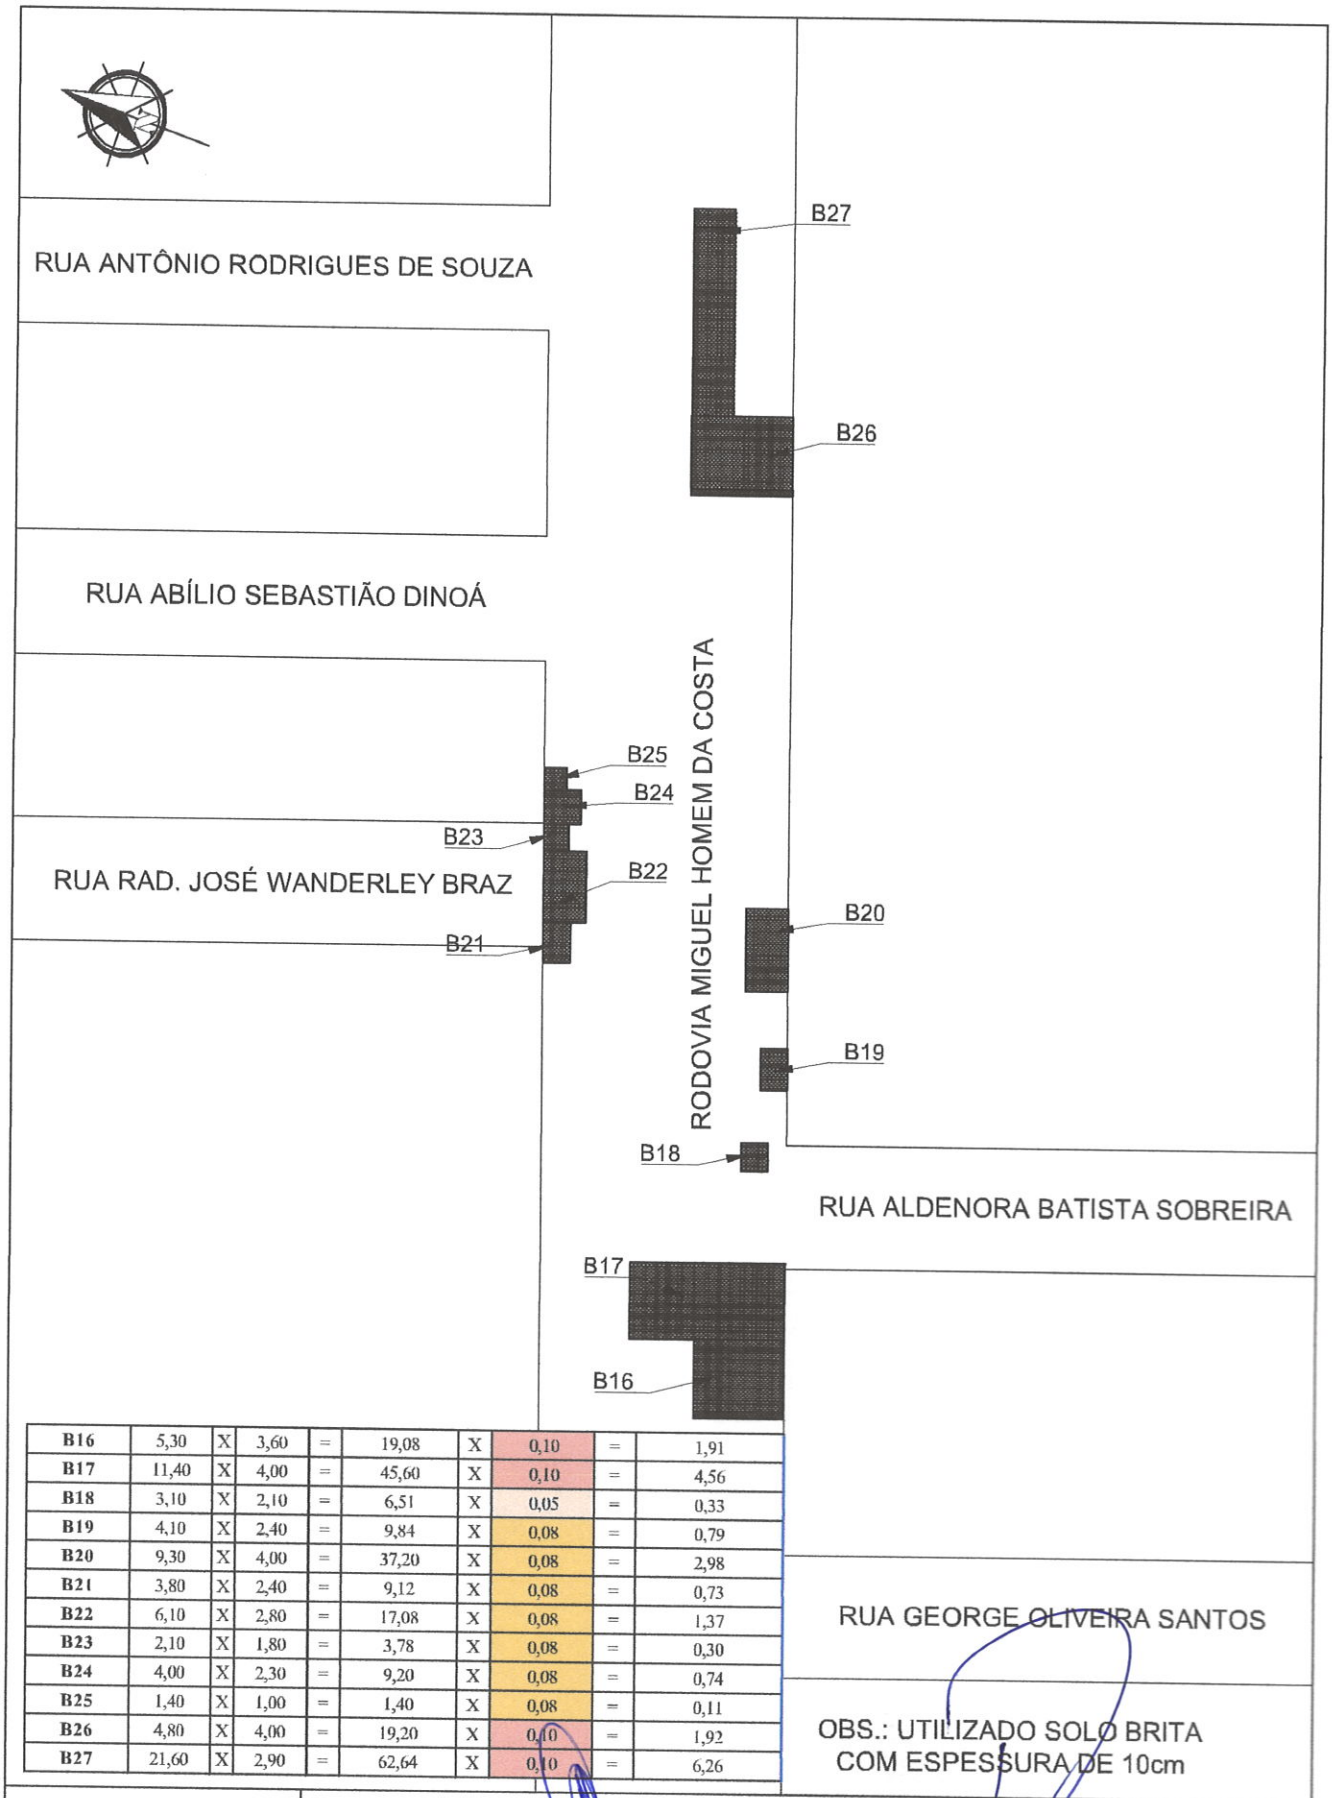

B16	5,30	X	3,60	=	19,08	X	0,10	=	1,91
B17	11,40	X	4,00	=	45,60	X	0,10	=	4,56
B18	3,10	X	2,10	=	6,51	X	0,05	=	0,33
B19	4,10	X	2,40	=	9,84	X	0,08	=	0,79
B20	9,30	X	4,00	=	37,20	X	0,08	=	2,98
B21	3,80	X	2,40	=	9,12	X	0,08	=	0,73
B22	6,10	X	2,80	=	17,08	X	0,08	=	1,37
B23	2,10	X	1,80	=	3,78	X	0,08	=	0,30
B24	4,00	X	2,30	=	9,20	X	0,08	=	0,74
B25	1,40	X	1,00	=	1,40	X	0,08	=	0,11
B26	4,80	X	4,00	=	19,20	X	0,10	=	1,92
B27	21,60	X	2,90	=	62,64	X	0,10	=	6,26

OBS.: UTILIZADO SOLO BRITA COM ESPESSURA DE 10cm

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 36	**LOCALIDADE:** RODOVIA MIGUEL HOMEM DA COSTA	**BAIRRO:** VILA TRÊS MARIA	**PRANCHA:** 2/5
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465789 **LAT.:** 9206259
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 24/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON	

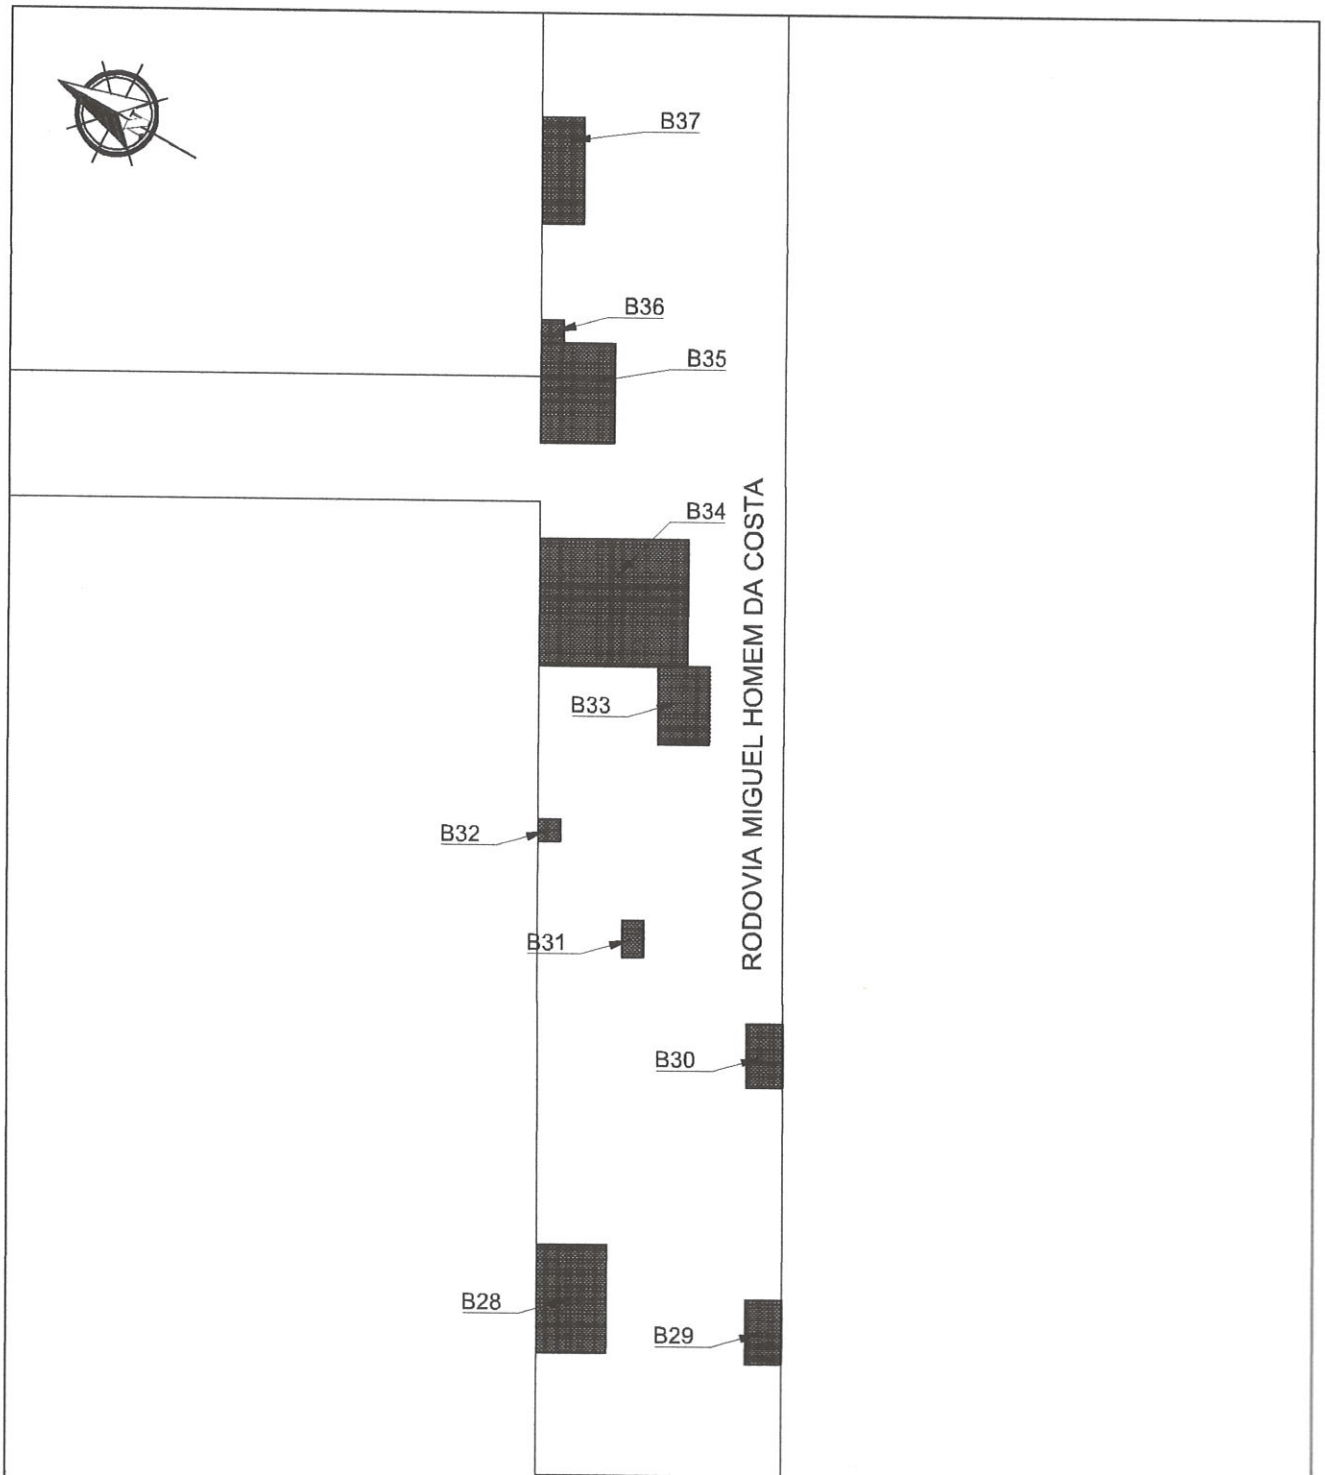

B28	4,20	X	3,00	=	12,60	X	0,10	=	1,26
B29	3,30	X	2,50	=	8,25	X	0,10	=	0,83
B30	3,80	X	2,90	=	11,02	X	0,10	=	1,10
B31	2,10	X	1,30	=	2,73	X	0,05	=	0,14
B32	1,50	X	1,40	=	2,10	X	0,05	=	0,11
B33	4,60	X	3,50	=	16,10	X	0,10	=	1,61
B34	5,90	X	5,60	=	33,04	X	0,10	=	3,30
B35	5,10	X	3,60	=	18,36	X	0,10	=	1,84
B36	1,40	X	1,70	=	2,38	X	0,10	=	0,24
B37	5,70	X	3,30	=	18,81	X	0,10	=	1,88

RUA ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA

OBS.: UTILIZADO SOLO BRITA COM ESPESSURA DE 10cm

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 36	**LOCALIDADE:** RODOVIA MIGUEL HOMEM DA COSTA	**BAIRRO:** VILA TRÊS MARIA	**PRANCHA:** 3/5
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465789 **LAT.:** 9206259
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 25/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON	

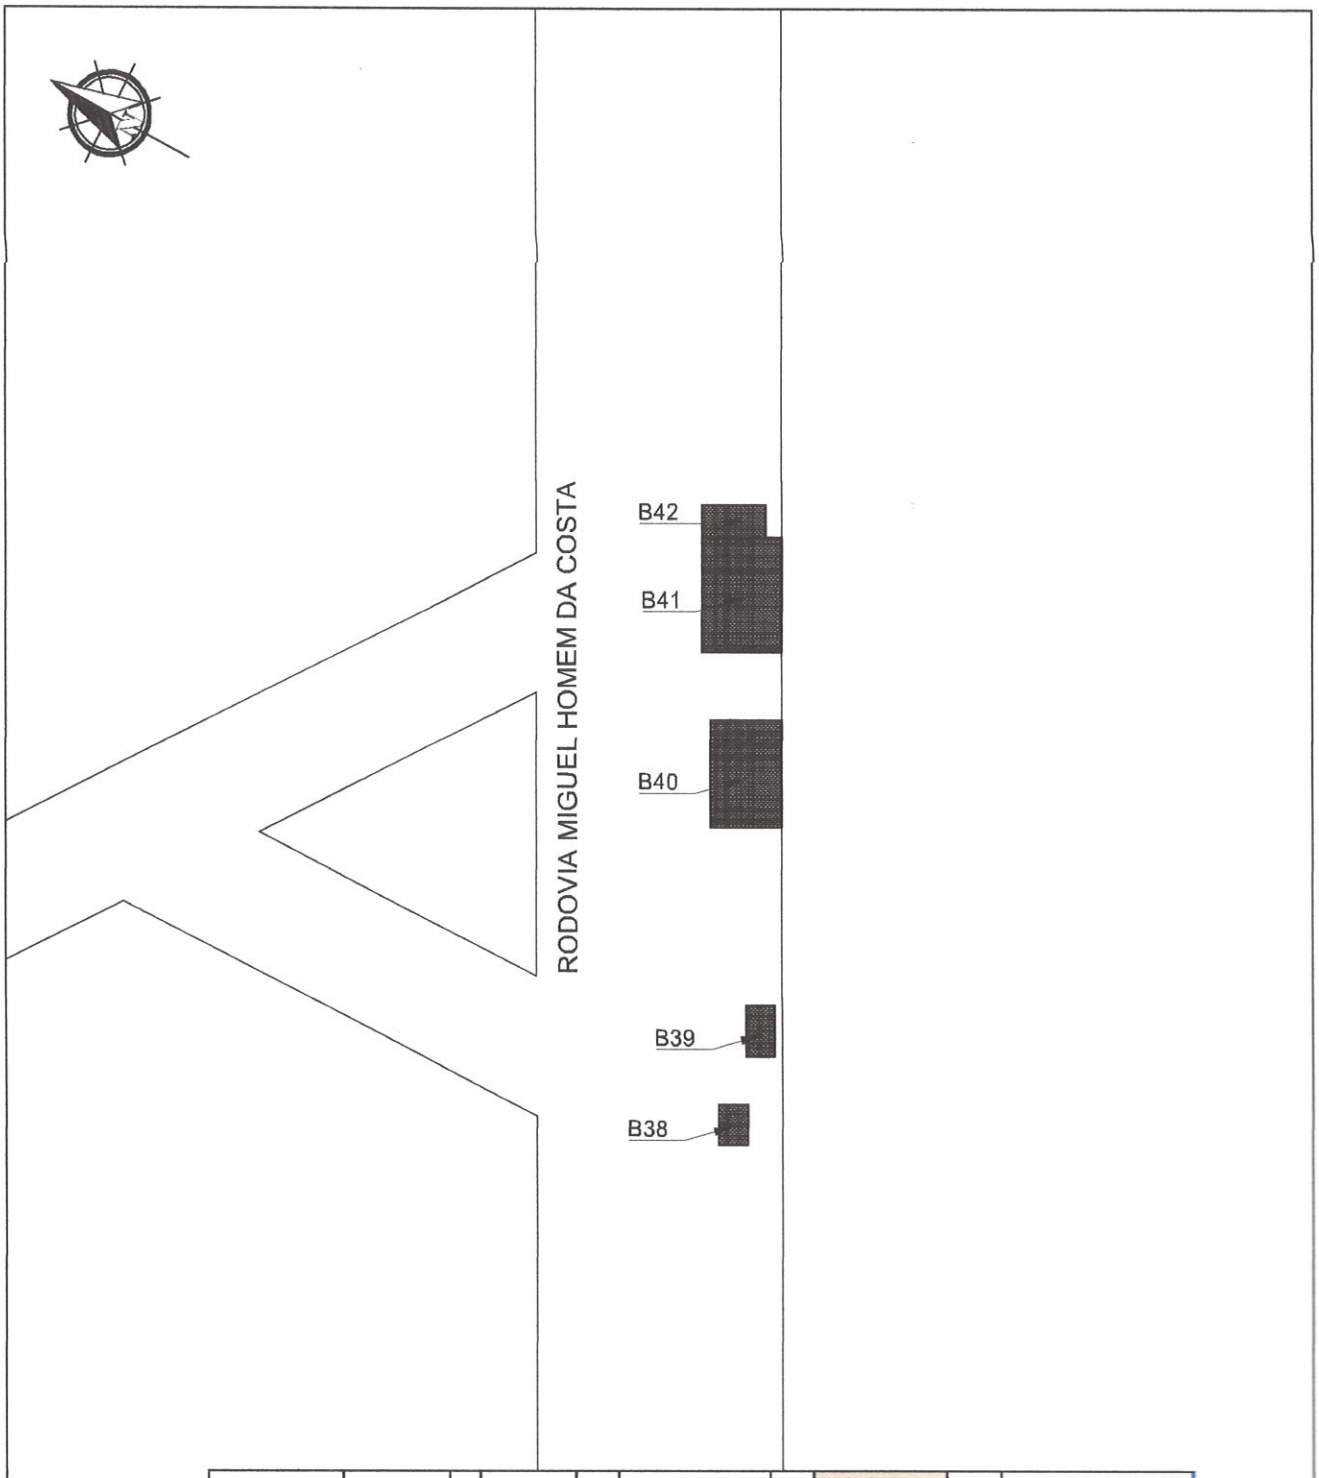

B38	1,70	X	1,60	=	2,72	X	0,05	=	0,14
B39	2,30	X	2,20	=	5,06	X	0,05	=	0,25
B40	9,80	X	3,40	=	33,32	X	0,10	=	3,33
B41	10,00	X	4,00	=	40,00	X	0,10	=	4,00
B42	3,80	X	1,50	=	5,70	X	0,10	=	0,57

OBS.: UTILIZADO SOLO BRITA COM ESPESSURA DE 10cm

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engª Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 36	**LOCALIDADE:** RODOVIA MIGUEL HOMEM DA COSTA		**BAIRRO:** VILA TRÊS MARIA	**PRANCHA:** 4/5
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO				**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 465789 **LAT.:** 9206259
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 25/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON		

B43

RODOVIA MIGUEL HOMEM DA COSTA

OBS.: UTILIZADO SOLO BRITA COM ESPESSURA DE 10cm

B43	14,20	X	7,10	=	100,82	X	0,10	=	10,08
			ÁREA	=	**668,15**		**VOLUME**	=	**61,82**

AV. ZECA MARQUES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 36	**LOCALIDADE:** RODOVIA MIGUEL HOMEM DA COSTA		**BAIRRO:** VILA TRÊS MARIA	**PRANCHA:** 5/5
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO				**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 31/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON		**LONG.:** 465789 **LAT.:** 9206259

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
36	RODOVIA MIGUEL HOMEM	ROMEIRO AURELIANO PEREIRA

TRECHO

ENTRE A CE-060 E O RESIDENCIAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	23/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	36	RODOVIA MIGUEL HOMEM						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I		P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	668,15	R$	1,84	R$	1.229,40
1.10	C3134	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/ TRANSP)	M3	66,82	R$	71,18	R$	4.755,89
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	66,82	R$	41,23	R$	2.754,78
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM						
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	61,82	R$	1.696,15	R$	104.850,57
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/ TRANSP)	M2	668,15	R$	0,33	R$	220,49
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,27	R$	3.062,93	R$	818,60
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	9,21	R$	472,85	R$	4.353,09
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	158,20	R$	30,12	R$	4.764,89
						TOTAL	R$	123.747,71

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

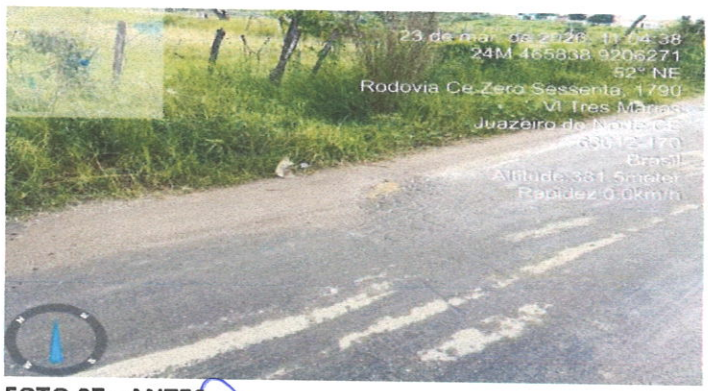

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - ANTES

FOTO 10 - ANTES

FOTO 11 - ANTES

FOTO 12 - ANTES

FOTO 13 - ANTES

FOTO 14 - ANTES

FOTO 15 - ANTES

FOTO 16 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 17 - ANTES

FOTO 18 - ANTES

FOTO 19 - EXECUTADO - B1 E B2

FOTO 20 - EXECUTADO - B3 E B4

FOTO 21 - EXECUTADO - B5 A B7

FOTO 22 - EXECUTADO - B8

FOTO 23 - EXECUTADO - B9 A B13

FOTO 24 - EXECUTADO - B14 E B15

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 25 - EXECUTADO - B16 E B17

FOTO 26 - EXECUTADO - B18

FOTO 27 - EXECUTADO - B19

FOTO 28 - EXECUTADO - B20

FOTO 29 - EXECUTADO - B21 A B25

FOTO 30 - EXECUTADO - B26 E B27

FOTO 31 - EXECUTADO - B28

FOTO 32 - EXECUTADO - B29

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 33 - EXECUTADO - B30

FOTO 34 - EXECUTADO - B31

FOTO 35 - EXECUTADO - B32

FOTO 36 - EXECUTADO - B33 E B34

FOTO 37 - EXECUTADO - B35 A B37

FOTO 38 - EXECUTADO - B38 E B39

FOTO 39 - EXECUTADO - B40

FOTO 40 - EXECUTADO - B41 E B42

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engª Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 41 - EXECUTADO - B43

FOTO 42 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (1)

FOTO 43 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (2)

FOTO 44 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (3)

FOTO 45 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (4)

FOTO 46 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (5)

FOTO 47 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (6)

FOTO 48 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (7)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 49 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (8)

FOTO 50 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (9)

FOTO 51 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (10)

FOTO 52 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (11)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 23.03.2026-02	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA SANTA CECÍLIA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 23 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

RUA SANTA LUZIA

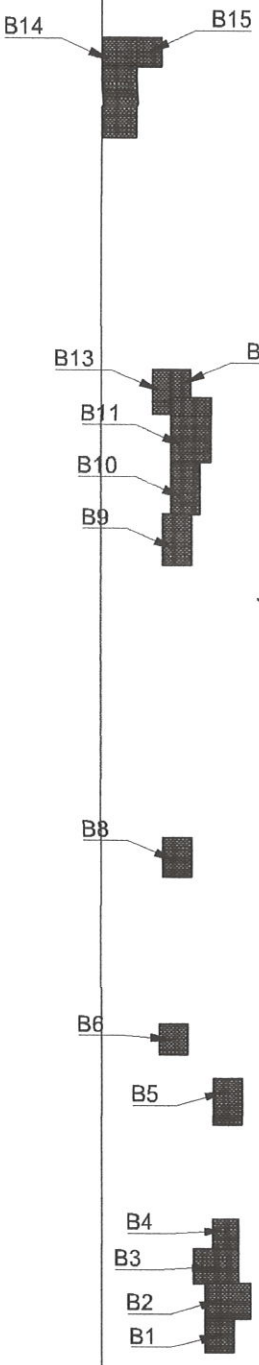

B1	1,30	X	1,10	=	1,43	X	0,03	=	0,04
B2	2,00	X	1,80	=	3,60	X	0,03	=	0,11
B3	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,03	=	0,05
B4	1,30	X	1,00	=	1,30	X	0,03	=	0,04
B5	2,50	X	1,50	=	3,75	X	0,03	=	0,11
B6	1,20	X	1,10	=	1,32	X	0,03	=	0,04
B7	1,70	X	1,30	=	2,21	X	0,03	=	0,07
B8	1,60	X	1,10	=	1,76	X	0,03	=	0,05
B9	2,30	X	1,00	=	2,30	X	0,03	=	0,07
B10	2,40	X	0,90	=	2,16	X	0,03	=	0,06
B11	2,30	X	2,00	=	4,60	X	0,03	=	0,14
B12	0,70	X	0,60	=	0,42	X	0,03	=	0,01
B13	1,70	X	0,70	=	1,19	X	0,03	=	0,04
B14	5,10	X	1,80	=	9,18	X	0,03	=	0,28
B15	1,00	X	0,80	=	0,80	X	0,03	=	0,02
B16	1,10	X	0,70	=	0,77	X	0,03	=	0,02
			ÁREA	=	38,61		VOLUME	=	1,16

RUA ALENCAR PEIXOTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 37	**LOCALIDADE:** RUA SANTA CECÍLIA	**BAIRRO:** SOCORRO	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 464542 **LAT.:** 9203786
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 23/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
37	RUA SANTA CECÍLIA	SOCORRO

TRECHO

ENTRE A RUA ALENCAR PEIXTO E A RUA SANTA LUZIA

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO

PHILIPPE E FRANKLIM

DATA MEDIÇÃO

23/03/2026

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	37	RUA SANTA CECÍLIA				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	38,61	R$ 1,84	R$ 71,04
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	1,16	R$ 1.696,15	R$ 1.964,65
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/ TRANSP)	M2	38,61	R$ 0,33	R$ 12,74
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,02	R$ 3.062,93	R$ 47,30
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,18	R$ 472,85	R$ 86,50
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	2,97	R$ 30,12	R$ 89,60
					TOTAL	R$ 2.271,83

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

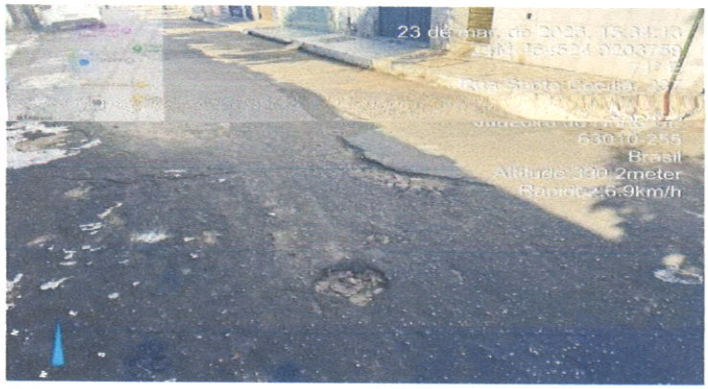

FOTO 02 - ANTES

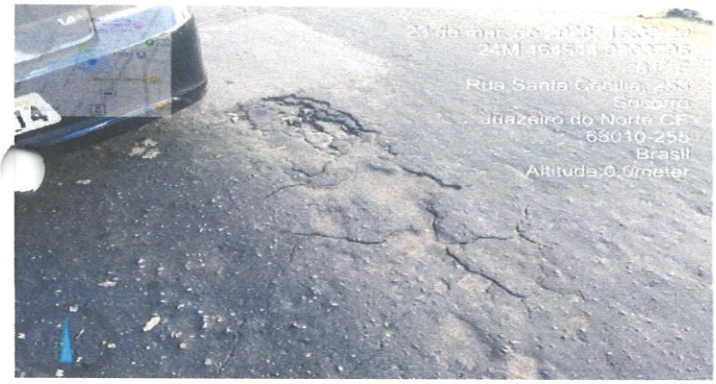

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - B1 A B4

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - B5 E B6

FOTO 10 - B7

FOTO 11 - B8

FOTO 12 - B9

FOTO 13 - B10 E B11

FOTO 14 - B12 E B13

FOTO 15 - B14 E B15

FOTO 16 - B16

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 23.03.2026-03	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 23 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

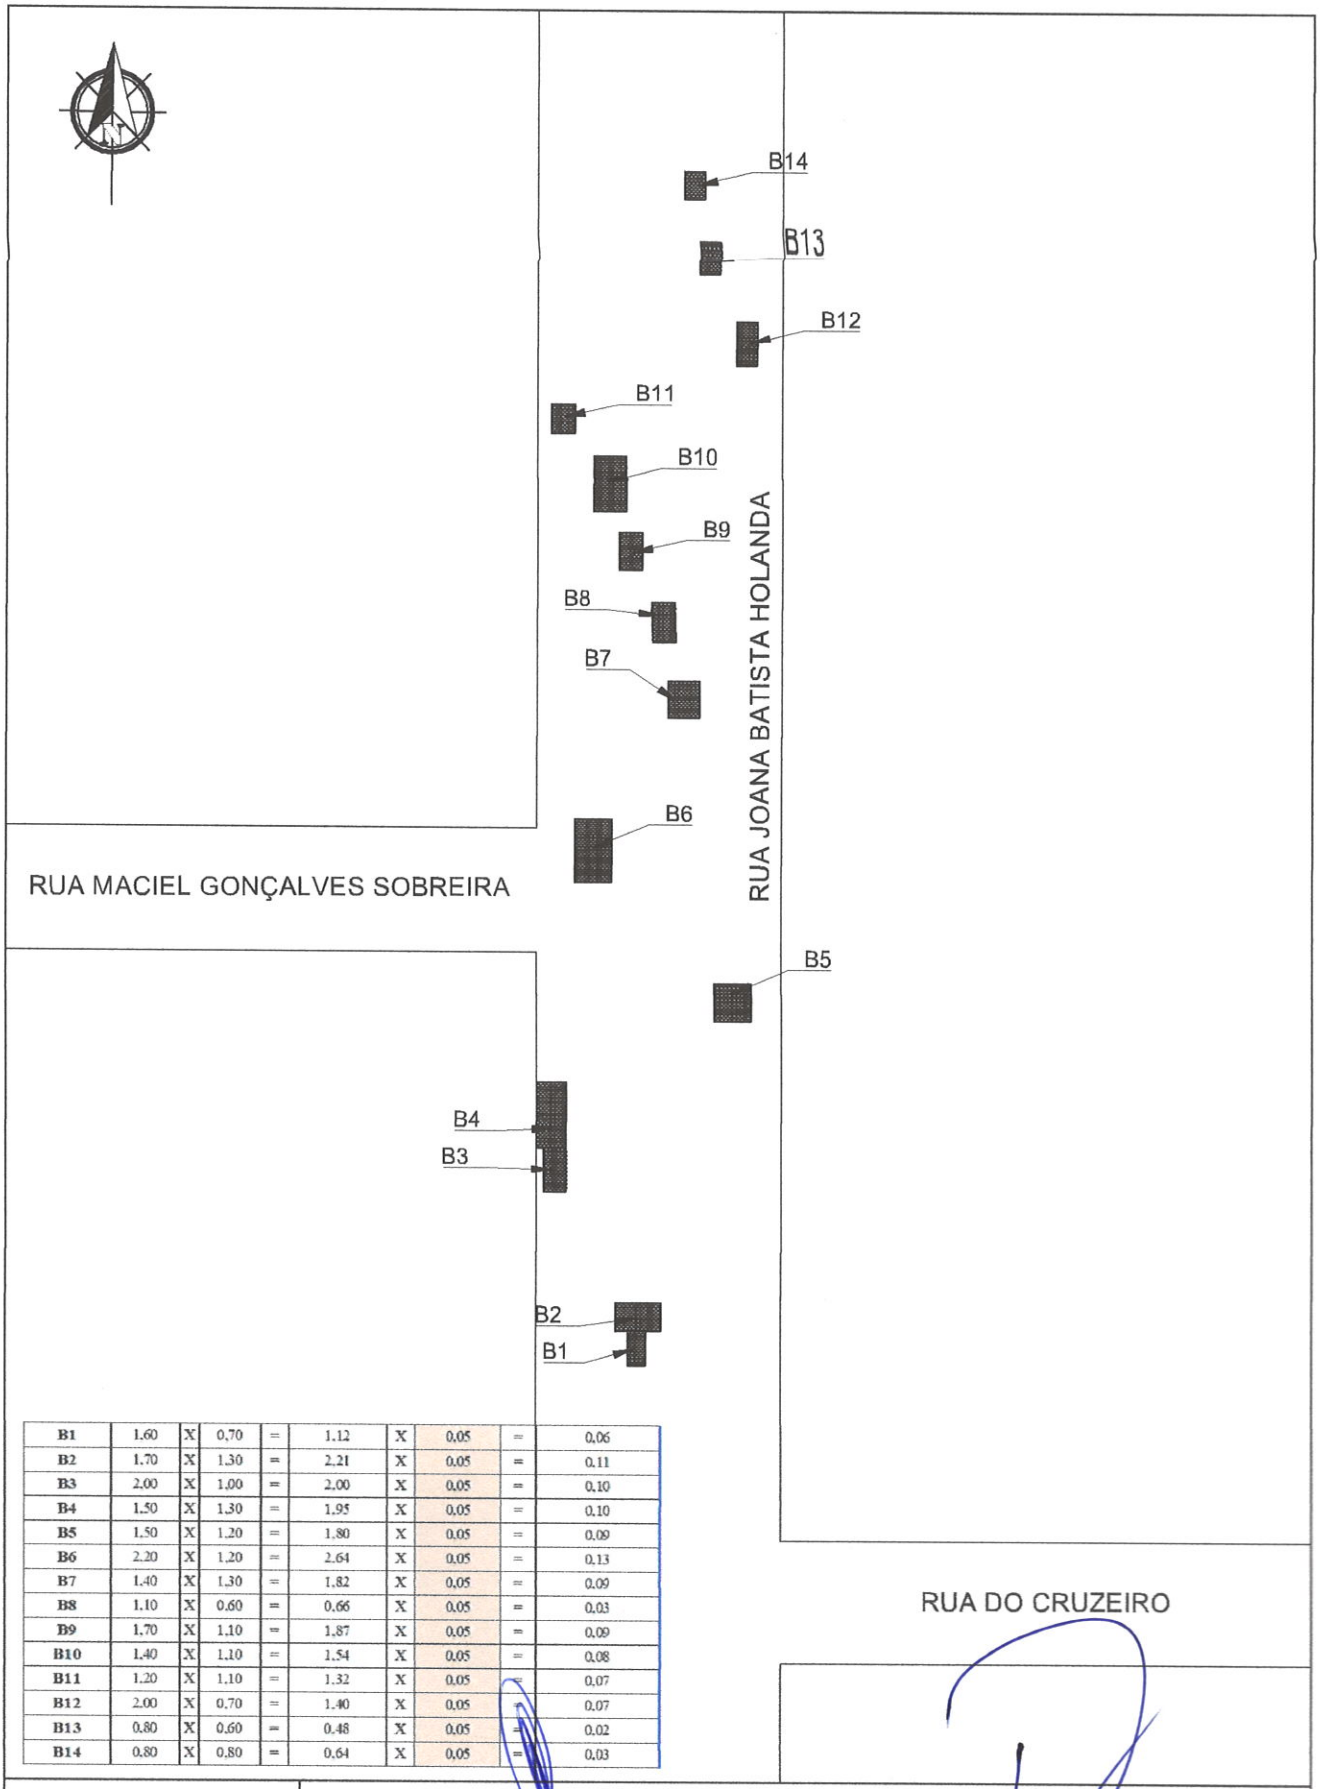

B1	1.60	X	0.70	=	1.12	X	0.05	= 0.06
B2	1.70	X	1.30	=	2.21	X	0.05	= 0.11
B3	2.00	X	1.00	=	2.00	X	0.05	= 0.10
B4	1.50	X	1.30	=	1.95	X	0.05	= 0.10
B5	1.50	X	1.20	=	1.80	X	0.05	= 0.09
B6	2.20	X	1.20	=	2.64	X	0.05	= 0.13
B7	1.40	X	1.30	=	1.82	X	0.05	= 0.09
B8	1.10	X	0.60	=	0.66	X	0.05	= 0.03
B9	1.70	X	1.10	=	1.87	X	0.05	= 0.09
B10	1.40	X	1.10	=	1.54	X	0.05	= 0.08
B11	1.20	X	1.10	=	1.32	X	0.05	= 0.07
B12	2.00	X	0.70	=	1.40	X	0.05	= 0.07
B13	0.80	X	0.60	=	0.48	X	0.05	= 0.02
B14	0.80	X	0.80	=	0.64	X	0.05	= 0.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 38	**LOCALIDADE:** RUA JOANA BATISTA HOLANDA	**BAIRRO:** SALGADINHO	**PRANCHA:** 1/2
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 464736 **LAT.:** 9204167
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 23/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON	

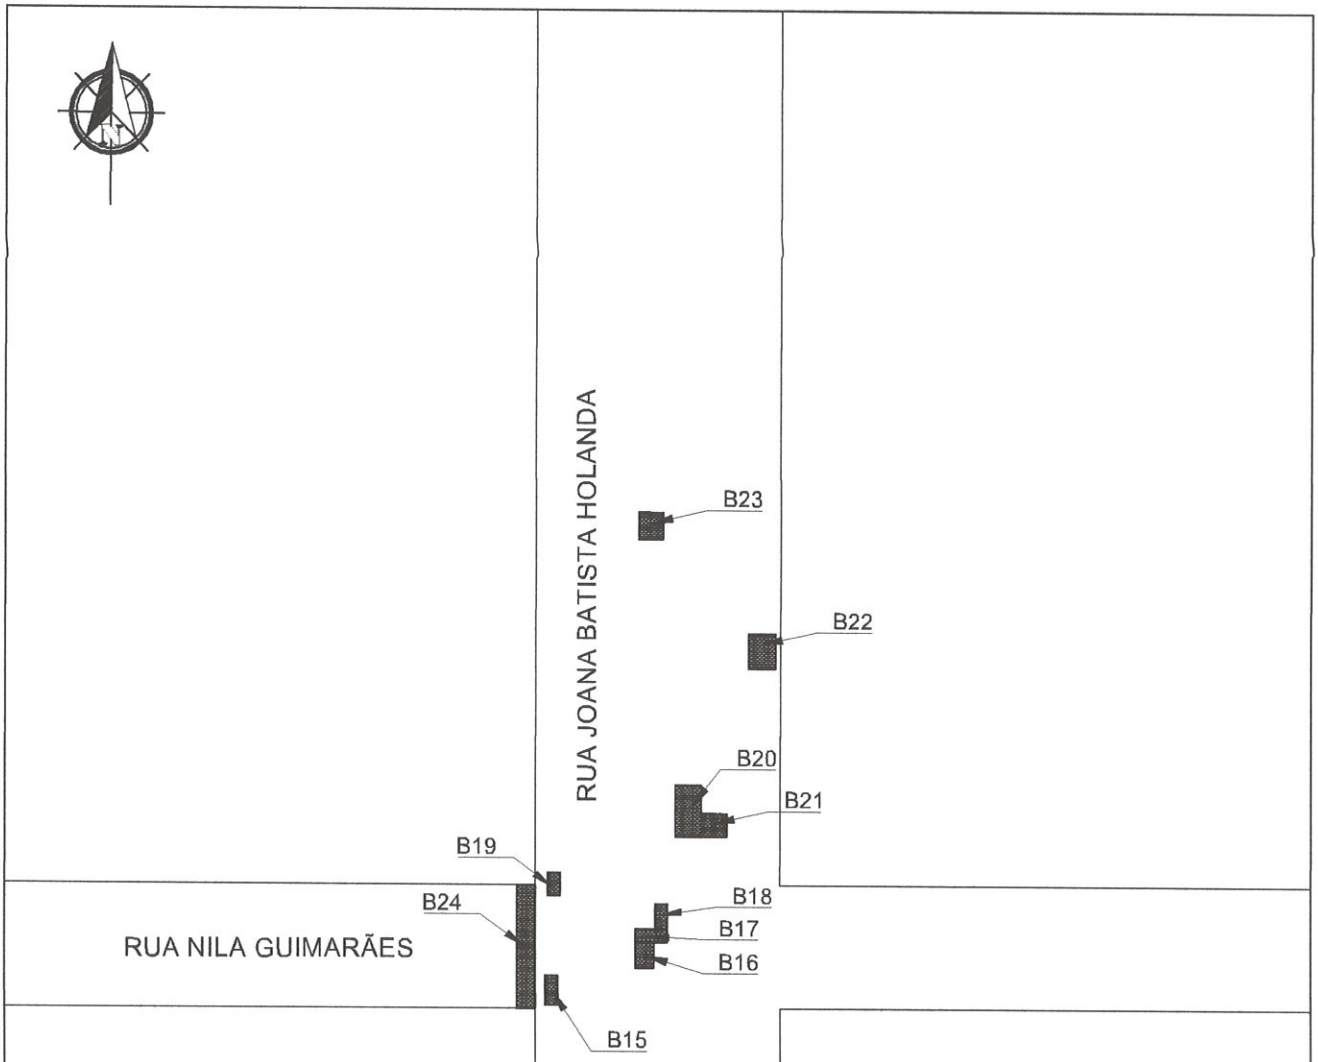

B15	1,20	X	0,50	=	0,60	X	0,05	=	0,03
B16	2,20	X	1,50	=	3,30	X	0,05	=	0,17
B17	1,80	X	0,80	=	1,44	X	0,05	=	0,07
B18	2,00	X	0,90	=	1,80	X	0,05	=	0,09
B19	1,00	X	0,40	=	0,40	X	0,05	=	0,02
B20	2,30	X	1,50	=	3,45	X	0,05	=	0,17
B21	1,20	X	1,20	=	1,44	X	0,05	=	0,07
B22	1,60	X	1,30	=	2,08	X	0,05	=	0,10
B23	1,20	X	0,90	=	1,08	X	0,05	=	0,05
B24	6,70	X	0,90	=	6,03	X	0,05	=	0,30
			ÁREA	=	**43,07**		**VOLUME**	=	**2,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 38	**LOCALIDADE:** RUA JOANA BATISTA HOLANDA	**BAIRRO:** SALGADINHO	**PRANCHA:** 2/2
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 464736 **LAT.:** 9204167
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 23/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID: 38

ENDEREÇO: RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA

BAIRRO: SALGADINHO

TRECHO: ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E A RUA NILA GUIMARÃES

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM

DATA MEDIÇÃO: 23/03/2026

EMPRESA EXECUTORA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO: N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	38	RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	43,07	R$ 1,84	R$ 79,25
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	2,15	R$ 1.696,15	R$ 3.652,66
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	43,07	R$ 0,33	R$ 14,21
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,02	R$ 3.062,93	R$ 52,77
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,33	R$ 472,85	R$ 155,39
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	5,52	R$ 30,12	R$ 166,23
					TOTAL	R$ 4.120,51

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

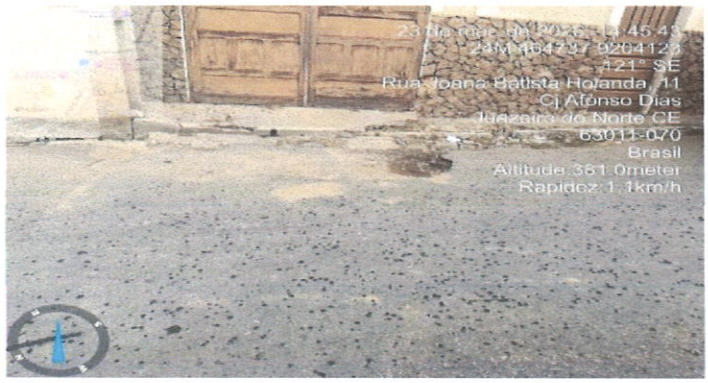

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - ANTES

FOTO 10 - ANTES

FOTO 11 - ANTES

FOTO 12 - ANTES

FOTO 13 - ANTES

FOTO 14 - B1 E B2

FOTO 15 - B3 E B4

FOTO 16 - B5

Paulo Adriane de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 17 - B6

FOTO 18 - B7 E B8

FOTO 19 - B9 E B10

FOTO 20 - B11

FOTO 21 - B12 E B13

FOTO 22 - B14

FOTO 23 - B15, B19 E B24

FOTO 24 - B16 A B18

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 25 - B20 E B21

FOTO 26 - B22 E B23

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 23.03.2026-04	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA TODOS OS SANTOS.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 23 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

B1	2.70	X	2.50	=	6.75	X	0.05	=	0.34
B2	3.50	X	3.70	=	12.95	X	0.05	=	0.65
B3	2.20	X	0.80	=	1.76	X	0.05	=	0.09
B4	2.90	X	1.70	=	4.93	X	0.05	=	0.25
B5	1.60	X	1.40	=	2.24	X	0.05	=	0.11
B6	0.80	X	0.60	=	0.48	X	0.05	=	0.02
B7	1.10	X	1.20	=	1.32	X	0.05	=	0.07
B8	0.80	X	0.70	=	0.56	X	0.05	=	0.02
B9	4.50	X	1.20	=	5.40	X	0.05	=	0.27
			ÁREA	=	36,39		VOLUME	=	1,82

RUA SÃO MAMEDE

AV. TODOS OS SANTOS

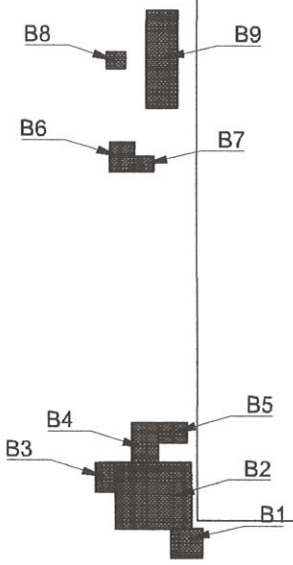

AV. CARLOS CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 39	**LOCALIDADE:** RUA TODOS OS SANTOS	**BAIRRO:** SANTA TEREZA	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 23/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON	**LONG.:** 465080 **LAT.:** 9202336

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID: 39

ENDEREÇO: RUA TODOS OS SANTOS

BAIRRO: SANTA TEREZA

TRECHO: ENTRE AV. CARLOS CRUZ E A RUA SÃO MAMEDE

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM

DATA MEDIÇÃO: 23/03/2026

EMPRESA EXECUTORA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO: N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	39	RUA TODOS OS SANTOS				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	36,39	R$ 1,84	R$ 66,96
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	1,82	R$ 1.696,15	R$ 3.086,14
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S TRANSP)	M2	36,39	R$ 0,33	R$ 12,01
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,01	R$ 3.062,93	R$ 44,58
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,28	R$ 472,85	R$ 131,29
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	4,66	R$ 30,12	R$ 140,45
					TOTAL	R$ 3.481,43

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

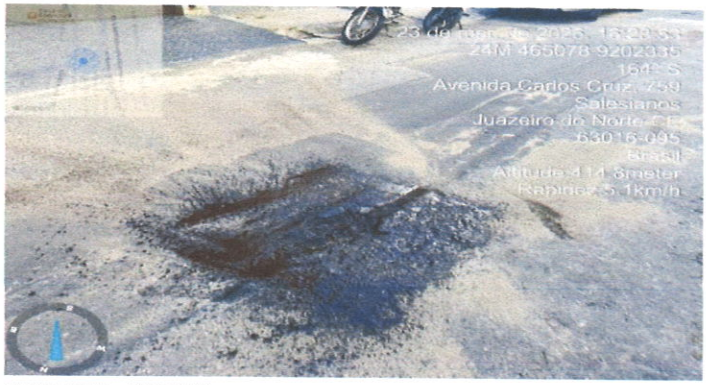

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

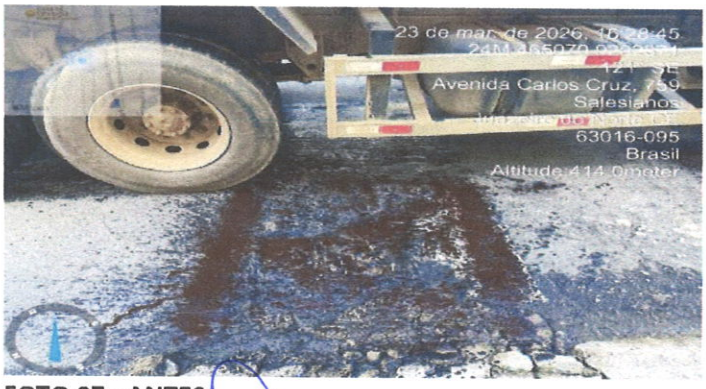

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - B1

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - B2 A B5

FOTO 10 - B6 A B9

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 23.03.2026-05	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA COLETOR JOSE VITORINO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 23 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

RUA CONST. JOSE SABINO

RUA COLETOR JOSÉ VITORINO



RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA
TOSCA: 40,00m X 6,00m

RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA
TOSCA: 13,00m X 5,00m

RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA
TOSCA: 15,00m X 3,00m

SERVIÇOS EXECUTADOS

- RETIRADA DE PEDRA TOSCA EM 60% DA AREA
- RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA PROPORÇÃO DE 60% COM APROVEITAMENTO DA PEDRA E 40% COM PEDRA NOVA
- COMPACTAÇÃO MECÂNICA
- LIMPEZA CARGA E TRANSPORTE

RUA ENG. APOLÔNIO DE MACEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 40	**LOCALIDADE:** RUA COLETOR JOSÉ VITORINO	**BAIRRO:** SÃO JOSÉ	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 461976 **LAT.:** 9201556
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	**DATA:** 31/03/2026	**RESP. DESENHO:** HARON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
40	RUA COLETOR JOSE VITORINO	SÃO JOSÉ

TRECHO

ENTRE A RUA ENG. APOLÔNIO DE MACEDO EA RUA CONST. JOSÉ SABINO

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
HEITOR BORGES	31/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	40	RUA COLETOR JOSE VITORINO					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	350,00	R$ 1,84	R$	644,00
1.4	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	210,00	R$ 14,68	R$	3.082,80
1.13	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	210,00	R$ 1,35	R$	283,50
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,75	R$ 4,99	R$	113,52
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	22,75	R$ 41,23	R$	937,98
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM					
2.9	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	140,00	R$ 78,14	R$	10.939,60
2.11	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	210,00	R$ 37,98	R$	7.975,80
					TOTAL	R$	23.977,20

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Aparecida Magalhães
Engª Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - DEPOIS (1)

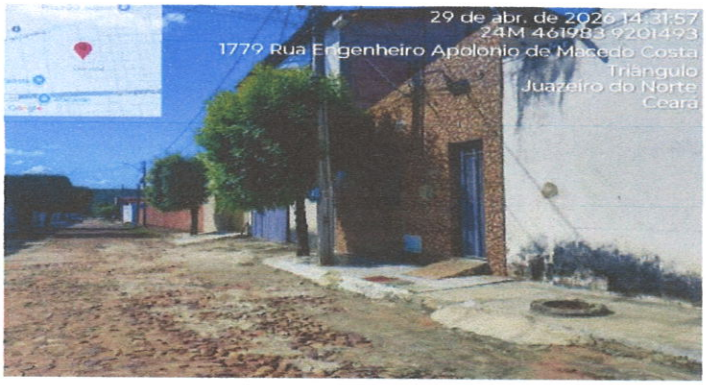

FOTO 04 - DEPOIS (2)

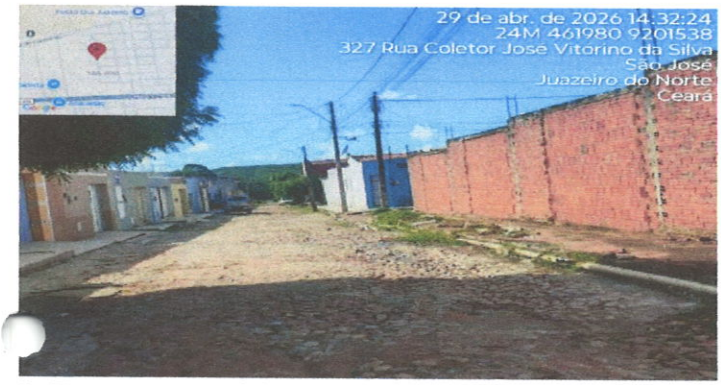

FOTO 05 - DEPOIS (3)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 26.03.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA CORONEL FAUSTO GUIMARÃES.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 26 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

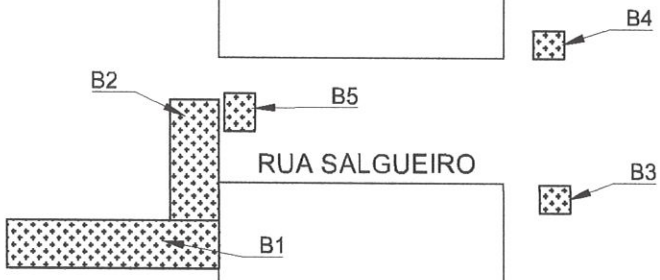

RUA CORONEL FAUSTO GUIMARÃES

AV. AILTON GOMES

B1	4,70	X	3,40	=	15,98	X	0,08	=	1,28
B2	3,80	X	2,00	=	7,60	X	0,08	=	0,61
B3	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,05	=	0,05
B4	1,20	X	1,20	=	1,44	X	0,05	=	0,07
B5	2,80	X	0,90	=	2,52	X	0,05	=	0,13
			ÁREA	=	**28,54**		**VOLUME**	=	**2,13**

AV. CASTELO BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 41	**LOCALIDADE:** RUA CORONEL FAUSTO GUIMARÃES	**BAIRRO:** PIRAJÁ	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 26/03/26	**RESP. DESENHO:** GUILHERME	**LONG.:** 465525 **LAT.:** 9201368

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
41	RUA CORONEL FAUSTO GUIMARÃES	PIRAJA

TRECHO

ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A AV. AILTON GOMES

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO

PHILIPPE E FRANKLIM

DATA MEDIÇÃO

26/03/2026

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	41	RUA CORONEL FAUSTO GUIMARÃES				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	28,54	R$ 1,84	R$ 52,51
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	2,13	R$ 1.696,15	R$ 3.620,26
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/ TRANSP)	M2	28,54	R$ 0,33	R$ 9,42
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,01	R$ 3.062,93	R$ 34,97
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,32	R$ 472,85	R$ 151,34
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	5,46	R$ 30,12	R$ 164,59
					TOTAL	R$ 4.033,09

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

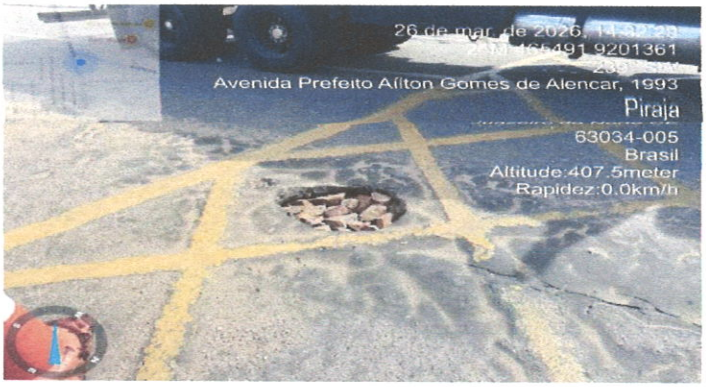

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - B1, B2 E B5

FOTO 05 - B3

FOTO 06 - B4

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 27.03.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 27 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

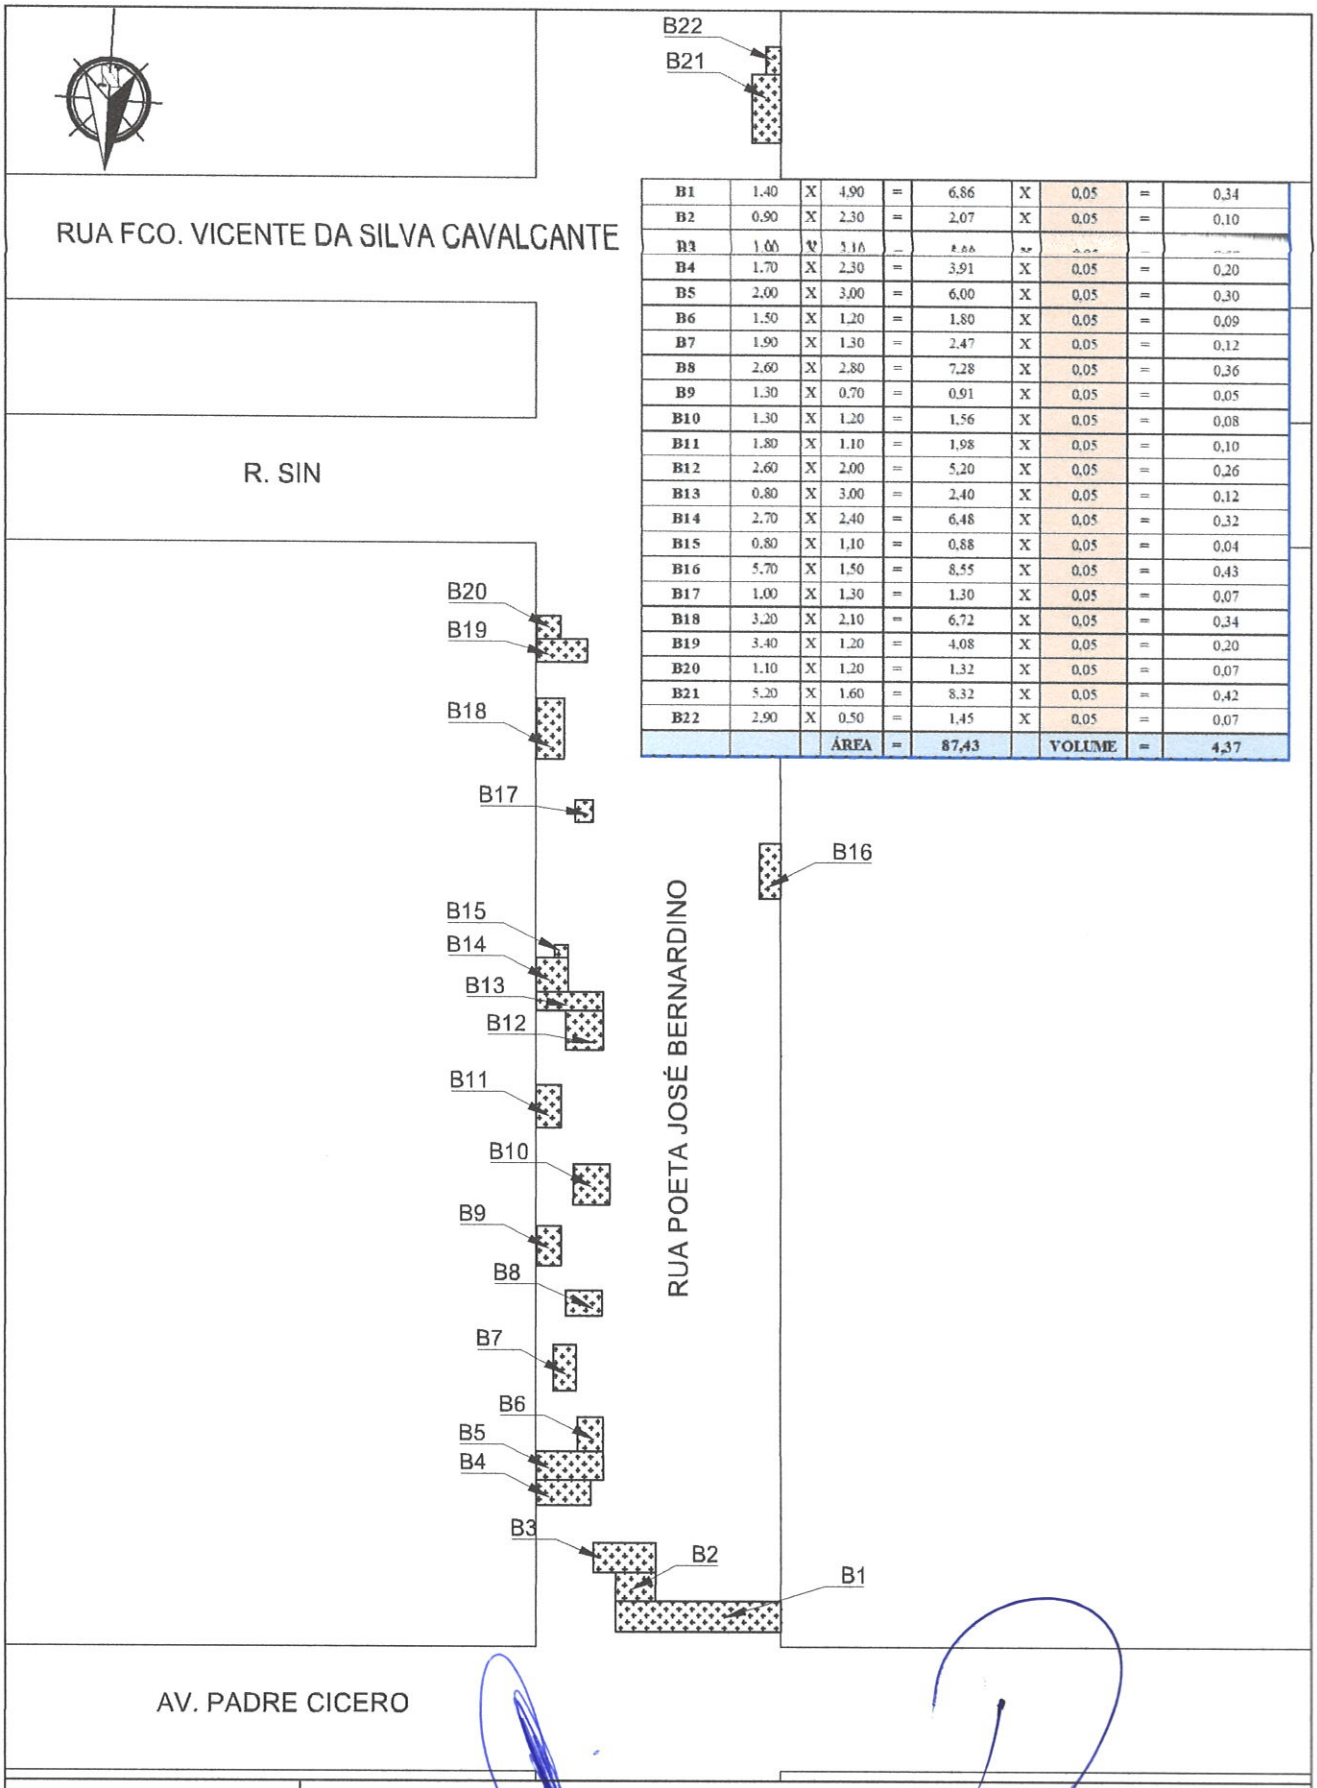

B1	1.40	X	4.90	=	6.86	X	0,05	=	0,34
B2	0.90	X	2.30	=	2.07	X	0,05	=	0,10
B3	1.60	X	5.10	=	8.16	X	0,05	=	0,41
B4	1.70	X	2.30	=	3.91	X	0,05	=	0,20
B5	2.00	X	3.00	=	6.00	X	0,05	=	0,30
B6	1.50	X	1.20	=	1.80	X	0,05	=	0,09
B7	1.90	X	1.30	=	2.47	X	0,05	=	0,12
B8	2.60	X	2.80	=	7.28	X	0,05	=	0,36
B9	1.30	X	0.70	=	0.91	X	0,05	=	0,05
B10	1.30	X	1.20	=	1.56	X	0,05	=	0,08
B11	1.80	X	1.10	=	1.98	X	0,05	=	0,10
B12	2.60	X	2.00	=	5.20	X	0,05	=	0,26
B13	0.80	X	3.00	=	2.40	X	0,05	=	0,12
B14	2.70	X	2.40	=	6.48	X	0,05	=	0,32
B15	0.80	X	1.10	=	0.88	X	0,05	=	0,04
B16	5.70	X	1.50	=	8.55	X	0,05	=	0,43
B17	1.00	X	1.30	=	1.30	X	0,05	=	0,07
B18	3.20	X	2.10	=	6.72	X	0,05	=	0,34
B19	3.40	X	1.20	=	4.08	X	0,05	=	0,20
B20	1.10	X	1.20	=	1.32	X	0,05	=	0,07
B21	5.20	X	1.60	=	8.32	X	0,05	=	0,42
B22	2.90	X	0.50	=	1,45	X	0,05	=	0,07
			ÁREA	=	87,43		VOLUME	=	4,37

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 42	**LOCALIDADE:** RUA POETA JOSÉ BERNARDINO	**BAIRRO:** TRIÂNGULO	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 463599 **LAT.:** 9201214
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 27/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
42	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA	PREFEITO CARLOS CRUZ

TRECHO

ENTRE A AV. PADRE CICERO E A RUA FRANCISCO VICENTE CAVALCANTE

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO

PHILIPPE E FRANKLIM

DATA MEDIÇÃO

27/03/2026

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	42	RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	87,43	R$ 1,84	R$ 160,87
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	4,37	R$ 1.696,15	R$ 7.414,72
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/ TRANSP)	M2	87,43	R$ 0,33	R$ 28,85
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,03	R$ 3.062,93	R$ 107,12
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,67	R$ 472,85	R$ 315,44
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	11,20	R$ 30,12	R$ 337,44
					TOTAL	R$ 8.364,44

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - ANTES

FOTO 10 - ANTES

FOTO 11 - ANTES

FOTO 12 - ANTES

FOTO 13 - ANTES

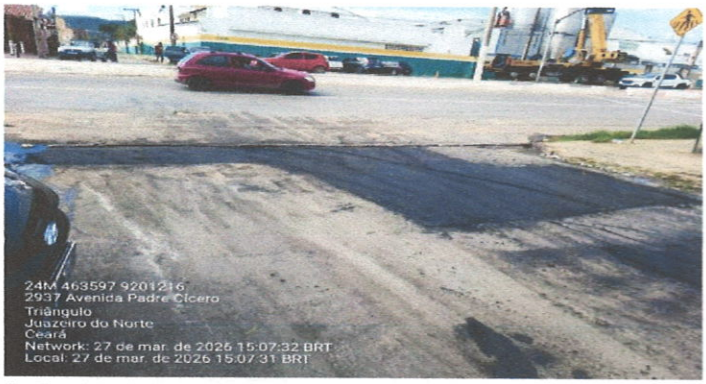

FOTO 14 - B1 A B3

FOTO 15 - B4 A B6

FOTO 16 - B7

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 17 - B8 A B11

FOTO 18 - B12 A B15

FOTO 19 - B16

FOTO 20 - B17 A B18

FOTO 21 - B19 A B20

FOTO 22 - B21 A B22

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 27.03.2026-02	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) AVENIDA CARLOS CRUZ.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 27 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

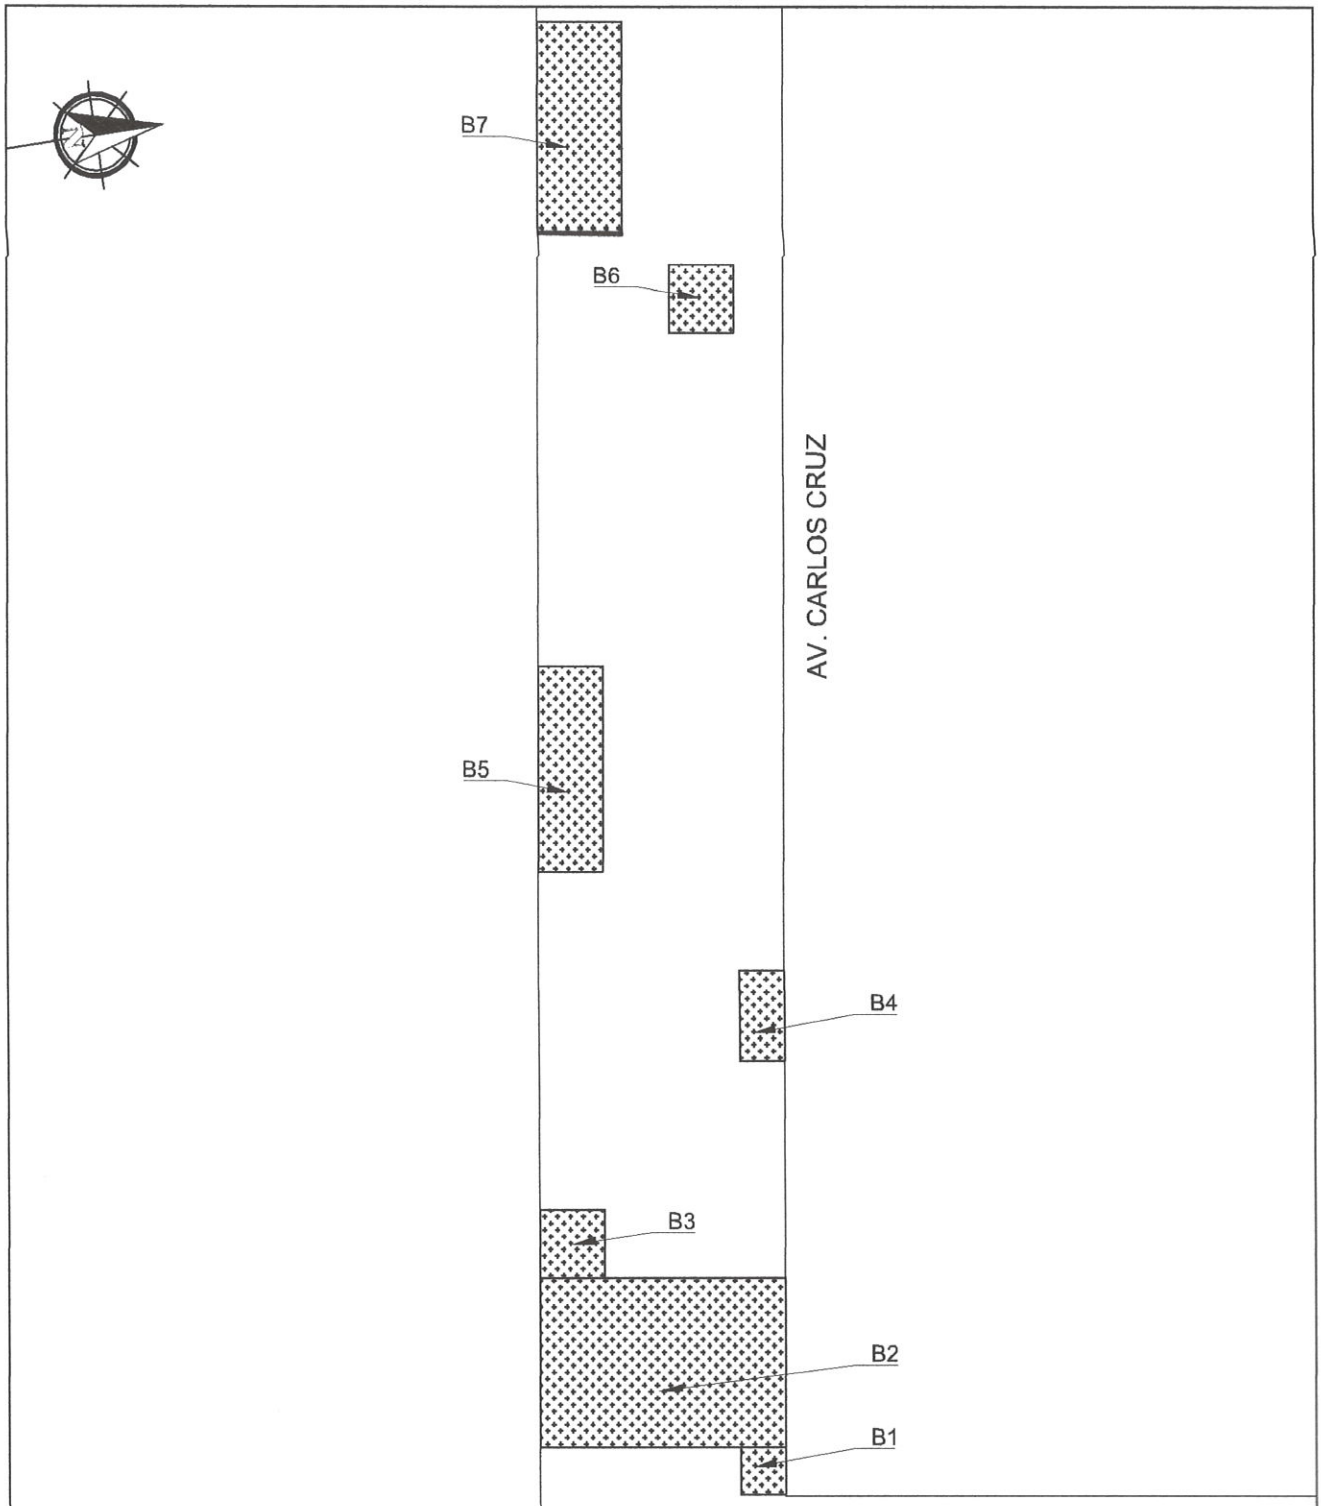

B1	3,00	X	1,50	=	4,50	X	0,10	=	0,45
B2	11,00	X	6,00	=	66,00	X	0,15	=	9,90
B3	3,00	X	3,00	=	9,00	X	0,10	=	0,90
B4	6,00	X	1,50	=	9,00	X	0,10	=	0,90
B5	11,00	X	3,00	=	33,00	X	0,10	=	3,30
B6	3,00	X	3,00	=	9,00	X	0,10	=	0,90
B7	11,80	X	4,00	=	47,20	X	0,15	=	7,08

SEM DENOMINAÇÃO

OBS.: UTILIZADO SOLO BRITA COM ESPESSURA DE 10cm

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 43	**LOCALIDADE:** AV. CARLOS CRUZ	**BAIRRO:** AEROPORTO	**PRANCHA:** 1/5
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 468933 **LAT.:** 9203995
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 27/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON	

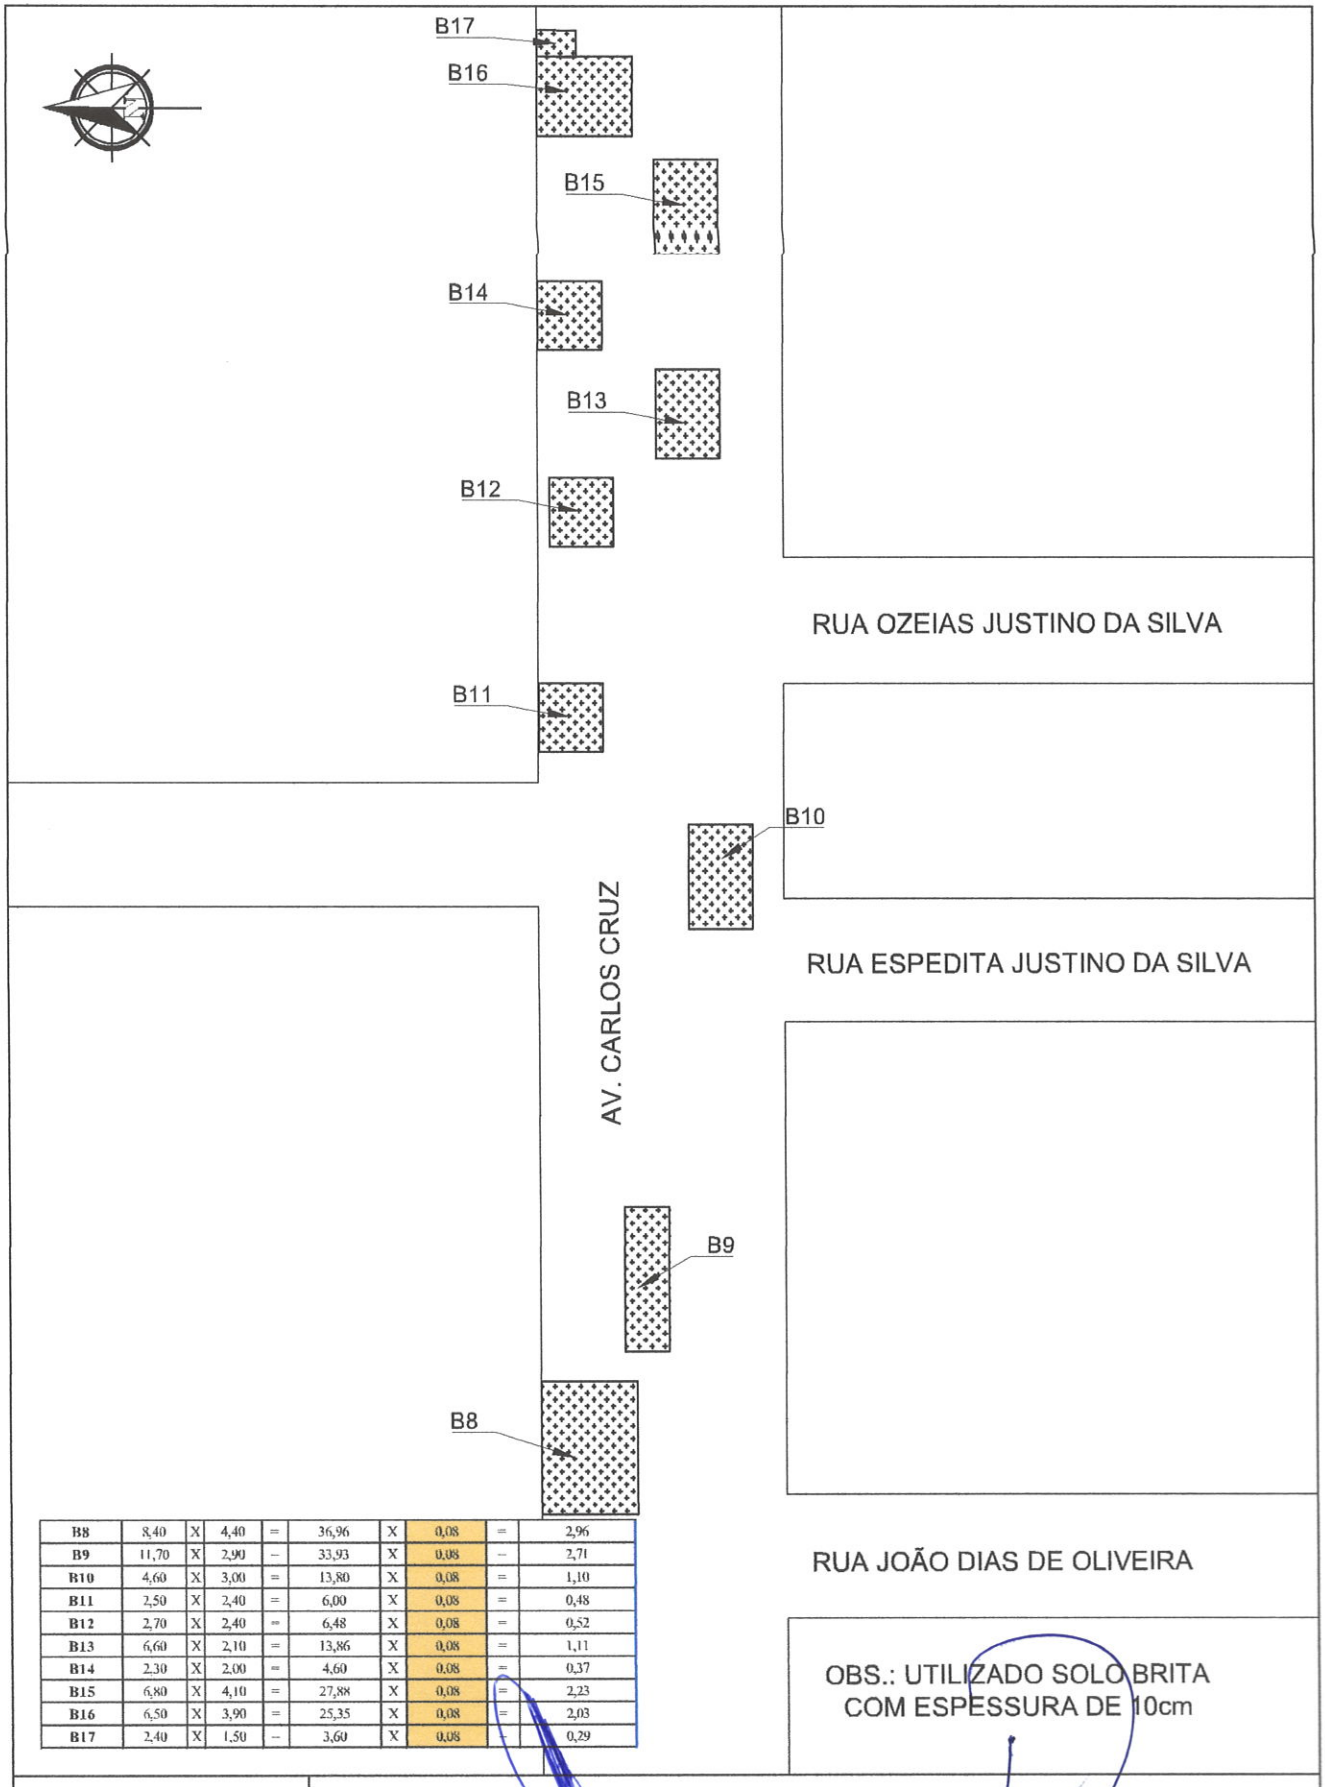

B8	8,40	X	4,40	=	36,96	X	0,08	=	2,96
B9	11,70	X	2,90	=	33,93	X	0,08	=	2,71
B10	4,60	X	3,00	=	13,80	X	0,08	=	1,10
B11	2,50	X	2,40	=	6,00	X	0,08	=	0,48
B12	2,70	X	2,40	=	6,48	X	0,08	=	0,52
B13	6,60	X	2,10	=	13,86	X	0,08	=	1,11
B14	2,30	X	2,00	=	4,60	X	0,08	=	0,37
B15	6,80	X	4,10	=	27,88	X	0,08	=	2,23
B16	6,50	X	3,90	=	25,35	X	0,08	=	2,03
B17	2,40	X	1,50	=	3,60	X	0,08	=	0,29

OBS.: UTILIZADO SOLO BRITA COM ESPESSURA DE 10cm

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engª Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44579/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 43	**LOCALIDADE:** AV. CARLOS CRUZ	**BAIRRO:** PEDRINHAS	**PRANCHA:** 2/5
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 468933 **LAT.:** 9203995
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 27/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON	

AV. CLUBE DOS COMERCIÁRIO
(AV. DEP. DUARTE JÚNIOR)



AV. CARLOS CRUZ

B18	6,40	X	4,20	=	26,88	X	0,08	=	2,15

OBS.: UTILIZADO SOLO BRITA
COM ESPESSURA DE 10cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 43	**LOCALIDADE:** AV. CARLOS CRUZ	**BAIRRO:** PEDRINHAS	**PRANCHA:** 3/5
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 30/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON	**LONG.:** 468933 **LAT.:** 9203995

AVENIDA EDGAR ALVINO LEITE

B19

AV. CARLOS CRUZ

B19	4,80	X	4,40	=	21,12	X	0,08	=	1,69

OBS.: UTILIZADO SOLO BRITA
COM ESPESSURA DE 10cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 43	**LOCALIDADE:** AV. CARLOS CRUZ	**BAIRRO:** PEDRINHAS	**PRANCHA:** 4/5
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM**
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 30/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON	**LONG.:** 468933 **LAT.:** 9203995

AV. DEP. DUARTE JÚNIOR

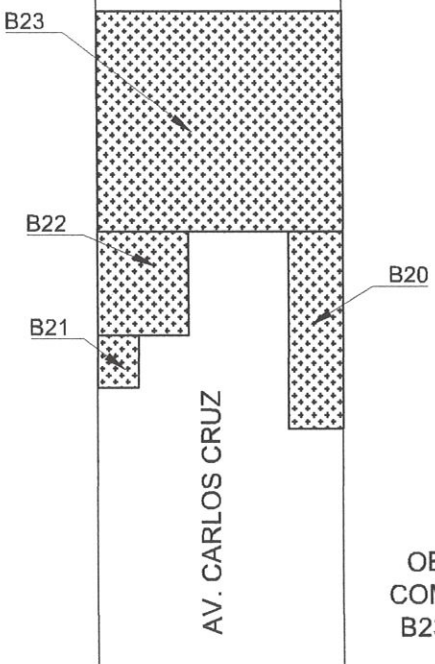

OBS.: UTILIZADO SOLO BRITA COM ESPESSURA DE 10cm E NO B23 UMA ESPESSURA DE 15cm

B20	16,50	X	2,50	=	41,25	X	0,10	=	4,13
B21	3,40	X	1,60	=	5,44	X	0,10	=	0,54
B22	4,10	X	2,30	=	9,43	X	0,10	=	0,94
B23	13,10	X	7,10	=	93,01	X	0,15	=	13,95
			ÁREA	=	**547,29**		**VOLUME**	=	**60,63**

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 43	**LOCALIDADE:** AV. CARLOS CRUZ	**BAIRRO:** PEDRINHAS	**PRANCHA:** 5/5
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 468933 **LAT.:** 9203995
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 31/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
43	AVENIDA CARLOS CRUZ	AEROPORTO

TRECHO

ENTRE A AV. EDGAR ALVINO LEITE E A AV. DEPUTADO DUARTE JUNIOR

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	31/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	43	AVENIDA CARLOS CRUZ						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I		P. TOTAL C/B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	547,29	R$	1,84	R$	1.007,01
1.10	C3134	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/ TRANSP)	M3	59,38	R$	71,18	R$	4.226,63
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	59,38	R$	41,23	R$	2.448,22
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM						
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	60,63	R$	1.696,15	R$	102.838,08
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/ TRANSP)	M2	547,29	R$	0,33	R$	180,61
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,22	R$	3.062,93	R$	670,52
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	8,99	R$	472,85	R$	4.249,11
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	155,12	R$	30,12	R$	4.672,13
						TOTAL	R$	120.292,31

MAPA DE SITUAÇÃO

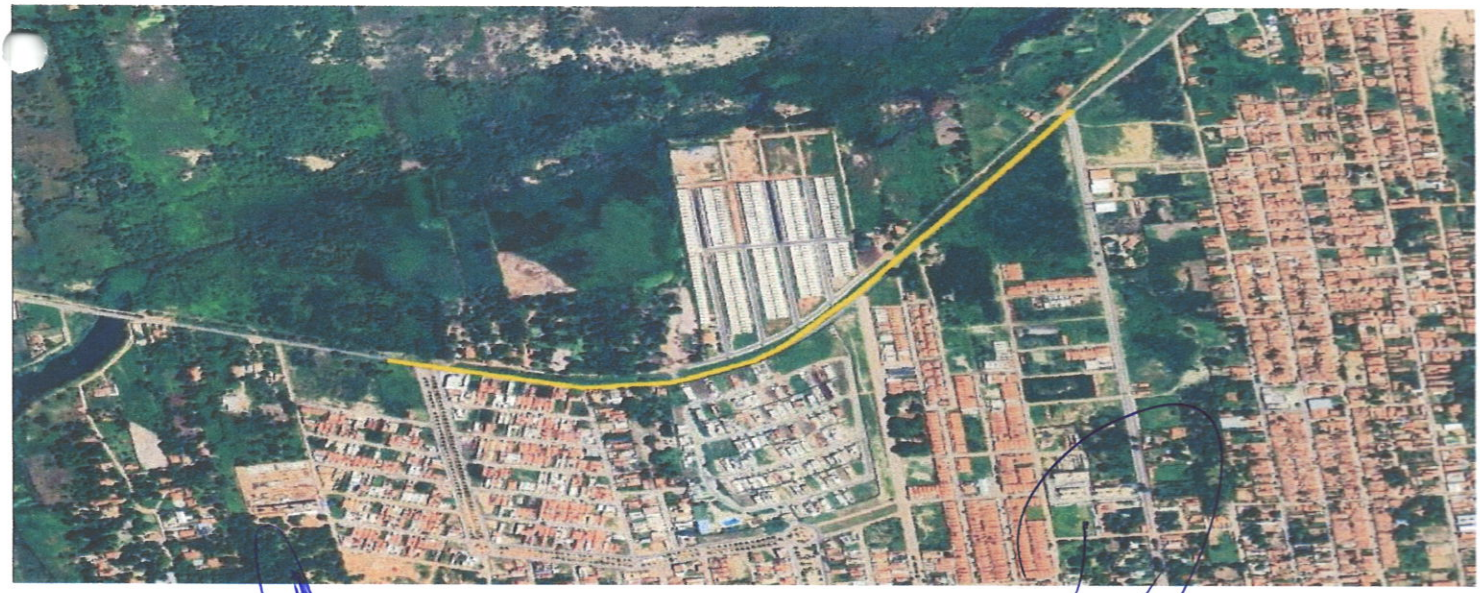

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

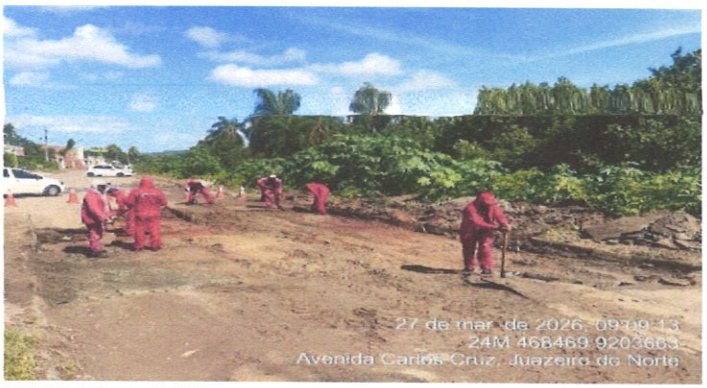

FOTO 02 - ANTES

FOTO 03 - ANTES

FOTO 04 - ANTES

FOTO 05 - ANTES

FOTO 06 - ANTES

FOTO 07 - ANTES

FOTO 08 - ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

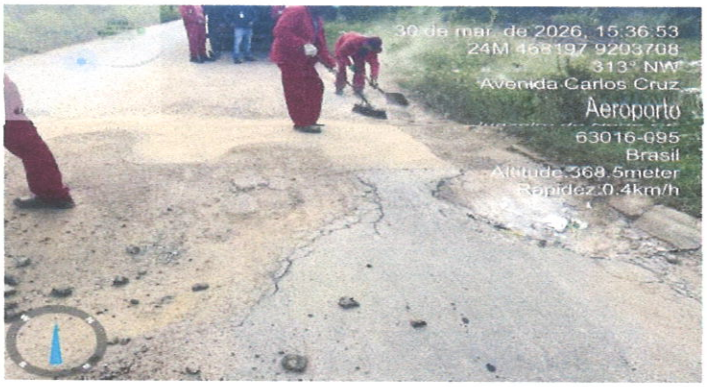

FOTO 09 - ANTES

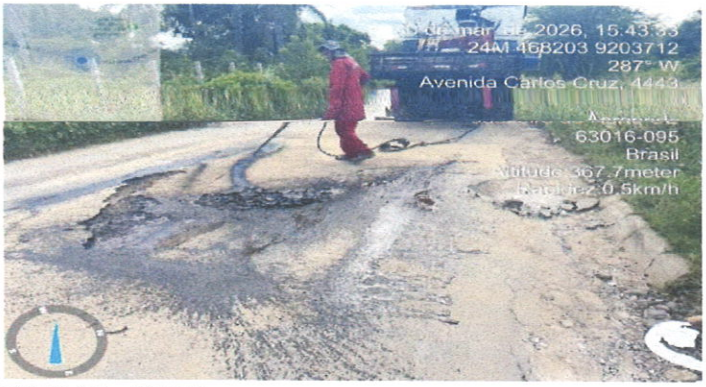

FOTO 10 - ANTES

FOTO 11 - ANTES

FOTO 12 - EXECUTADO - B1 A B3

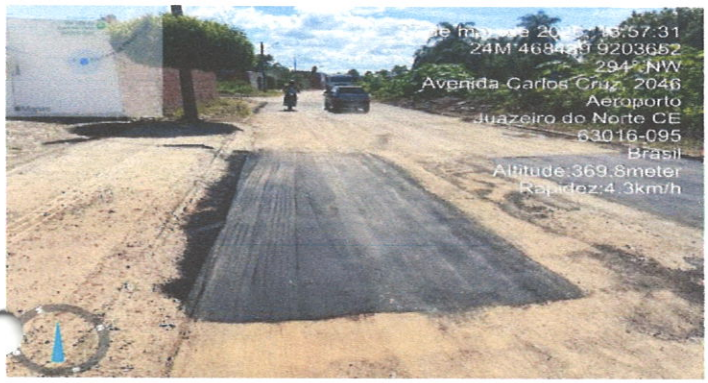

FOTO 13 - EXECUTADO - B4

FOTO 14 - EXECUTADO - B5

FOTO 15 - EXECUTADO - B6

FOTO 16 - EXECUTADO - B7

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 17 - EXECUTADO - B8

FOTO 18 - EXECUTADO - B9

FOTO 19 - EXECUTADO - B10

FOTO 20 - EXECUTADO - B11

FOTO 21 - EXECUTADO - B12

FOTO 22 - EXECUTADO - B13

FOTO 23 - EXECUTADO - B14

FOTO 24 - EXECUTADO - B15

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 25 - EXECUTADO - B16 E B17

FOTO 26 - EXECUTADO - B18

FOTO 27 - EXECUTADO - B19

FOTO 28 - EXECUTADO - B20

FOTO 29 - EXECUTADO - B21 A B23

FOTO 30 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (1)

FOTO 31 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (2)

FOTO 32 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (3)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

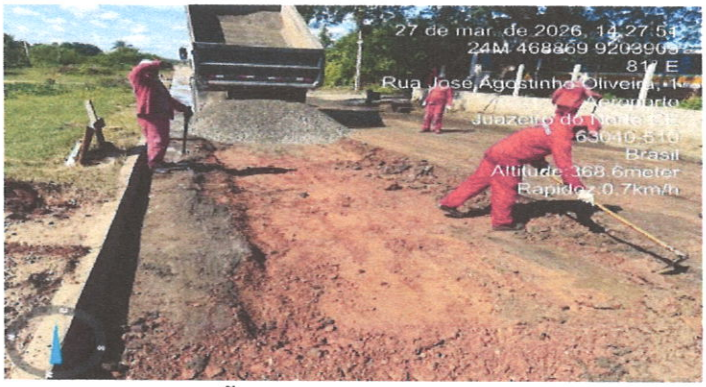

FOTO 33 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (4)

FOTO 34 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (5)

FOTO 35 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (6)

FOTO 36 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (7)

FOTO 37 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (8)

FOTO 38 - EXECUÇÃO - SOLO BRITA (9)

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

ORDEM DE SERVIÇO

N° DA ORDEM DE SERVIÇO 30.03.2026-01	**MODALIDADE DA LICITAÇÃO** CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
N° DO CONTRATO 2025.09.02-0002	**DATA DO CONTRATO** 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
N° DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	**N° DO TELEFONE/FAX** (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA MANOEL TAVARES LOPES.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	**VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO** 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 30 de março de 2026.

CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

RUA MARIA SOARES

RUA MARIA NELI GONÇALVES



RUA MANOEL TAVARES LOPES

B1	4,70	X	3,80	=	17,86	X	0,08	=	1,43
B2	2,40	X	0,70	=	1,68	X	0,08	=	0,13
			ÁREA	=	**19,54**		**VOLUME**	=	**1,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 44	**LOCALIDADE:** RUA MANOEL TAVARES LOPES	**BAIRRO:** FREI DAMIÃO	**PRANCHA:** 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			**COORDENADAS UTM** **LONG.:** 462671 **LAT.:** 9198954
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIN	**DATA:** 30/03/26	**RESP. DESENHO:** HARON	

Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
44	RUA MANOEL TAVARES LOPES	FREI DAMIÃO

TRECHO

ENCONTRO COM RUA MARIA NELI GONÇALVES

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM	31/03/2026

EMPRESA EXECUTORA	CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33	N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	44	RUA MANOEL TAVARES LOPES				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	19,54	R$ 1,84	R$ 35,95
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	1,56	R$ 1.696,15	R$ 2.651,42
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/ TRANSP)	M2	19,54	R$ 0,33	R$ 6,45
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,01	R$ 3.062,93	R$ 23,94
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,23	R$ 472,85	R$ 110,58
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	4,00	R$ 30,12	R$ 120,52
					TOTAL	R$ 2.948,86

MAPA DE SITUAÇÃO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - ANTES

FOTO 02 - B1 E B2

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engª Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 14979/CE

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE

CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONTRATO Nº 2025.09.02-0002

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA:

- PCMSO
- PGR

9º MEDIÇÃO

R$ 1.180.643,83

AV. SEN. VIRGÍLIO TÁVORA, 1701 – SALA 408
FONE/FAZ (85) 3261 – 0915
CNPJ 07.195.191/0001-33 – CGF 06.002744-4
CEP 60170-251 – Aldeota – Fortaleza - CE

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO:	2025.09.02-0002
CONTRATANTE:	PREF. MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
ÓRGÃO FISCALIZADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.
DATA O.S.:	05/09/2025
PRAZO + ADITIVO:	365
MEDIÇÃO:	9
PERÍODO DA MEDIÇÃO:	01/03/2026 A 31/03/2026

CORAL

PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
01/03/2026	365	177	188	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
02/03/2026	365	178	187	BOM	segunda-feira

RUA JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA - TRECHO 4
*ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
*REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
*MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
*EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
*CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA

AVENIDA AILTON GOMES
RUA ANTÔNIO VIEIRA
AVENIDA CASTELO BRANCO
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Figura 01:
RUA JOSIAS INOJOSA

Figura 02:
RUA JOSIAS INOJOSA

Figura 03:
RUA JOSIAS INOJOSA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44879-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
03/03/2026	365	179	186	BOM	terça-feira

RUA JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA - TRECHO 4
*ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
*REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
*MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
*EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
*CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA

Figura 01:
RUA JOSIAS INOJOSA

Figura 02:
RUA JOSIAS INOJOSA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
04/03/2026	365	180	185	BOM	quarta-feira

RUA JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA - TRECHO 4

*ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
*REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
*MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
*EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
*CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
05/03/2026	365	181	184	BOM	quinta-feira

RUA JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA - TRECHO 4
*ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
*REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
*MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
*EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
*CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA

RUA PIO X
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ
AVENIDA CASTELO BRANCO
RUA SÃO PEDRO
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Figura 01:
AVENIDA CASTELO BRANCO

Figura 02:
AVENIDA CASTELO BRANCO

Figura 03:
RUA INTERVENTOR FRANCISCO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
06/03/2026	365	182	183	BOM	sexta-feira

RUA JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA - TRECHO 4
*ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
*REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
*MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
*EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
*CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA DUCA BRINGEL
RUA SÃO PAULO
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Figura 01:
RUA DUCA BRINGEL

Figura 02:
RUA DUCA BRINGEL

Figura 03:
RUA DUCA BRINGEL

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
07/03/2026	365	183	182	BOM	sabado

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
08/03/2026	365	184	181	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
09/03/2026	365	185	180	BOM	segunda-feira

RUA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO
*REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
*BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA E TRANSPORTE
*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
*EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
*CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

AVENIDA CASTELO BRANCO
AVENIDA PADRE CÍCERO
RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO
AVENIDA ANA SARAIVA DE MENEZES
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Figura 01:
RUA JOSE F. DO NASCIMENTO

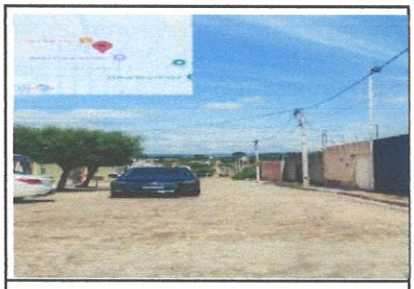

Figura 02:
RUA JOSE F. DO NASCIMENTO

Figura 03:
AVENIDA CASTELO BRANCO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
10/03/2026	365	186	179	BOM	terça-feira

RUA SÃO MAMEDE
RUA CAMPOS ELÍSEOS
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA JOSE ANASTACIO TAVARES
*ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
*REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
*RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
*RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO
*MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
*EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
*CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

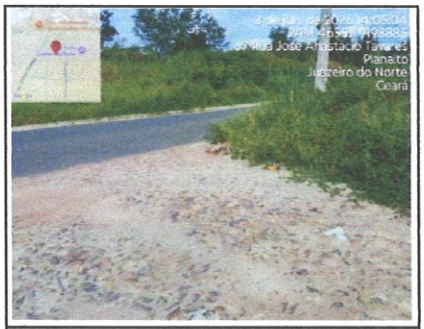

Figura 01:
RUA JOSE A. TAVARES

Figura 02:
RUA JOSE A. TAVARES

Figura 03:
RUA JOSE A. TAVARES

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
11/03/2026	365	187	178	BOM	quarta-feira

AVENIDA PADRE CÍCERO
RUA JOSÉ HENRIQUE BRASILEIRO
RUA CAMPOS ELÍSEOS
AVENIDA CARLOS CRUZ
RUA SÃO BENEDITO
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA FREI DAMIÃO
*ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
*ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE
*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
*MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
*CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Figura 01:
RUA FREI DAMIÃO

Figura 02:
RUA FREI DAMIÃO

Figura 03:
RUA FREI DAMIÃO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
12/03/2026	365	188	177	BOM	quinta-feira

AVENIDA PADRE CÍCERO
RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA JOÃO DIAS DE OLIVEIRA
*RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
*COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO
*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
*RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO
*CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Figura 01:
RUA JOÃO DIAS DE OLIVEIRA

Figura 02:
RUA JOÃO DIAS DE OLIVEIRA

Figura 03:
RUA JOÃO DIAS DE OLIVEIRA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
13/03/2026	365	189	176	BOM	sexta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
14/03/2026	365	190	175	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
15/03/2026	365	191	174	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
16/03/2026	365	192	173	BOM	segunda-feira

AVENIDA CASTELO BRANCO
AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA
ESTRADA DO SÃO GONÇALO
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA PADRE JOÃO MORETTI
*RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
*COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO
*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
*RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO
*CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

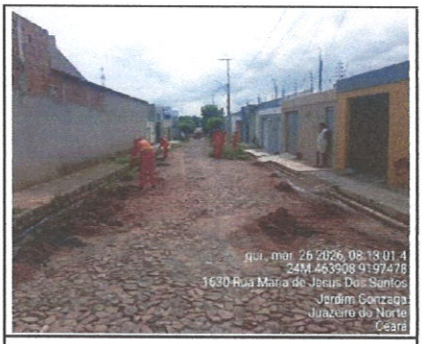

Figura 01:
RUA PADRE JOÃO MORETTI

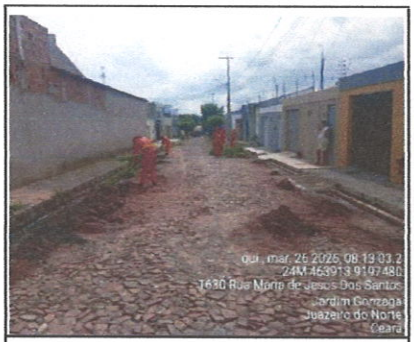

Figura 02:
RUA PADRE JOÃO MORETTI

Figura 03:
RUA PADRE JOÃO MORETTI

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
17/03/2026	365	193	172	BOM	terça-feira

AVENIDA CASTELO BRANCO
ESTRADA DO SÃO GONÇALO
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA VITAL LISBOA
*RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
*COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO
*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
*RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO
*CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Figura 01:
ESTRADA DO SÃO GONÇALO

Figura 02:
ESTRADA DO SÃO GONÇALO

Figura 03:
ESTRADA DO SÃO GONÇALO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
18/03/2026	366	194	171	BOM	quarta-feira

AVENIDA CASTELO BRANCO
AVENIDA PADRE CÍCERO
AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA
ESTRADA DO SÃO GONÇALO
RUA LEÃO XIII
RUA PADRE CÍCERO
RUA DO CRUZEIRO
AVENIDA LEANDRO BEZERRA
RUA PADRE ANTÔNIO ALMEIDA AGRA
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA ANITA NEVES
*RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
*COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO
*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
*RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO
*CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Figura 01:
RUA PADRE CÍCERO

Figura 02:
RUA PADRE CÍCERO

Figura 03:
RUA PADRE CÍCERO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
19/03/2026	365	195	170	BOM	quinta-feira

RUA PIO X
AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA DR. BELEM DE FIGUEIREDO
*RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
*COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO
*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
*RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO
*CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Figura 01:
RUA PIO X

Figura 02:
RUA PIO X

Figura 03:
RUA PIO X

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
20/03/2026	365	196	169	BOM	sexta-feira

RUA PADRE CÍCERO
AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA
AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA
RUA SANTO AGOSTINHO
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

AV. LEANDRO BEZERRA (PRAÇA DO MEMORIAL PADRE CICERO)
*PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM
*FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

Figura 01:
AV. LEANDRO BEZERRA

Figura 02:
AV. LEANDRO BEZERRA

Figura 03:
AV. LEANDRO BEZERRA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
21/03/2026	365	197	168	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
22/03/2026	365	198	167	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
23/03/2026	365	199	166	BOM	segunda-feira

RODOVIA MIGUEL HOMEM
RUA SANTA CECÍLIA
RUA JOANA BATISTA DE HOLANDA
RUA TODOS OS SANTOS
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA MANOEL GOUVEIA
*RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
*COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO
*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
*RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO
*CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

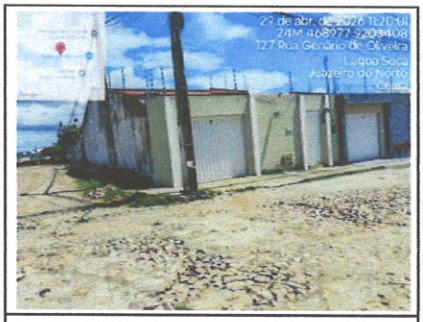

Figura 01:
RUA MANOEL GOUVEIA

Figura 02:
RUA MANOEL GOUVEIA

Figura 03:
RUA MANOEL GOUVEIA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
24/03/2026	365	200	165	BOM	terça-feira

Aniversário de nascimento do Padre Cícero

RODOVIA MIGUEL HOMEM

*BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA E TRANSPORTE
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Figura 01:
RODOVIA MIGUEL HOMEM

Figura 02:
RODOVIA MIGUEL HOMEM

Figura 03:
RODOVIA MIGUEL HOMEM

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
25/03/2026	365	201	164	BOM	quarta-feira

Data Magna do Ceará

RODOVIA MIGUEL HOMEM
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Figura 01:
RODOVIA MIGUEL HOMEM

Figura 02:
RODOVIA MIGUEL HOMEM

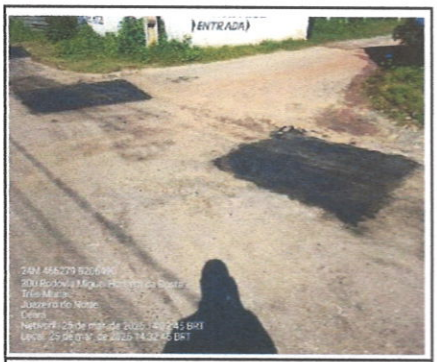

Figura 03:
RODOVIA MIGUEL HOMEM

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
26/03/2026	365	202	163	BOM	quinta-feira

RUA CORONEL FAUSTO GUIMARÃES
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA COLETOR JOSE VITORINO
*RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
*COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO
*PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
*RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO
*CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Figura 01:
RUA COL. JOSE VITORINO

Figura 02:
RUA COL. JOSE VITORINO

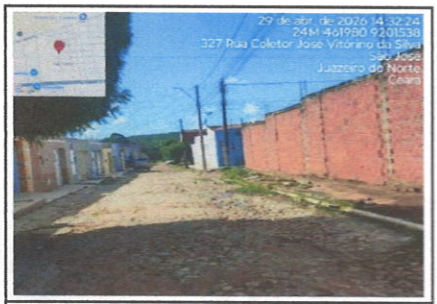

Figura 03:
RUA COL. JOSE VITORINO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
27/03/2026	365	203	162	BOM	sexta-feira

RUA POETA JOSÉ BERNARDO DA SILVA
AVENIDA CARLOS CRUZ
*BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA E TRANSPORTE
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Figura 01:
RUA POETA JOSÉ BERNARDO

Figura 02:
RUA POETA JOSÉ BERNARDO

Figura 03:
RUA POETA JOSÉ BERNARDO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
28/03/2026	365	204	161	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
29/03/2026	365	205	160	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
30/03/2026	365	206	159	BOM	segunda-feira

RUA MANOEL TAVARES LOPES
AVENIDA CARLOS CRUZ
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Figura 01:
AVENIDA CARLOS CRUZ

Figura 02:
AVENIDA CARLOS CRUZ

Figura 03:
AVENIDA CARLOS CRUZ

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 9º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
31/03/2026	365	207	158	BOM	terça-feira

RODOVIA MIGUEL HOMEM
AVENIDA CARLOS CRUZ
*EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
*PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
*EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
*TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
*TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar
